

监 理 日 志

工程名称:		日期: 2017年12月23日 星期三	气候: 晴	气温: -4-9℃
监理单位动态: 4人 (正常)		材料进场、取样见证、合格情况: 无		
施工方人员动态: 39人 (正常)				
施工机械动态: 挖掘机1台				
施工进度情况	南区接地沟回填, 南区箱变进线电缆箱挂标识牌3人, 41# 34# 组件接地线跨接3人, 41# 组件串接3人, 南北区支架调整30人。			
检查发现的问题	1. 支架平整度不符合要求 2. 现场警示, 围栏等标志, 标识不全。			
处理措施、意见、结果	1. 已派人调整。 2. 已下联系单, 督促尽快落实。			
协调内容或其他	正德公司周总来项目检查、指导工作。			
记录人	张	总监签阅	张建忠	

2、施工图片




正衡周总来项目检查指导



光伏板串接



接地线跨接

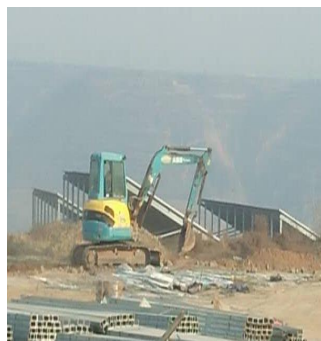

电缆沟回填
