


监 理 日 志					
日期		2017年12月29日 星期三		气候	晴
气温		-6~9℃			
监理人员动态:		4人(正常)			
施工方人员动态:		40人(正常)			
施工机械动态:		无			
材料进场、取样见证、合格情况:		无			
施工进度情况	1. 南北区支架调整 25人, 12#组件中变2人, 12# 电缆桥架绝缘2人 32#组件接地线跨接4人, 12# 区电缆连接3人, 南北区箱色复, 汇流箱标识牌				
检查发现的问题	1. 支架平整度不符合要求, 2. 箱色复, 汇流箱标识牌不全				
处理措施、意见、结果	1. 2. 已派人调整和增加标识牌				
或其他	无				
录入	周书礼		总监签阅	张建忠	

2、施工图片



光伏板串接

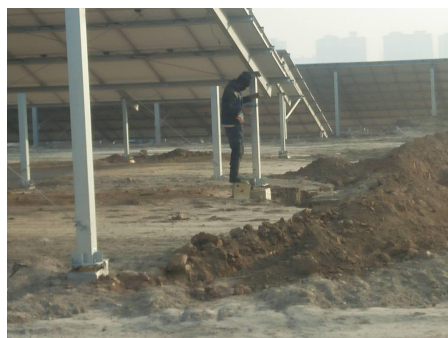

接地线垮接



电缆沟回填
