

监 理 日 志 ()

日期: 2017 年 03 月 02 日

天气: 多云

星期: 四

气温: 0~11℃

工程名称: 中广核陕西铜川 50MWp 农业大棚光伏发电项目

监 理 工 作 情 况	1. 完善监理各项资料。 2. 监理对升压站整改项进行全天跟踪、监督。		
施 工 情 况	施 工 单 位	施 工 内 容 及 进 度	
	中清能 绿洲科 技股份 有限公 司	1. 升压站区铺花砖画巡视线、修补电缆沟盖板（部分）、主变低压侧照明管改造、35KV 挡鼠板制作、SVG 挡鼠板制作、上述问题均已整改完成，剩余整改项明天继续。 2. 光伏区留守人员看守现场材料。	
其 它 事 项	1. 升压站施工人员四人。		
本日现场监理人员		张英豪、张建忠、周书山、叶石泉、郭峰、陈杰元、于荣伟	
记录人: 于荣伟		总监理工程师/总监理工程师代表(签字): 张英豪	

施工图片




35KV 挡鼠板制作



电缆沟盖板



场地地平

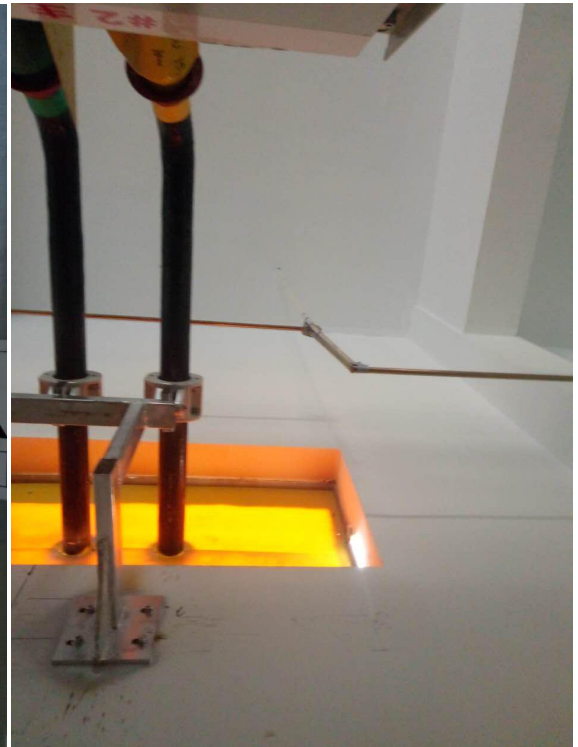

主变低压侧照明管改造
