

监 理 日 志 ()					
日期: 2017 年 7 月 1 日	天气: 晴				
星期: 六	气温: 26-35℃				
工程名称: 陕西铜川二期 50MWp 农光互补光伏发电项目					
监 理 工 作 情 况	①. 观场质量、安全巡检检查, ②. 38#箱变接地隐蔽验收. ③. 33区箱变变压器更换旁站.				
施 工 情 况	<table border="1"> <thead> <tr> <th>施工单位</th> <th>施 工 内 容 及 进 度</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>中清能 绿洲 科技股 份有限 公 司</td> <td> ①. 29、27、33 大棚基础回填、切平. ② 3号集电线路(桥路)敷设 ③ 37 大棚基础换填土. ④ 38 箱变基础接地施工. 33区箱变换变压器 ⑤. 44区大棚基础浇筑. </td> </tr> </tbody> </table>	施工单位	施 工 内 容 及 进 度	中清能 绿洲 科技股 份有限 公 司	①. 29、27、33 大棚基础回填、切平. ② 3号集电线路(桥路)敷设 ③ 37 大棚基础换填土. ④ 38 箱变基础接地施工. 33区箱变换变压器 ⑤. 44区大棚基础浇筑.
施工单位	施 工 内 容 及 进 度				
中清能 绿洲 科技股 份有限 公 司	①. 29、27、33 大棚基础回填、切平. ② 3号集电线路(桥路)敷设 ③ 37 大棚基础换填土. ④ 38 箱变基础接地施工. 33区箱变换变压器 ⑤. 44区大棚基础浇筑.				
其 它 事 项	总包4人、分包5人 施工人员50人 铲车4台、挖掘机4台. 进场支架1车、组件2车.				
本日现场监理人员	张英豪 张建忠 叶石东 周书仁				
记录人: 周书仁	总监理工程师/总监理工程师代表(签字): 张建忠				

第五版承

江苏省住房和城乡建设厅监制


A.0.2

施工照片



电缆敷设

电缆过路敷设

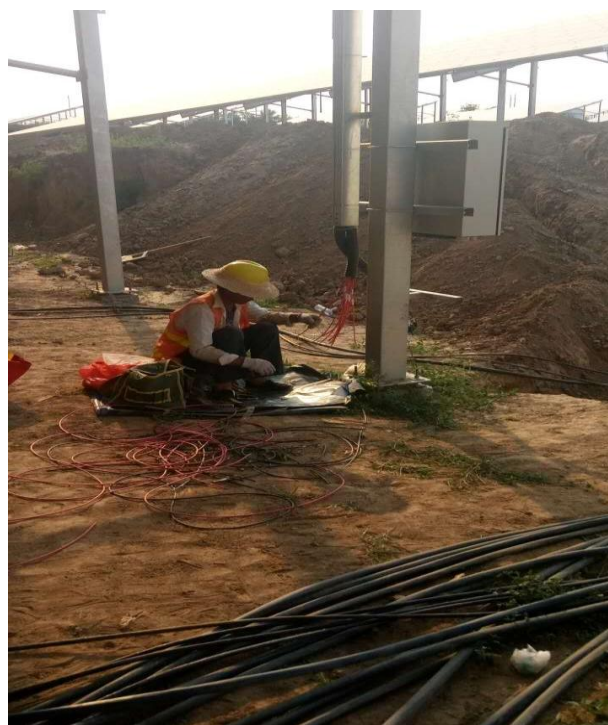

汇流箱接线



电缆沟开挖
