

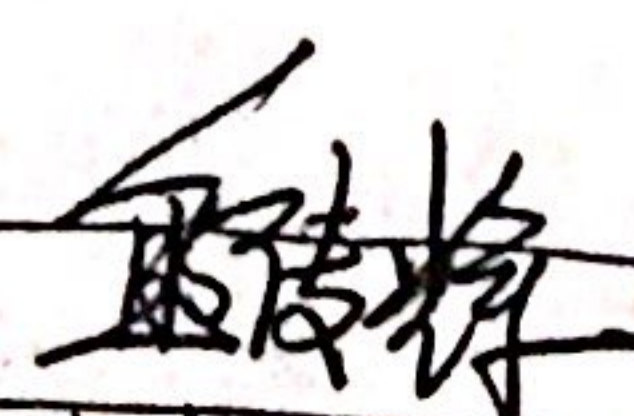

监 理 日 记 ()

日期: 2017 年 3 月 18 日

星期: 六

工程名称:

 天气: 晴
 气温: 6-15℃

监 理 工 作 情 况	1. 巡视车棚顶光伏组件用电缆逐个跨接; 丁房屋顶光伏组件用电缆逐个跨接, 边缘处直接至组件支架. 支架通过-25x4 镀锌扁钢与接地网相连. 2. 巡视丁房屋顶光伏组件安装, 完成 85% 3. 防水处理池作防雷接地连接		
施 工 情 况	承包单位	施工内容及进度	
	红 带 华 能	1. 车棚顶光伏组件用电缆跨接 (3人) 2. 丁房屋顶光伏组件用电缆跨接 (3人) 3. 丁房屋顶光伏组件安装 (8人) 4. 防水处理池作防雷接地连接 (3人)	
其 它 事 项	无		
本日现场监理人员			
记录人:			
		总监 (总监代表):	
