

监 理 日 记()

日期: 2017年12月09日

天气: 晴


星期: 六

气温: 9°~18°


工程名称: 西昌市西溪乡关国寺水库20Wwp渔光一体光伏发电项目

监 理 工 作 情 况	1. 现场巡查 2. 光伏区敷设1X4mm ² 电缆检查: 合格 3. 光伏区敷设3X150mm ² 电缆检查: 合格 4. 光伏区设备接线检查: 合格 5. 综合区消防水池做外墙防水检查: 合格, 阴阳角做附加层合格; 6. 光伏区逆变器安装检查: 合格	
施 工 情 况	承包单位	施工内容及进度
	四川锦友电力有限公司	1. 敷设1X4mm ² 电缆 16人 2. 敷设3X150mm ² 电缆 20人 3. 逆变器安装 14人 4. 设备接线 6人 5. 综合区做外墙防水. 4人
其 它 事 项	1. 注意安全 2. 文明施工	
本日现场监理人员		李保君 叶重庆 王洪磊
记录人: 王洪磊		总监(总监代表): 李保君


柱钢筋搭接使用点焊不符合规范要求

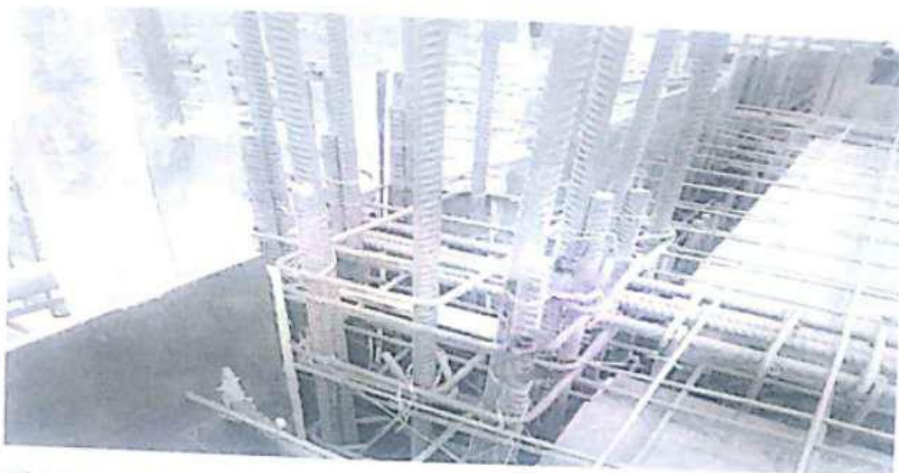


顶部面筋搭接长度不符合规范要求

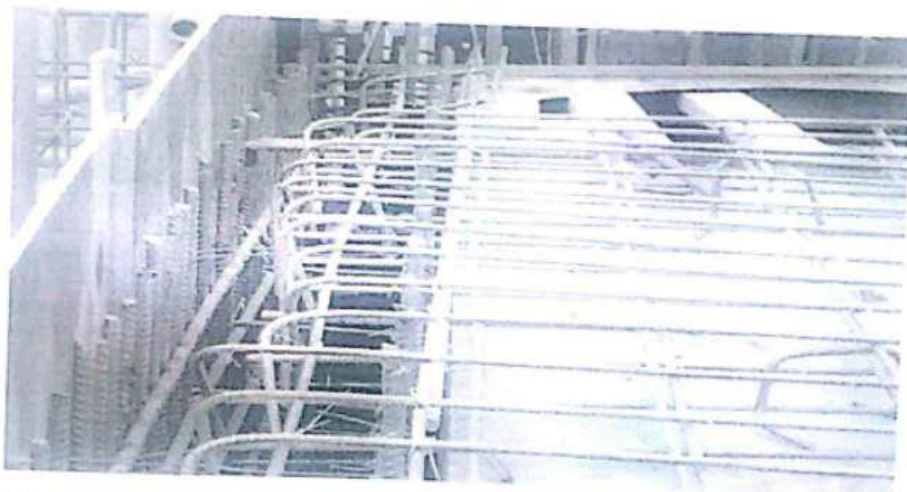

侧墙竖钢筋尺寸不够、无弯钩锚固

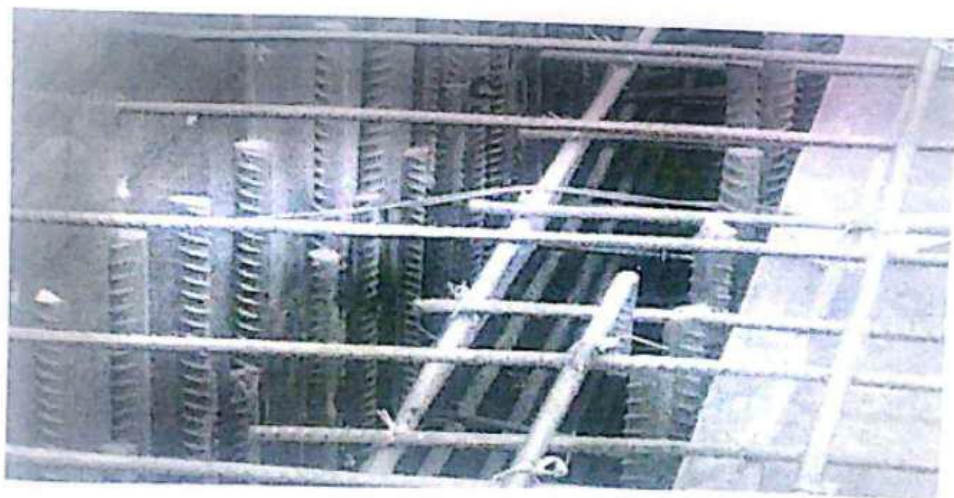

顶部面筋缺少横向钢筋

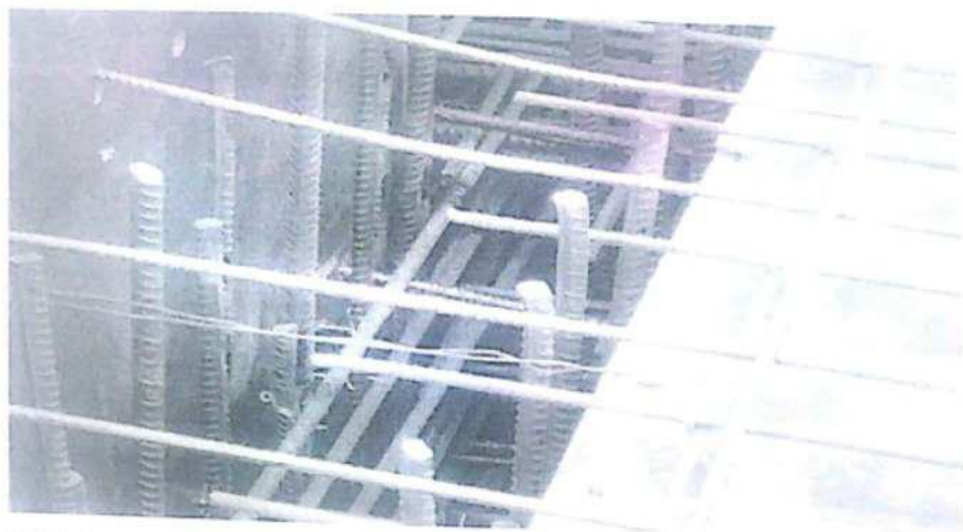

模板未固定牢固



模板安装缝隙过大

