

监 理 日 记()

日期: 2017年12月10日

天气: 晴


星期: 日

气温: 7°-16°


工程名称: 西昌市西溪乡大河村20Wwp渔光棚光伏发电项目

监 理 工 作 情 况	1. 现场巡查 2. 光伏区敷设1x4mm ² 电缆检查, 合格 3. 光伏区敷设3x150 电缆检查, 合格 4. 光伏区安装逆变器检查, 合格 5. 光伏区设备接线检查, 合格 6. 综合楼消防水池回填西面土方, 合格 7. 综合楼消防水池做找平层检查, 合格	
施 工 情 况	承包单位	施工内容及进度
其 它 事 项	四川锦如电力有限公司	1. 敷设1x4mm ² 电缆 14人 2. 敷设3x150mm ² 电缆 20人 3. 逆变器安装 12人 4. 设备接线 8人 6. 综合楼回填土方 4人, 机械4台 7. 综合楼做找平层 4人
本日现场监理人员	李保君, 叶重庆, 王洪磊	
记录人: 王洪磊	总监(总监代表): 李保君	


柱钢筋搭接使用点焊不符合规范要求

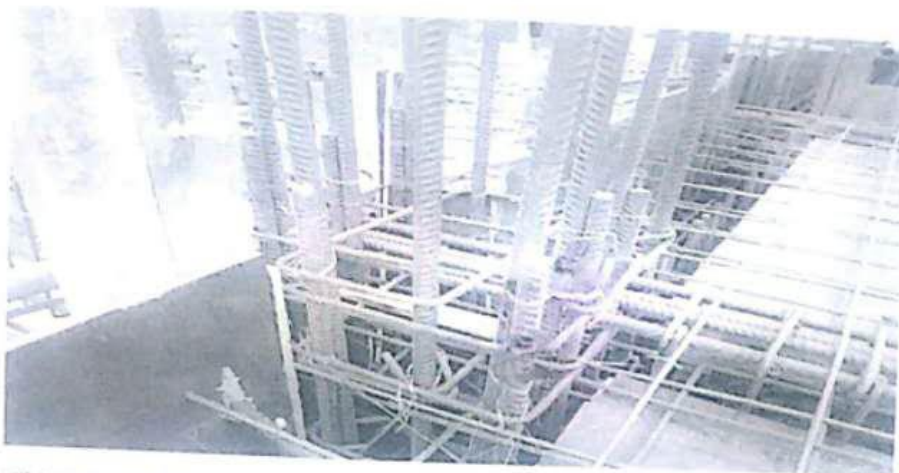


顶部面筋搭接长度不符合规范要求

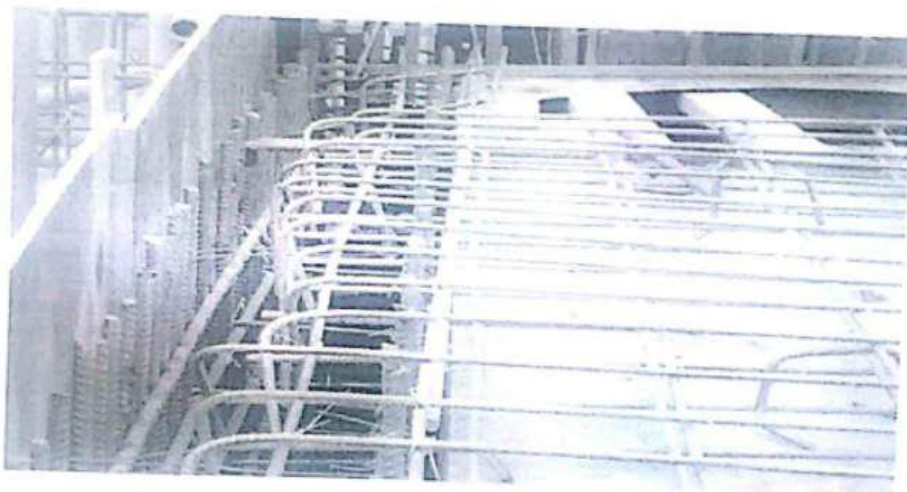

侧墙竖钢筋尺寸不够、无弯钩锚固

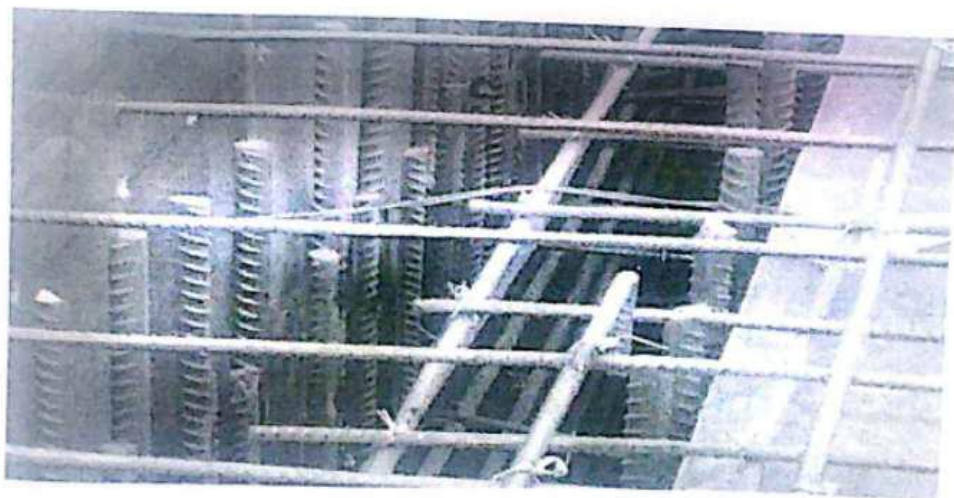

顶部面筋缺少横向钢筋

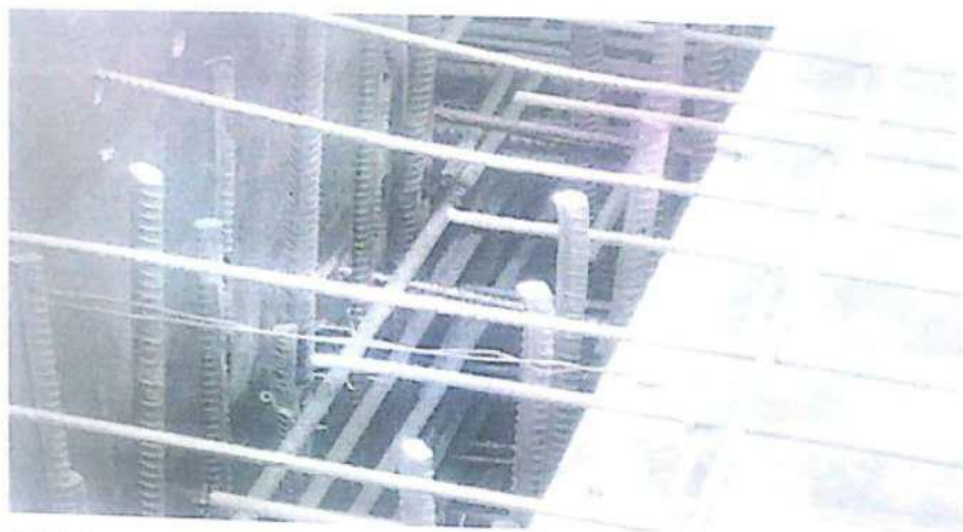

模板未固定牢固



模板安装缝隙过大

