

监 理 日 记()

日期: 2017 年 12 月 11 日

天气: 晴


星期: 一

气温: 7~12℃


工程名称: 西昌市西溪乡尖田水库渔光互补光伏发电项目

监 理 工 作 情 况	1. 现场巡查 2. 光伏区 敷设 1x4mm ² 电缆检查, 合格 3. 光伏区 敷设 3x120mm ² 高压电缆检查, 合格 4. 光伏区 逆变器安装检查 合格 5. 光伏区 设备接线检查, 合格 6. 综合楼 回填土方检查, 合格 7. 综合楼 底板钢筋绑扎检查, 合格	
施 工 情 况	承包单位	施工内容及进度
	四川锦龙电力有限公司	1. 敷设 1x4mm ² 电缆 10人 2. 敷设 3x120mm ² 电缆 18人 3. 设备安装 16人 4. 设备接线 12人 5. 综合楼回填土方 4人 6. 机械 5台 7. 钢筋绑扎 8人
其 它 事 项	1. 注意安全 2. 文明施工	
本日现场监理人员		李保磊, 叶重庆, 王洪福
记录人: 王洪福		总监 (总监代表): 李保磊


柱钢筋搭接使用点焊不符合规范要求

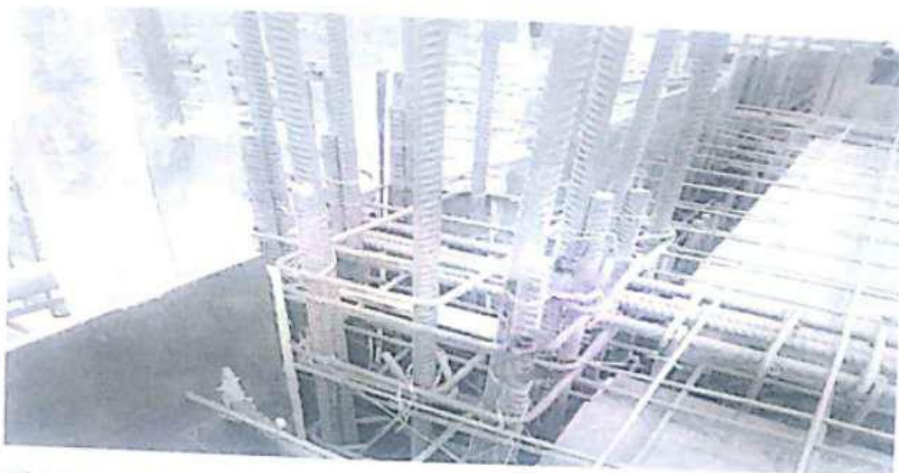


顶部面筋搭接长度不符合规范要求

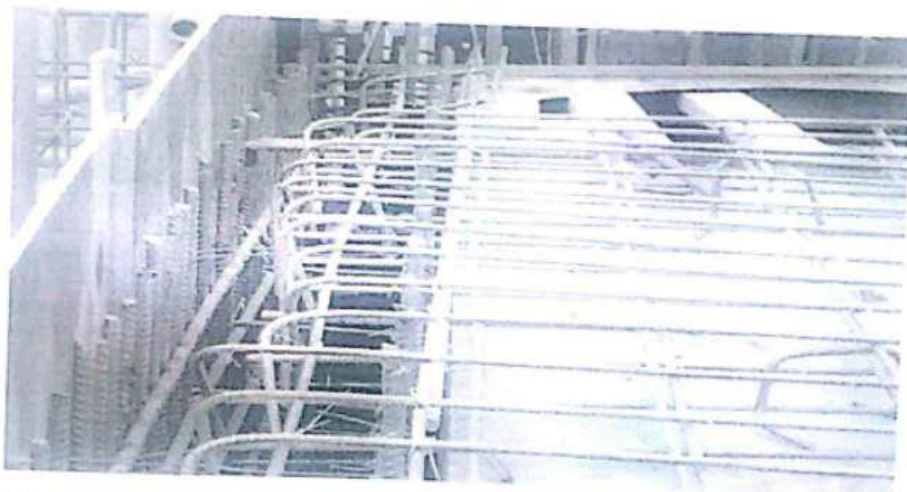

侧墙竖钢筋尺寸不够、无弯钩锚固

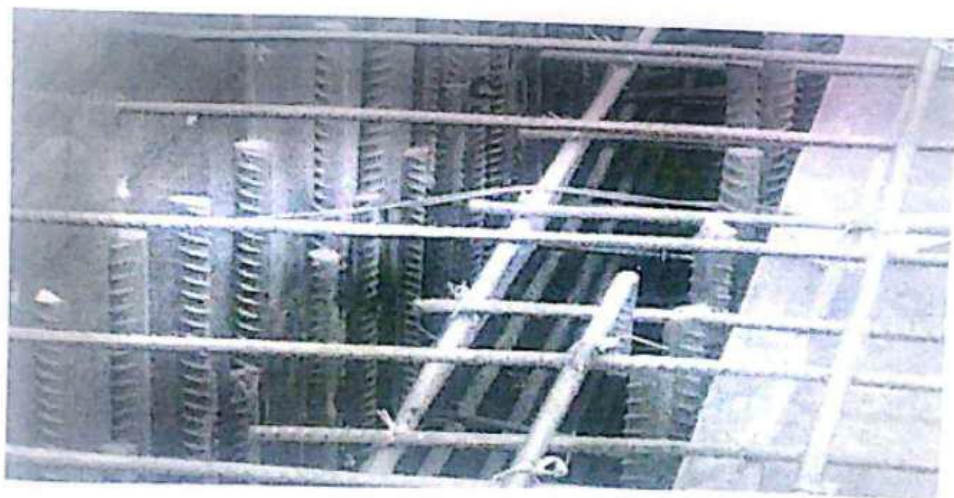

顶部面筋缺少横向钢筋

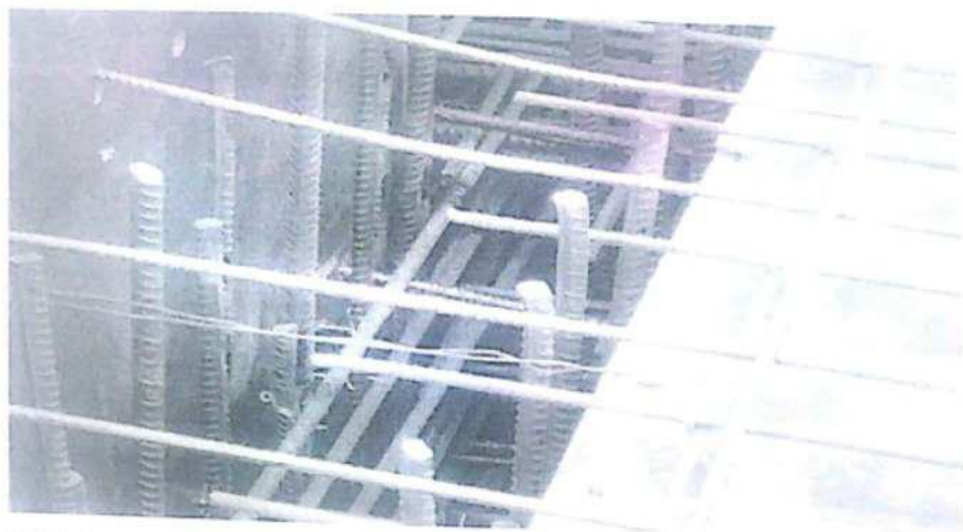

模板未固定牢固



模板安装缝隙过大

