

监 理 日 记()

日期: 2017 年 12 月 14 日

天气: 晴


气温: 9°~20°C

星期: 四


工程名称: 西昌市西溪乡光国寺水库20WMP渔光一体光伏发电项目

监 理 工 作 情 况	1. 现场巡查 2. 光伏区敷设 3X150mm ² 电缆检查, 合格 3. 光伏区设备接线检查, 合格 4. 光伏区敷设 3X120mm ² 电缆检查, 合格 5. 综合楼钢筋焊接检查, 合格 6. 组织安全大检查。	
施 工 情 况	承包单位 四川锦龙电力有限公司	施工内容及进度 1. 敷设 3X150mm ² 电缆 30人 2. 敷设 1X4mm ² 电缆 6人 3. 设备接线 6人 4. 桥架盖板安装 4人 5. 综合楼钢筋焊接 4人
其 它 事 项	1. 注意安全。 2. 文明施工。	
本日现场监理人员 李保君 叶重庆 王洪磊		
记录人: 王洪磊		总监(总监代表): 李保君


柱钢筋搭接使用点焊不符合规范要求

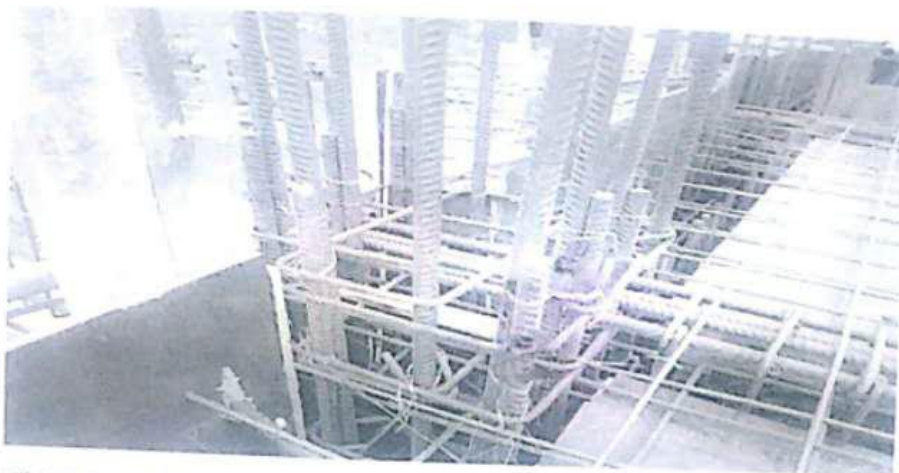


顶部面筋搭接长度不符合规范要求

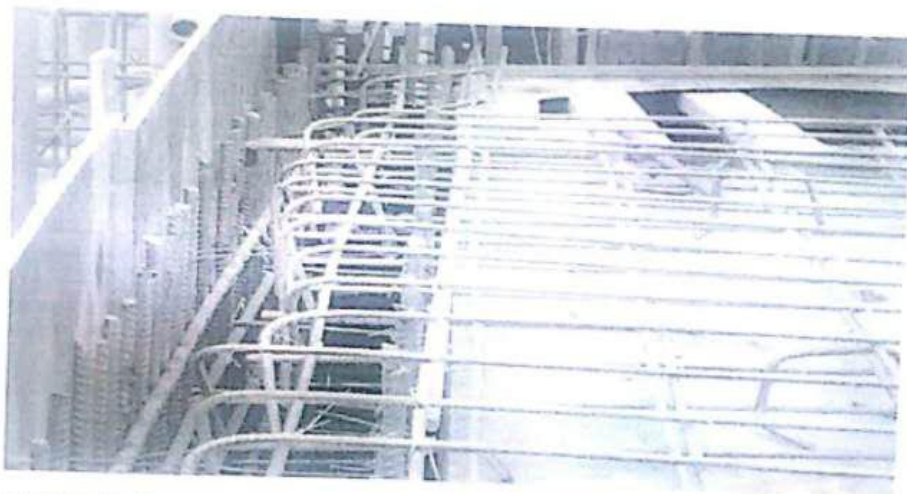

侧墙竖钢筋尺寸不够、无弯钩锚固

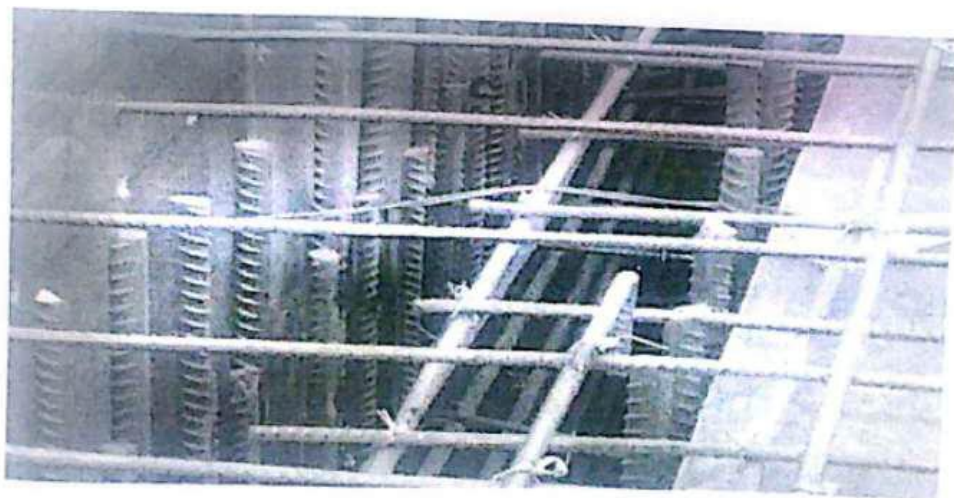

顶部面筋缺少横向钢筋

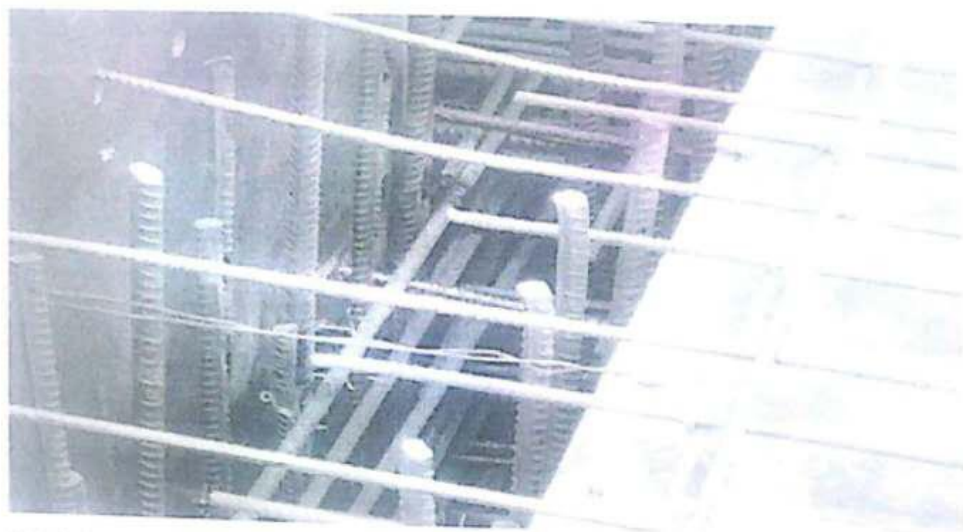

模板未固定牢固



模板安装缝隙过大

