

监 理 日 志

日期：2017 年 03 月 01 日

天气：晴

星期：星期三

气温：-3~10° c

工程名称：临漳戴克电器 11MWp 屋顶分布式光伏发电项目

监 理 工 作 情 况	1) A-F 区 1#-6#钢梯基础短柱混凝土拆模及养护质量检查，检查发现个别短柱有缺棱掉角等缺陷，要求是哦给你单位整改，把短柱缺棱掉角部位修补起来。 2) A 区-F 区屋面运维通道支架横梁加固质量检查。 3) A-F 区 1#-6#钢梯基础基坑回填土质量检查。 4) 汇流箱编号喷字质量检查，箱逆变设备喷警示标语质量检查。 5) 汇集站科林电气二次设备调试。 6) 汇集站一、二次设备“五防”安装质量检查。	
施 工 情 况	施 工 单 位	施 工 内 容 及 进 度
	中 徽 机 电	1) A-F 区 1#-6#钢梯基础短柱混凝土浇筑。 2) A 区及 F 区厂房屋面电缆桥架固定。 3) A 区-F 区屋面运维通道支架胶粘施工。 4) A 区-F 区厂房屋面剩余物品清理。 5) A 区及 F 区 1#-6#箱逆变基础内集水井清理。 6) 电缆线整理入电缆桥架，敷设桥架盖板做好准备工作。 7) 汇集站科林电气二次设备调试。
其 它 事 项		
本日现场监理人员		孟文伟
记录人:孟文伟		总监理工程师/总监理工程师代表（签字）：




2017.03.01 钢梯基础拆模后
混凝土质量检查



2017.03.01 钢梯基础回填



2017.03.01 箱逆变警示标语喷涂

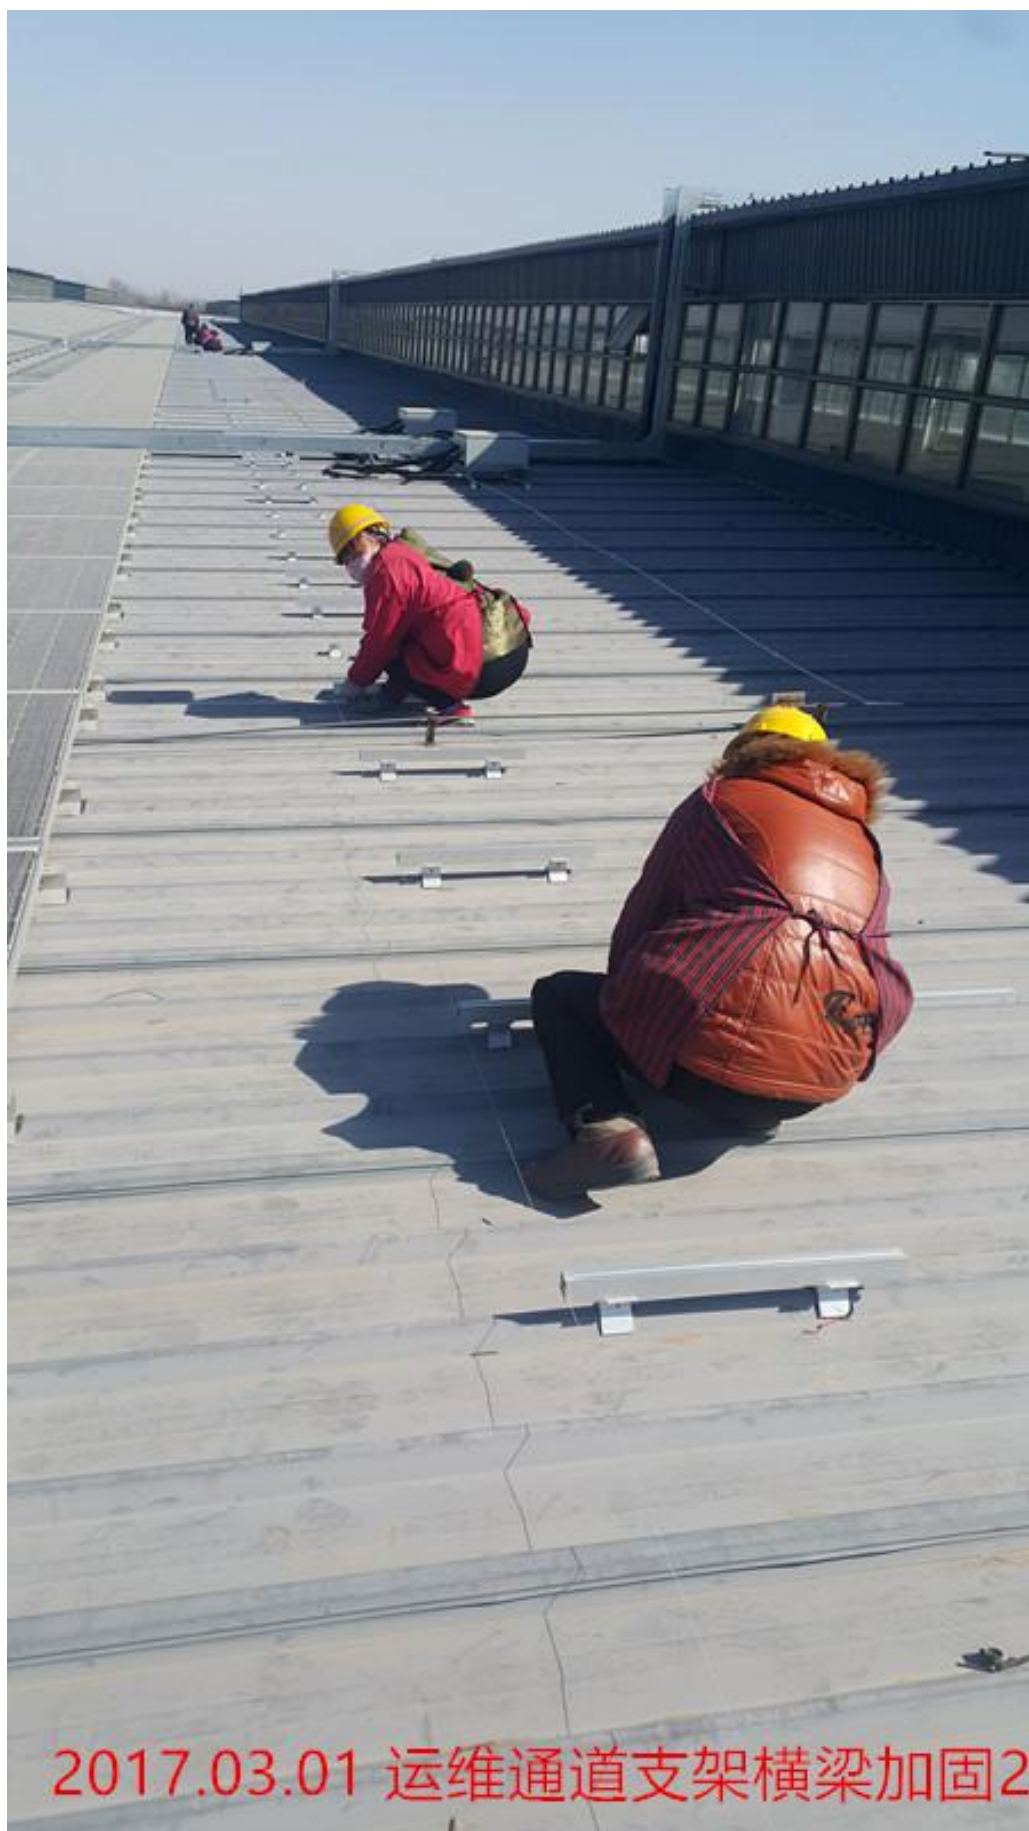

2017.03.01 运维通道支架横梁加固2
