

监 理 日 志

日期：2017 年 03 月 02 日


天气：晴

星期：星期四

气温：1~14° c

工程名称：临漳戴克电器 11MWp 屋顶分布式光伏发电项目

监 理 工 作 情 况	1) A-F 区 1#-6#钢梯基础回填土夯实质量检查 2) A 区-F 区屋面运维通道支架横梁加固质量检查。 3) A-F 区屋面垃圾清理巡视检查。 4) A 区屋面光伏组件更换质量检查，检查发现安装好的组件有破损，现场拆除更换。现场查看无撞击或是人为原因造成的现象。监理人员推测可能造成损坏的原因是，彩钢瓦屋面受压变形，因支架无檩条等连接，压力直接传递到单块组件边框上，使组件不均匀受力而导致组件变形损坏。 5) 汇集站科林电气二次设备调试。 6) 汇集站一、二次设备“五防”安装质量检查。	
施 工 情 况	施 工 单 位	施 工 内 容 及 进 度
	中 徽 机 电	1) A-F 区 1#-6#钢梯基础回填土夯实。 2) A 区及 F 区厂房屋面电缆桥架固定。 3) A 区-F 区屋面运维通道支架胶粘施工。 4) A 区-F 区厂房屋面剩余物品清理。 5) A 区屋面光伏组件更换质量检查。 6) 汇集站科林电气二次设备调试，一、二次设备“五防”安装。
其 它 事 项		
本日现场监理人员		孟文伟
记录人:孟文伟		总监理工程师/总监理工程师代表（签字）：

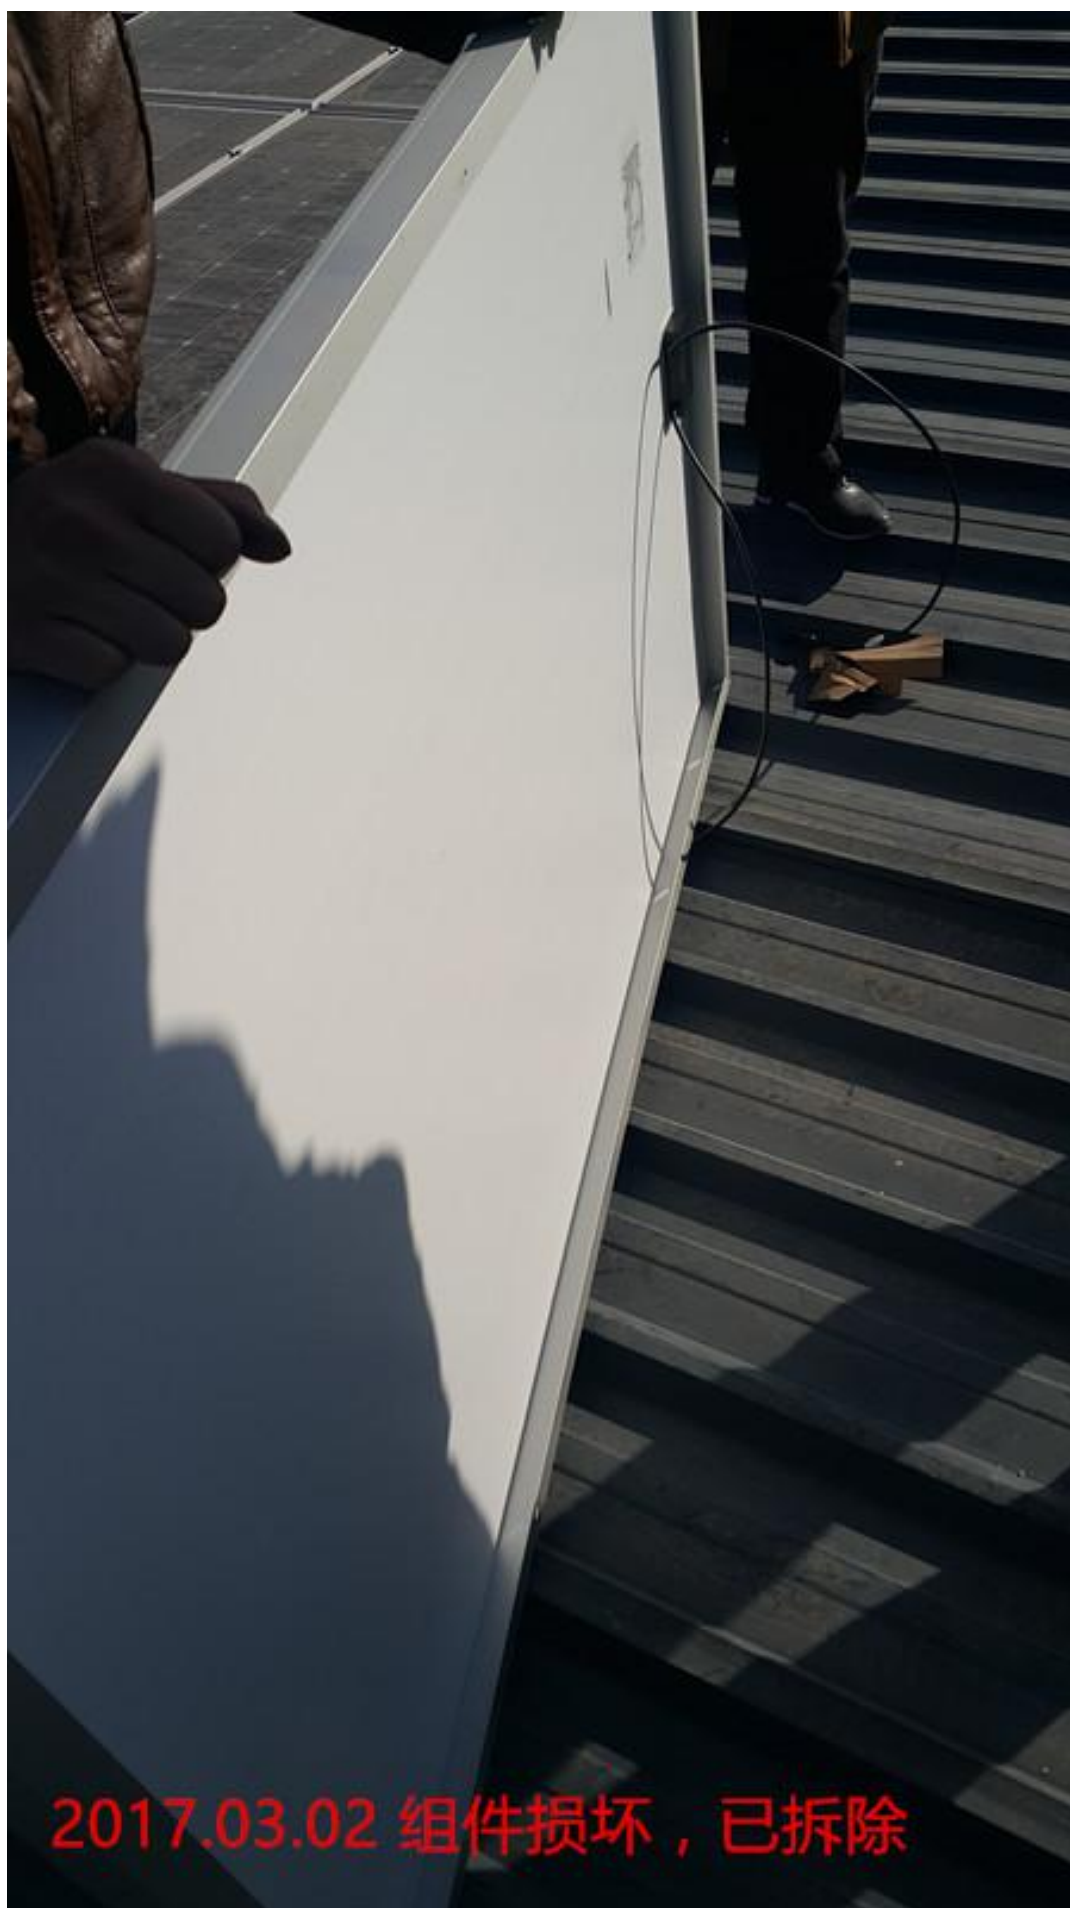

2017.03.02 组件损坏，已拆除





2017.03.02 组件损坏，已替换
