

# 监 理 日 志

日期：2017年 03月 11日

天气：阴

星期：星期六


气温：5~16° c

工程名称：临漳戴克电器 11MWp 屋顶分布式光伏发电项目

监 理 工 作 情 况	1) 屋面光伏电缆桥架内电缆整理消缺，桥架内垃圾清理干净质量检查。 2) E 区屋面光伏运维通道支架横梁安装施工质量检查。 3) F 区箱逆变基础面层抹灰质量检查。 4) F 区箱逆变基础百页窗安装加固质量检查。 5) E 区屋面光伏组件冲洗系统安装质量检查。 6) B 区及 E 区光伏组件冲洗质量检查，E 区屋面光伏组件清理检查发现，冲洗完成的组件，隔两天的时间，组件表面就又有了一层灰尘在上面了。 7) E 区屋面电缆桥架盖板安装质量检查。	
施 工 情 况	施 工 单 位	施 工 内 容 及 进 度
	中 徽 机 电	1) 屋面光伏电缆桥架内电缆整理消缺，桥架内垃圾清理干净。 2) E 区屋面光伏运维通道支架横梁安装施工。 3) F 区箱逆变基础面层抹灰。 4) F 区箱逆变基础百页窗安装加固。 5) E 区屋面光伏组件冲洗系统安装。 6) B 区及 E 区光伏组件冲，3 组共计 6 人。 7) E 区屋面电缆桥架盖板安装质量检查。
其 它 事 项	并网验收问题整改，县局已完成。施工单位预计于下周一，整改回复市局的检查问题。	
本 日 现 场 监 理 人 员		孟文伟
记 录 人：孟文伟		总 监 理 工 程 师 / 总 监 理 工 程 师 代 表（签 字）：



2017.03.11 B区屋面光伏组件冲洗1

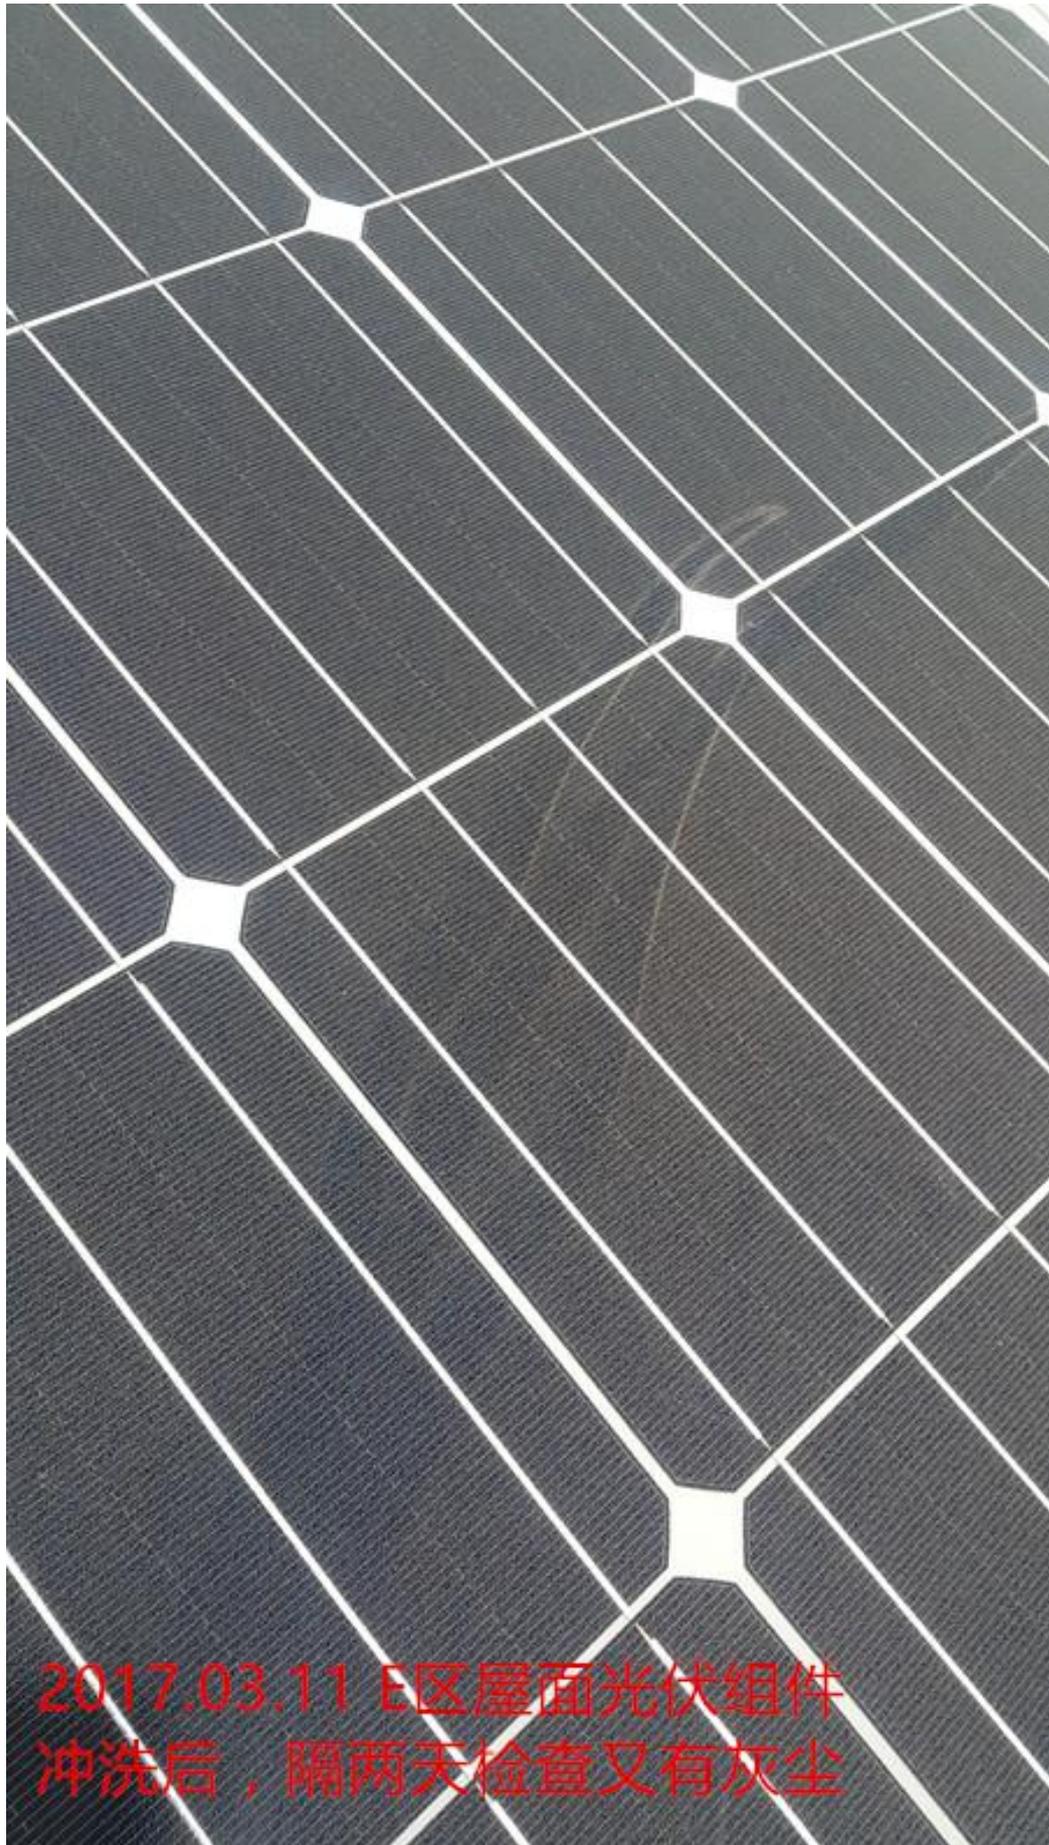

2017.03.11 E区屋面光伏组件  
冲洗后，隔两天检查又有灰尘



2017.03.11 E区屋面维修通道横梁安装



2017.03.11 F区箱逆变基础抹灰1
