

监 理 日 志

第 1 页 共 2 页


2016 年 12 月 14 日 星期: 3	天气: 阴 白天: 夜间:	气温: 最高 5 °C 最低 -4 °C
---------------------------	------------------	-------------------------

工作内容、遇到问题及其处理

- 1) D 厂区屋面组件吊装及组件二次搬运 (19 人), 有指挥;
- 2) C 厂区屋面支架安装, 两组每组 6 人, 技术员 1 人, 计 13 人;
- 3) B 厂区屋面组件安装三组各 3 人, 计 9 人;
- 4) C 厂区构造柱钢筋绑扎, 2 人,;
- 5) B\C\D 厂区箱逆变基础砌墙 12 人, 制模 4 人预制仓基础砌砖 (15 人);
- 6) C 厂区气楼组件安装, 两组各 6 人, 计 12 人;
- 7) 电缆桥架搬运 6 人
- 8) 现场施工人员共 92 人, 管理人员 6 人;
- 9) 现场设备: 吊车 1 辆, 叉车 1 辆, 挖机 1 辆, 运输机械 2 辆。

发现问题: 1) B 厂区屋面组件安装完成 90%;

2) 屋面彩钢瓦漆层破坏较重, 已通知施工方进行屋面清理后修补。

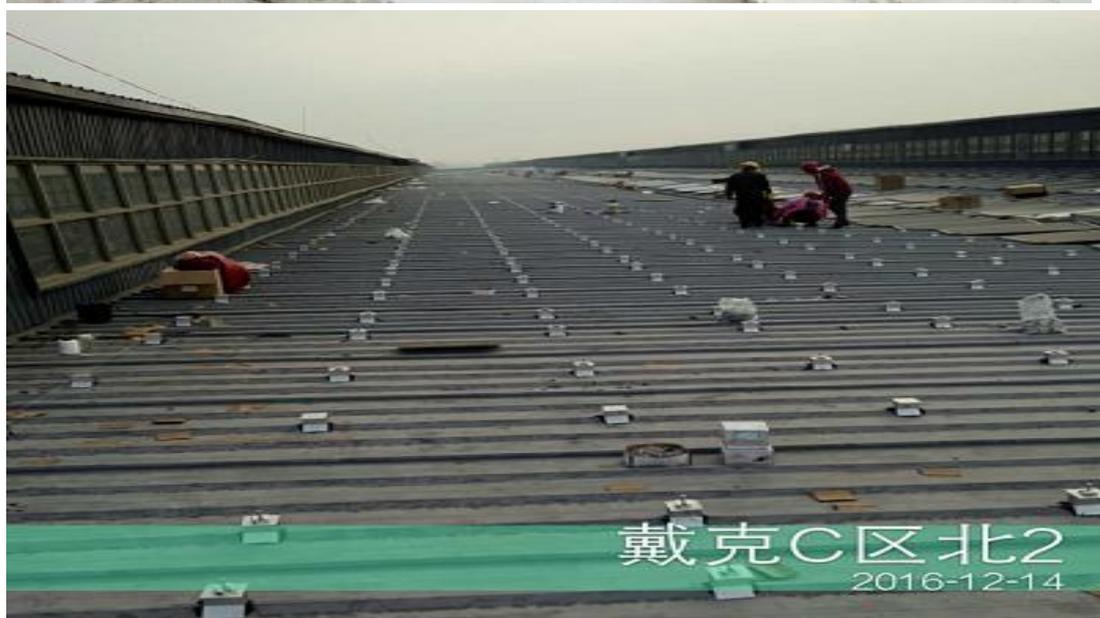



注 1. 本表由专业监理工程师汇总填写，填写的主要内容包括：

- (1) 天气和施工环境情况。
 - (2) 当日施工进度情况。
 - (3) 当日监理工作情况，包括旁站、巡视、见证取样、平行检验等情况。
 - (4) 当日存在的问题及处理情况。
 - (5) 其他有关事项。
2. 在填写本表时，内容必须真实，力求详细。须使用蓝黑或碳素钢笔填写，字迹工整、文句通顺。
3. 本表式为推荐表式，各监理单位可根据自己的管理体系设计本单位的监理日志表式，但应包括本表式要求的主要内容。
