


上海冠生园蜂制品有限公司 300kwp 分布式光伏项目 监理工作日报表

项目进展				工作汇报	
系统工程	分项工程	工程进展	完成量	监理工作情况	对现场到货材料进行检测，包括（檩条、斜梁、斜支撑、立柱、三角件、连接件、桥架等材料），测量尺寸均符合设计要求，对现场运输、吊运过程中出现的额个别材料变形现象已现场要求施工单位进行更换处理。
土建工程	支架基础	工程总量	602个		
		完成情况	100%		
	配电房基础施工	工程总量	100%		
		完成情况	100%		
电气工程	支架安装	工程总量	301组	施工情况	施工人员8人，进行基础定位放线，材料搬运（降雨较大）施工未全民进行。
		完成情况			
	组件安装	工程总量	1320块		
		完成情况			
	汇流箱安装	工程总量	3台		
		完成情况			
	逆变器安装	工程总量	8台		
		完成情况			
	接地装置施工	工程总量	100%	明日工作计划	1、严格检查施工质量，安全文明施工；
		完成情况			
	桥架施工	工程总量	100%		
		完成情况			
	电缆施工	工程总量	100%		
		完成情况			
	并网调试	工程总量	100%		
		完成情况			
编制单位：常州正衡电力工程监理有限公司				编辑人：邓伟	
				日期：2017-04-11	

材料、设备	厂家	型号	类型	数量
组件	晶澳	270Wp	多晶	1320块
逆变器	台达	30KW	组串式	8台
汇流箱	台达	0.4KVA	组串式	3台
参建单位：				
建设单位	远景能源（南京）软件技术有限公司			
	上海台能新能源科技有限公司			
监理单位	常州正衡电力工程监理有限公司			
总包单位	上海历挚机电设备有限公司			
施工单位	上海南申工程安装有限公司			

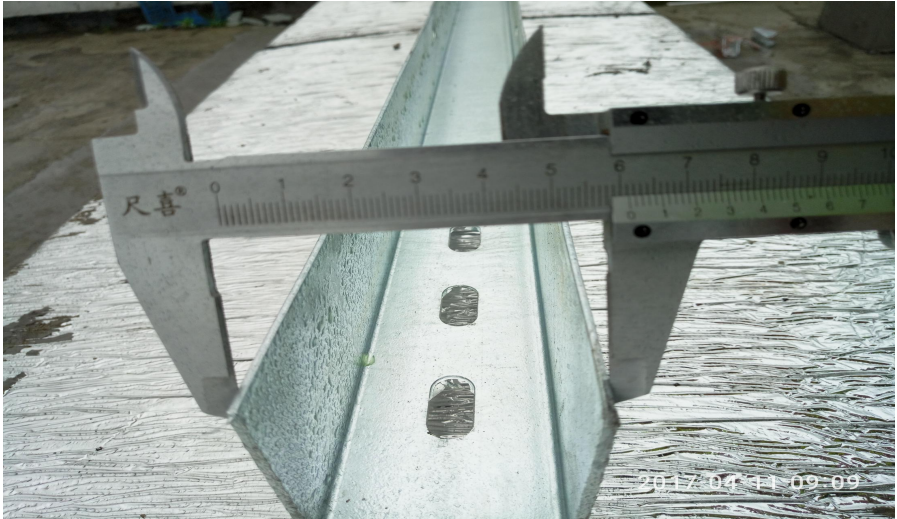

材料检测
