

监 理 日 志

日期：2017 年 04 月 12 日


星期：星期三

天气：晴

气温：9~18° c


工程名称：苏州乐轩 2.0184MWp 分布式光伏电站项目

监 理 工 作 情 况	1、并网柜及开关柜位置确认，桥架及并网柜电缆长度实测检查。 2、支架基础混凝土浇筑，监理旁站。 3、2#厂房定位测量放线施工，监理检查。 4、第三次周例会组织召开，整理会议纪要。	
施 工 情 况	施 工 单 位	施 工 内 容 及 进 度
	上 海 久 能	1、2#厂房定位测量放线施工。 2、支架基柱墩拆模及混凝土养护。 3、支架基础混凝土浇筑 200 个，总计完成 1400 个，完成 41%。 4、并网柜及开关柜位置确认，桥架及并网柜电缆长度实测。
其 它 事 项		
本 日 现 场 监 理 人 员		孟文伟
记 录 人：孟文伟		总 监 理 工 程 师 / 总 监 理 工 程 师 代 表（签字）：

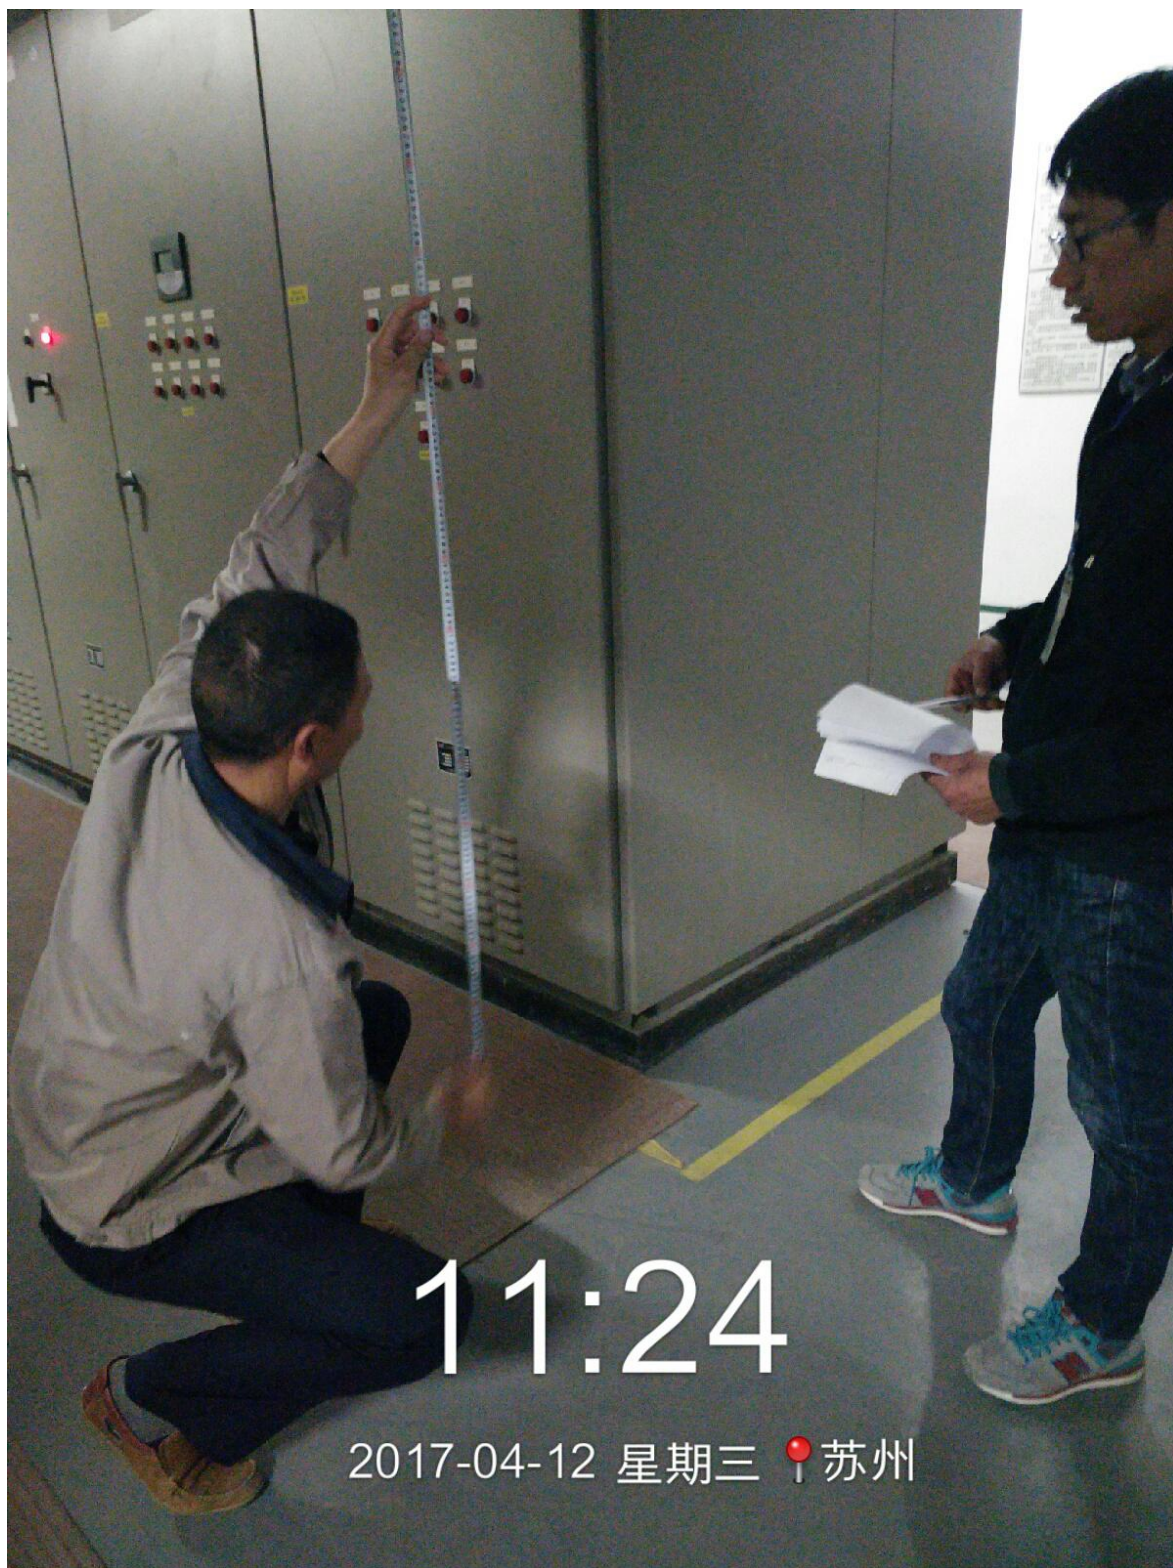

11:24

2017-04-12 星期三 📍 苏州

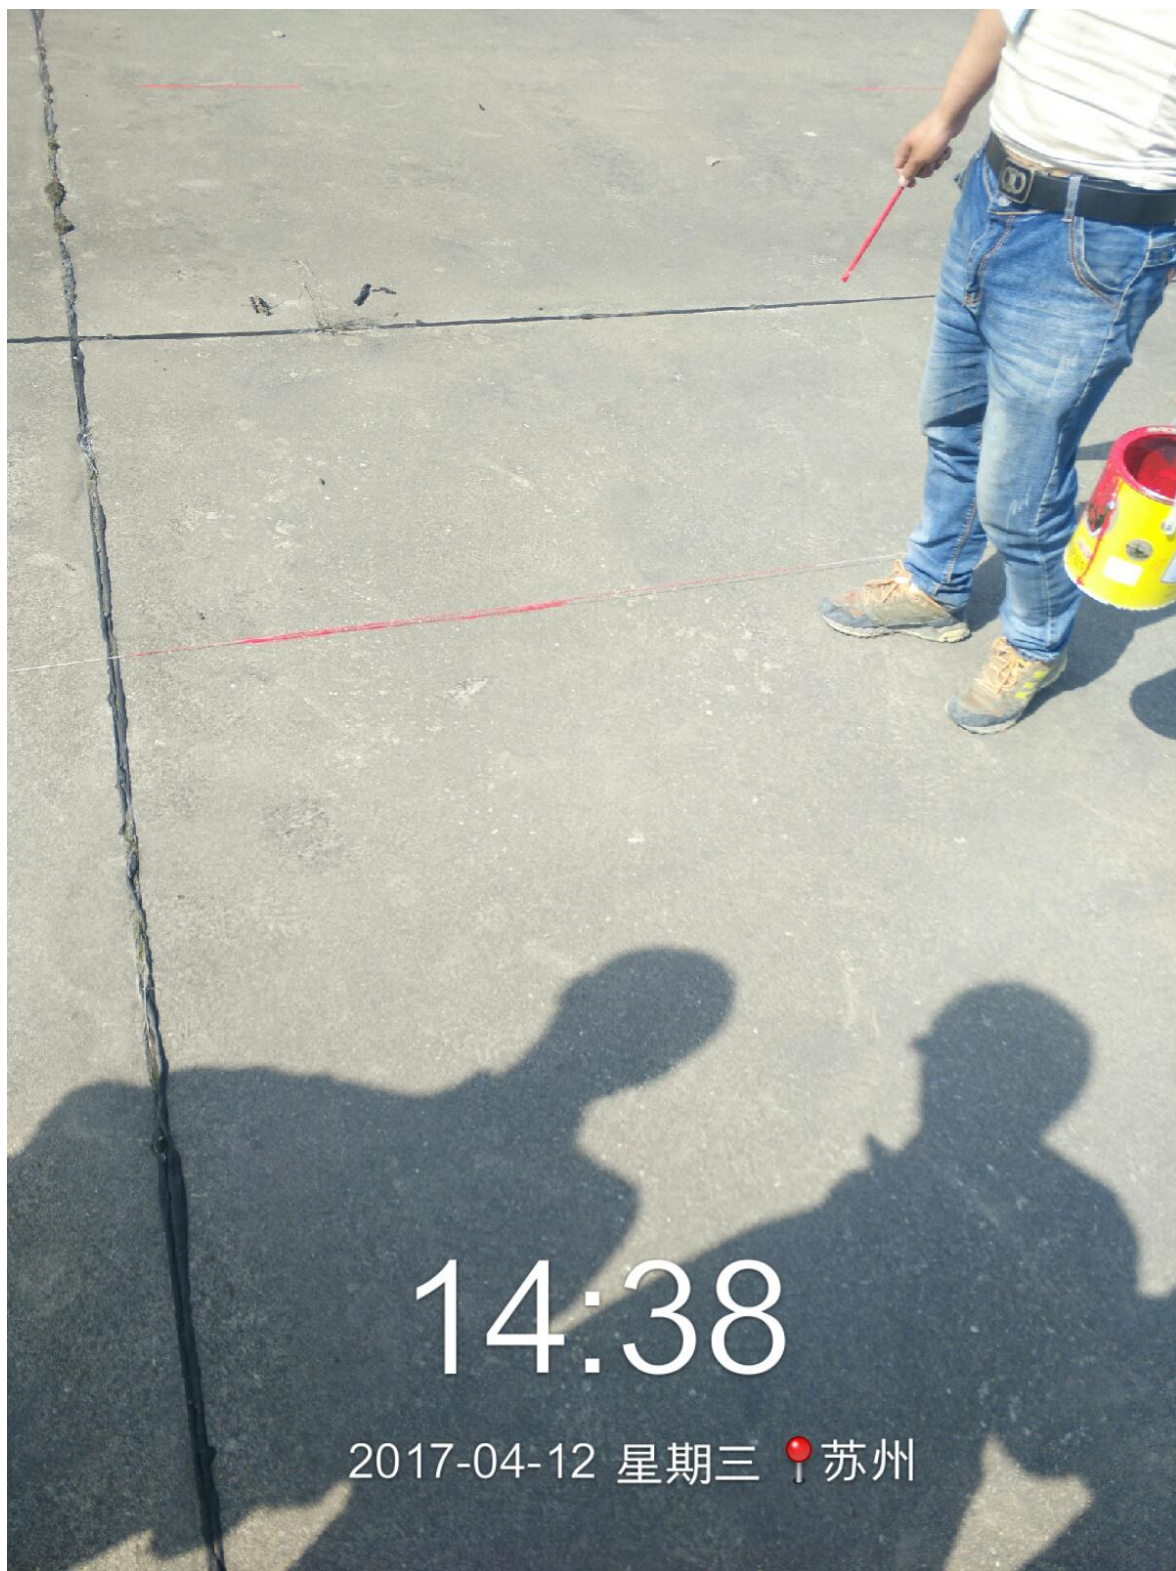

14:38

2017-04-12 星期三 📍 苏州

