

监 理 日 志

日期：2017年 05月 02日

天气： 小雨

星期：星期二

气温： 17° ~20° c


工程名称： 苏州乐轩 2.0184MWp 分布式光伏电站项目

监 理 工 作 情 况	<p>1、 支架安装 1 天总计安装完成 35%监理检查，检查发现个别组串见不在一条直线上，起伏波动比较大。要求施工单位立即现场整改，整改完成并要求之后按照设计规范及现场要求进行支架安装工作。</p> <p>2、 支架柱墩分散就位施工监理检查，柱墩摆放未摆正，要求施工单位整改。</p> <p>3、 今日安全无事故，检查有个别施工人员未佩戴安全帽；要求施工单位对 5#房小屋面直爬梯做安全防护。</p>	
施 工 情 况	施 工 单 位	施 工 内 容 及 进 度
	上 海 久 能	<p>1、 支架柱墩进行分散就位施工，1#、2#厂房屋就位 1826 个全部完成，3#、4#房分散就位 460 个，5#房完成分散就位 402 个，总计完成 80%，</p> <p>2、 1#、2#厂房支架材料吊装完毕，进行分散安装工作，分散已完成，支架安装 1 天总计安装完成 35%；3#、4#房支架材料吊装完毕，未分散；5#房屋面支架材料吊装完成，未分散。</p> <p>3、 柱墩运输进场一车，总计进场 3014 个，进场 90%，现场施工人员共计 6 人。</p> <p>4、 测量放线完成；混凝土浇筑全部完成；支架檩条全部进场；组件全部进场；逆变器全部进场；其他工程材料未进场。</p>
其 它 事 项		
本 日 现 场 监 理 人 员	孟文伟	
记 录 人：孟文伟	总 监 理 工 程 师 / 总 监 理 工 程 师 代 表（签 字）：	



15:54

2017-05-02 星期二 苏州

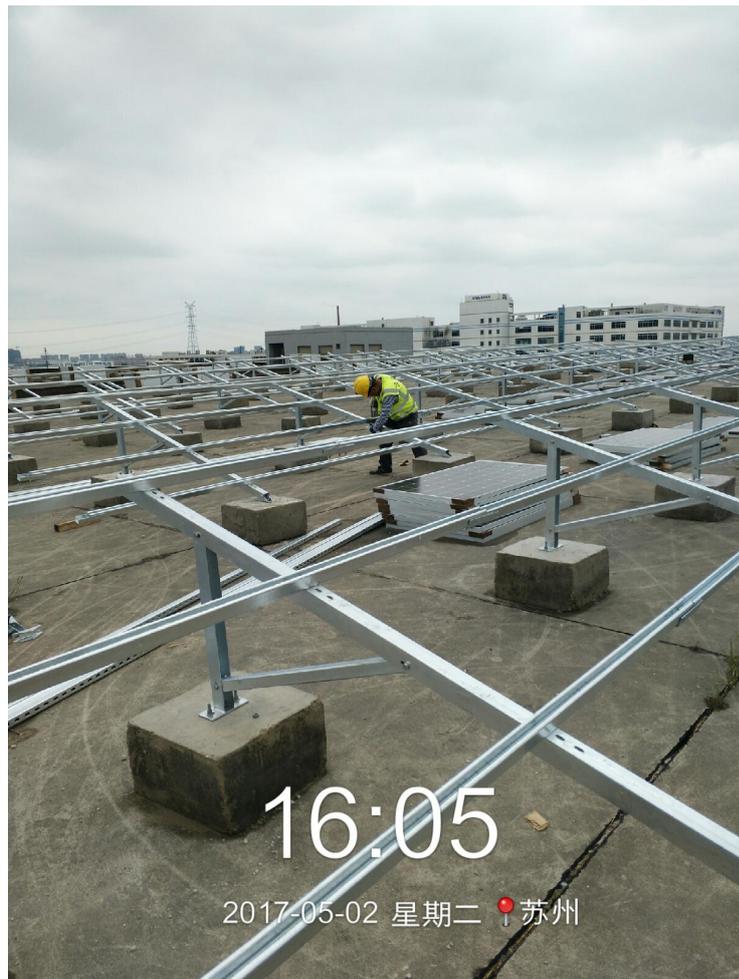

16:05

2017-05-02 星期二 苏州
