

# 监 理 日 志

日期：2017年 05月 05日


天气： 阴

星期：星期五

气温：17° ~23° c

工程名称： 苏州乐轩 2.0184MWp 分布式光伏电站项目

监 理 工 作 情 况	<p>1、 支架安装 1 天总计安装完成 45%监理检查。</p> <p>2、 1#、2#房屋面组件试装及安装，监理检查，检查发现组件安装有高低起伏现象及上下排组件未在同一条直线上，要求施工单位整改，现场已整改。</p> <p>3、 5#房屋面支架柱墩就位施工监理检查，柱墩摆放未摆正，要求施工单位带线进行调直整改。</p> <p>4、 今日安全无事故。</p>	
施 工 情 况	施 工 单 位	施 工 内 容 及 进 度
	上 海 久 能	<p>1、 支架柱墩进行分散施工，1#、2#厂房屋就位 1826 个全部完成，3#、4#房分散 460 个，5#房完成分散 402 个，总计完成 80%。</p> <p>2、 1#、2#厂房支架材料吊装完毕，进行分散安装工作，分散已完成，支架安装 1 天总计安装完成 35%；3#、4#房支架材料吊装完毕，未分散；5#房屋面支架材料吊装完成，未分散。</p> <p>3、 支架柱墩进行就位施工，1#、2#厂房屋就位 1826 个全部完成，3#、4#房就位安装 460 个，5#房就位 402 施工，总计就位完成 80%。</p> <p>4、 柱墩运输进场一车，总计进场 3352 个，进场 100%，现场施工人员共计 20 人。</p> <p>4、 测量放线完成；混凝土浇筑全部完成；支架檩条全部进场；压块全部进场；组件全部进场；逆变器全部进场；其他工程材料未进场。</p>
其 它 事 项		
本日现场监理人员		孟文伟
记录人:孟文伟		总监理工程师/总监理工程师代表 (签字) :

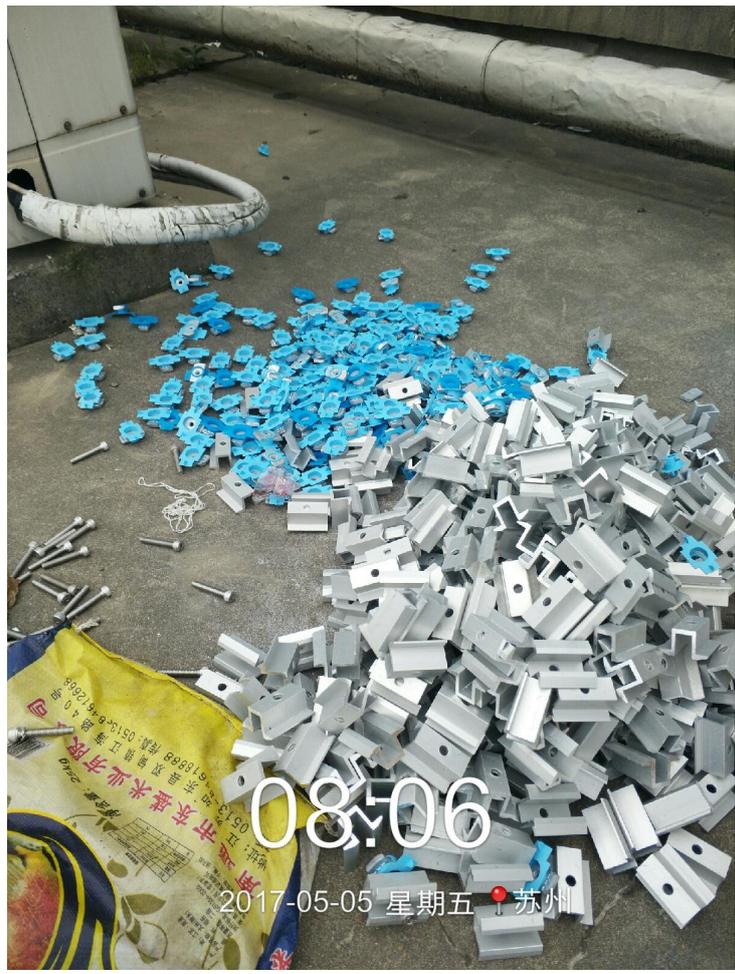


08:06

2017-05-05 星期五 苏州




09:17

2017-05-05 星期五 苏州

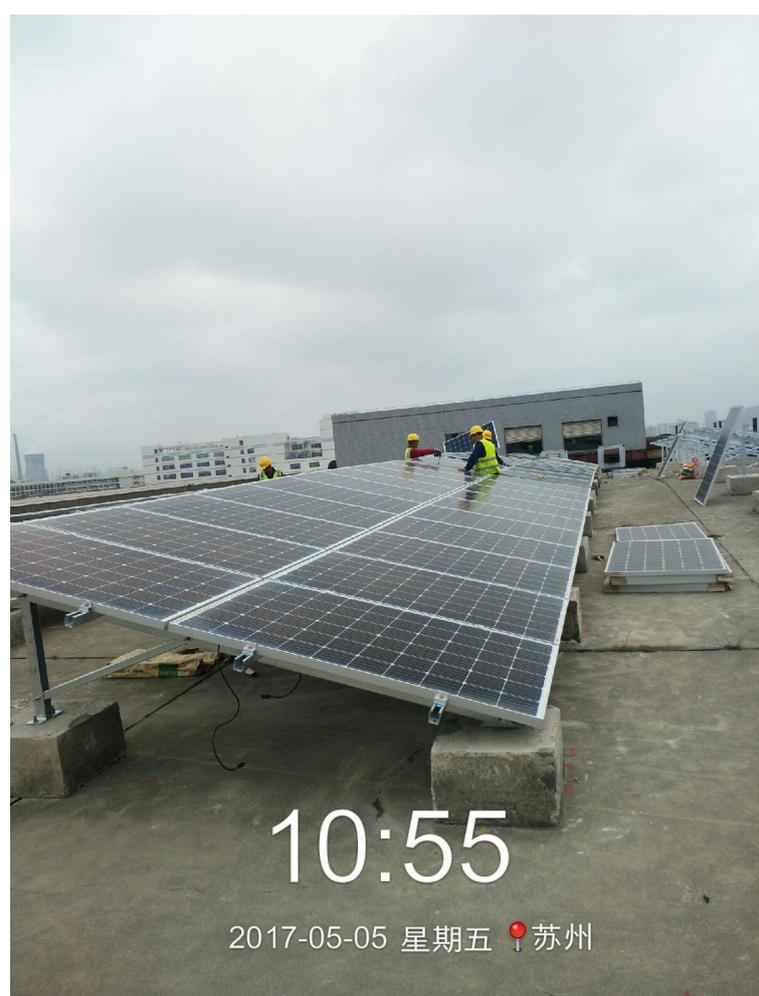

10:55

2017-05-05 星期五 苏州

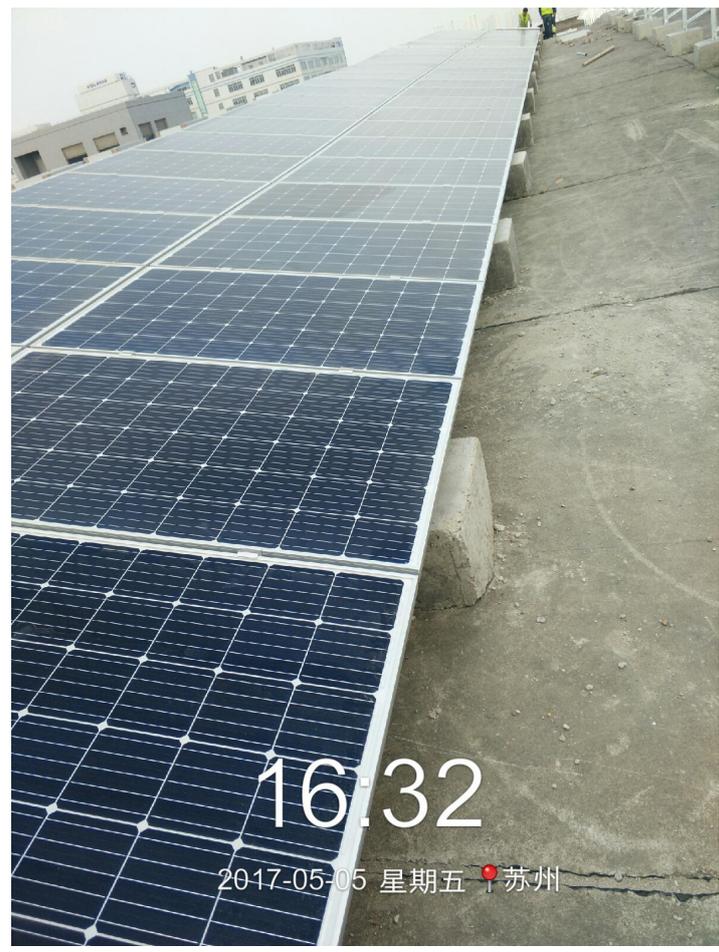

16:32

2017-05-05 星期五 苏州
