

监 理 日 志

日期：2017年 04月 15日


天气：晴


星期：星期六

气温：17° ~29° c

工程名称：苏州乐轩 2.0184MWp 分布式光伏电站项目

监 理 工 作 情 况	1、支架基础柱墩混凝土浇筑监理旁站%。 2、柱墩托盘运送至浇筑现场，对托盘承重进行安全检查，符合要求。 3、柱墩吊装运输至乐轩厂内 2 车计 258 个，总计进场 1158 个，监理巡查。	
施 工 情 况	施 工 单 位	施 工 内 容 及 进 度
	上 海 久 能	1、支架基础柱墩混凝土浇筑 200 个完成约 50%。 2、定位测量放线未施工，已完成 70%还有两天的放线工作。 3、柱墩托盘运送至浇筑现场。 4、柱墩吊装运输至乐轩厂内 2 车计 258 个，总计进场 1158 个，进场 34%。
其 它 事 项		
本 日 现 场 监 理 人 员	孟文伟	
记 录 人：孟文伟	总监理工程师/总监理工程师代表（签字）：	

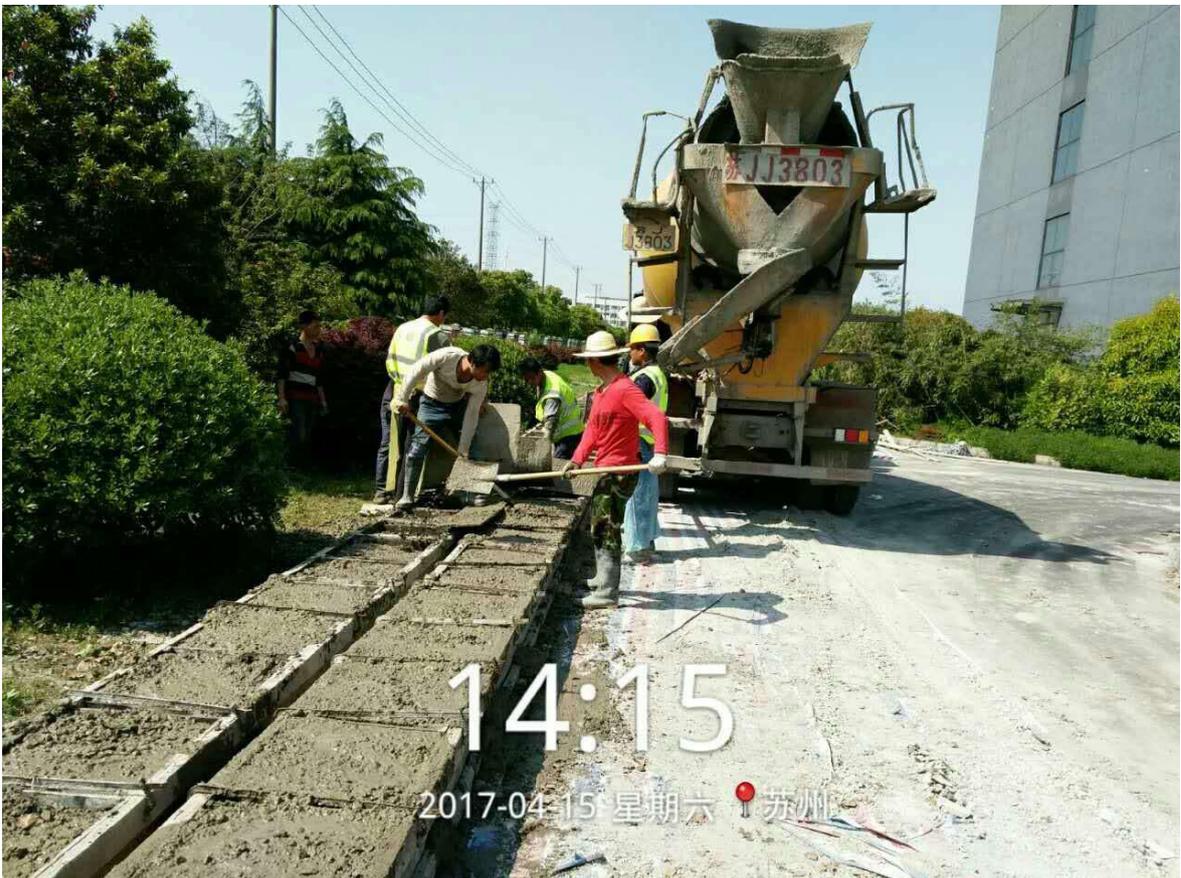

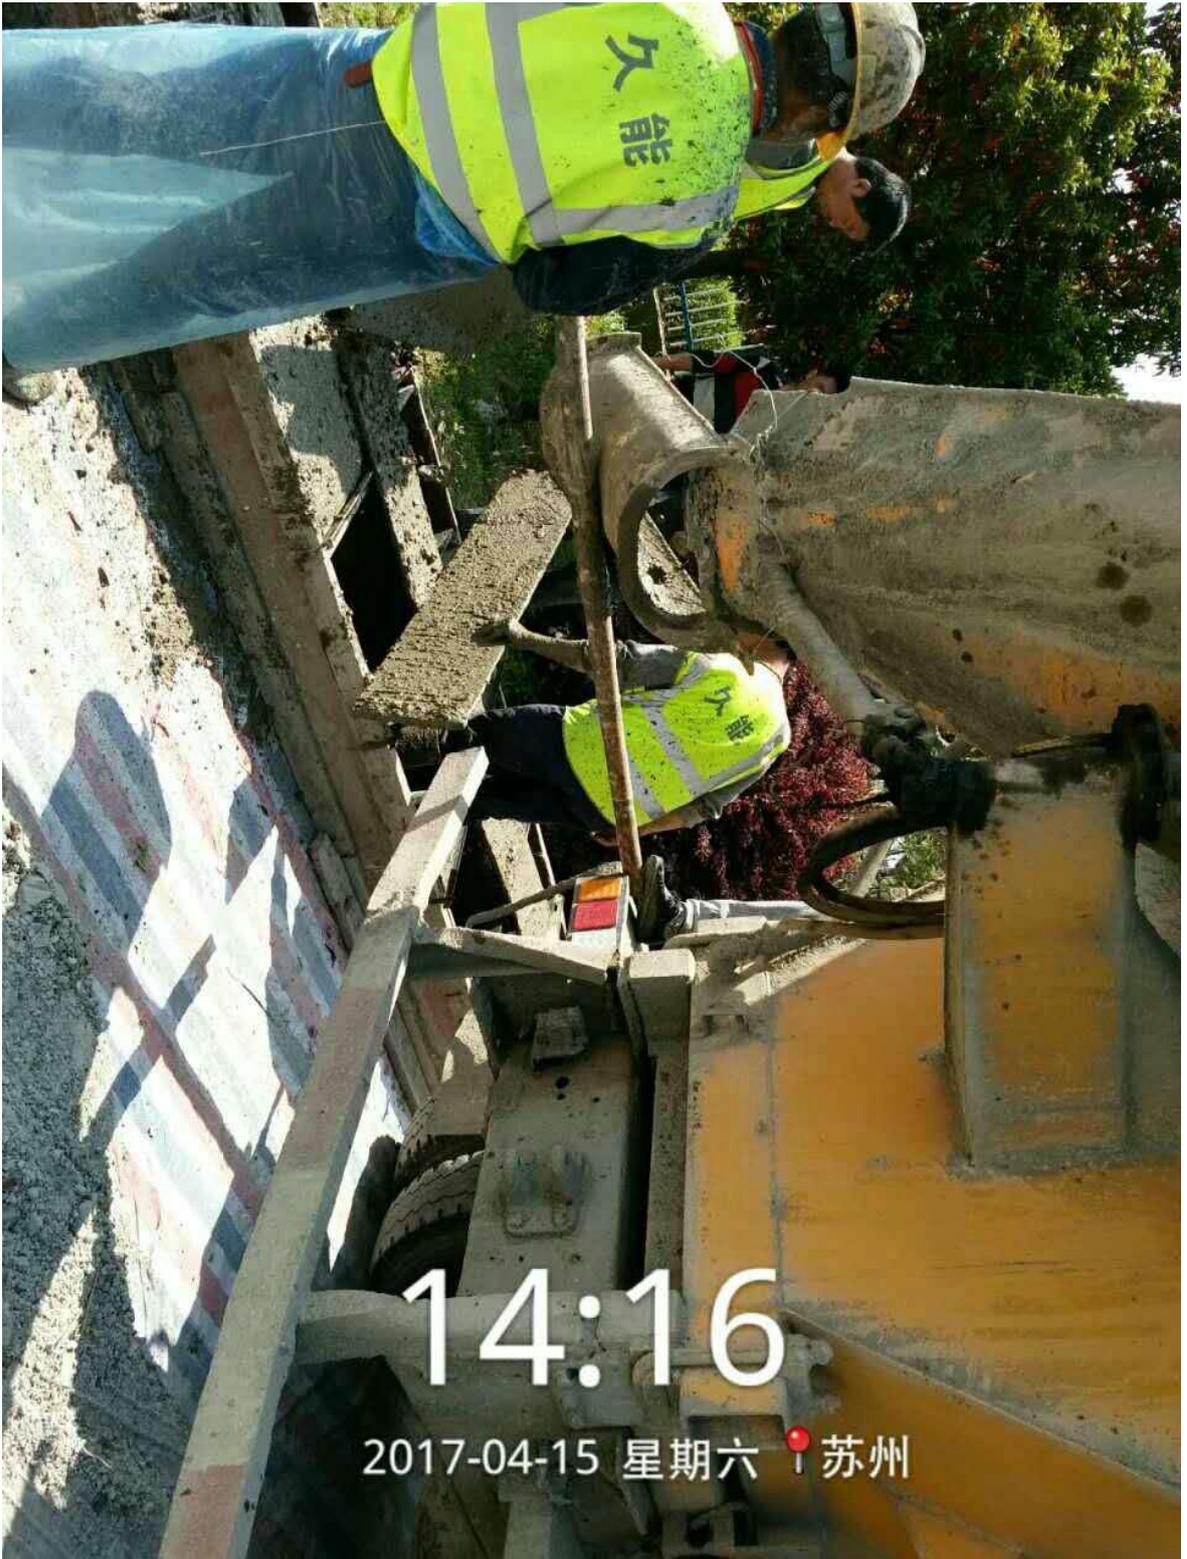

14:16

2017-04-15 星期六 | 苏州
