

监 理 日 志

日期：2017 年 04 月 25 日


星期：星期二

工程名称：苏州乐轩 2.0184MWp 分布式光伏电站项目

天气：多云


气温：16° ~27° c


监 理 工 作 情 况	1、支架基础柱墩混凝土浇筑监理检查。 2、支架柱墩分散就位施工，1#、2#厂房屋面完成就位完 50%监理检查 3、柱墩吊装运输一车，总计进场 1860 个，进场 57%监理检查。 3、柱墩吊装至屋面，总计吊装约 1800 个，总计完成吊装 54%监理安全旁站。	
施 工 情 况	施 工 单 位	施 工 内 容 及 进 度
	上 海 久 能	1、支架基础柱墩混凝土浇筑 200 个完成约 95%。 4、支架柱墩分散就位施工，1#、2#厂房屋面完成就位完成 45%。 4、柱墩吊装运两车，总计进场 2150 个，进场 65%。 5、柱墩吊装至屋面，总计吊装约 1800 个，总计完成吊装 54%。
其 它 事 项		
本 日 现 场 监 理 人 员		孟文伟
记 录 人：孟文伟		总 监 理 工 程 师 / 总 监 理 工 程 师 代 表（签 字）：

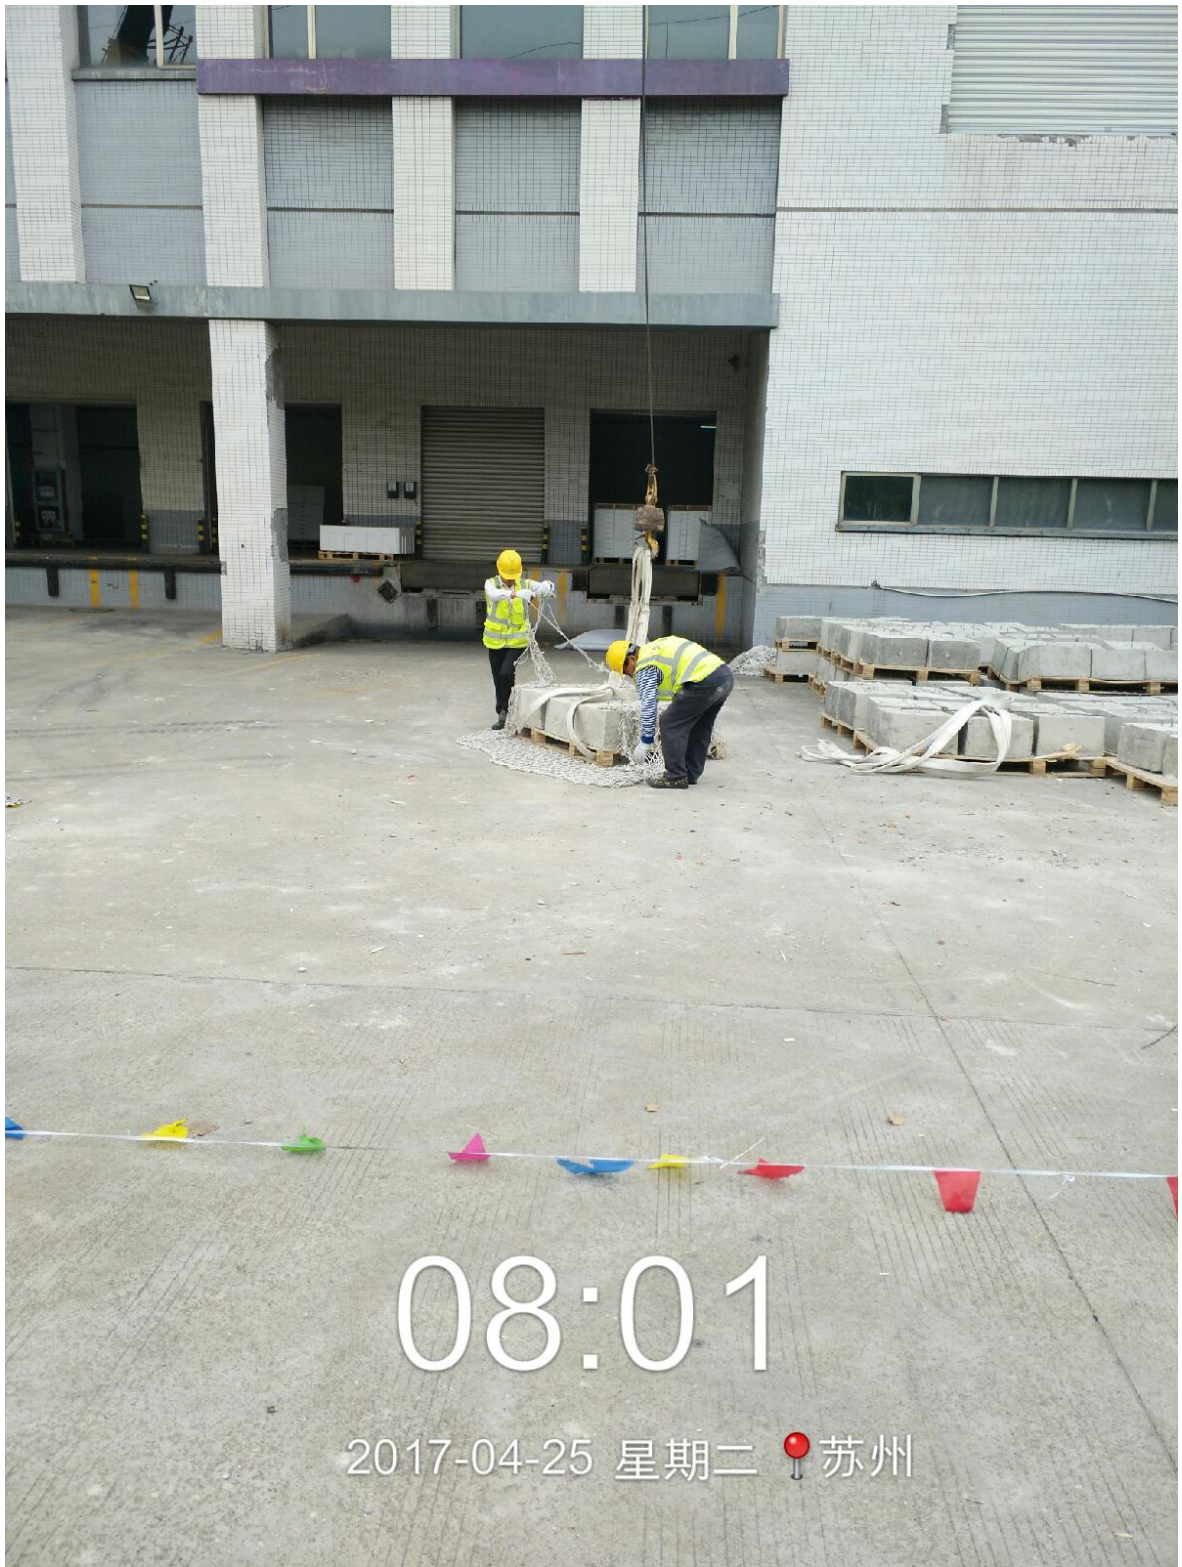

08:01

2017-04-25 星期二 📍 苏州

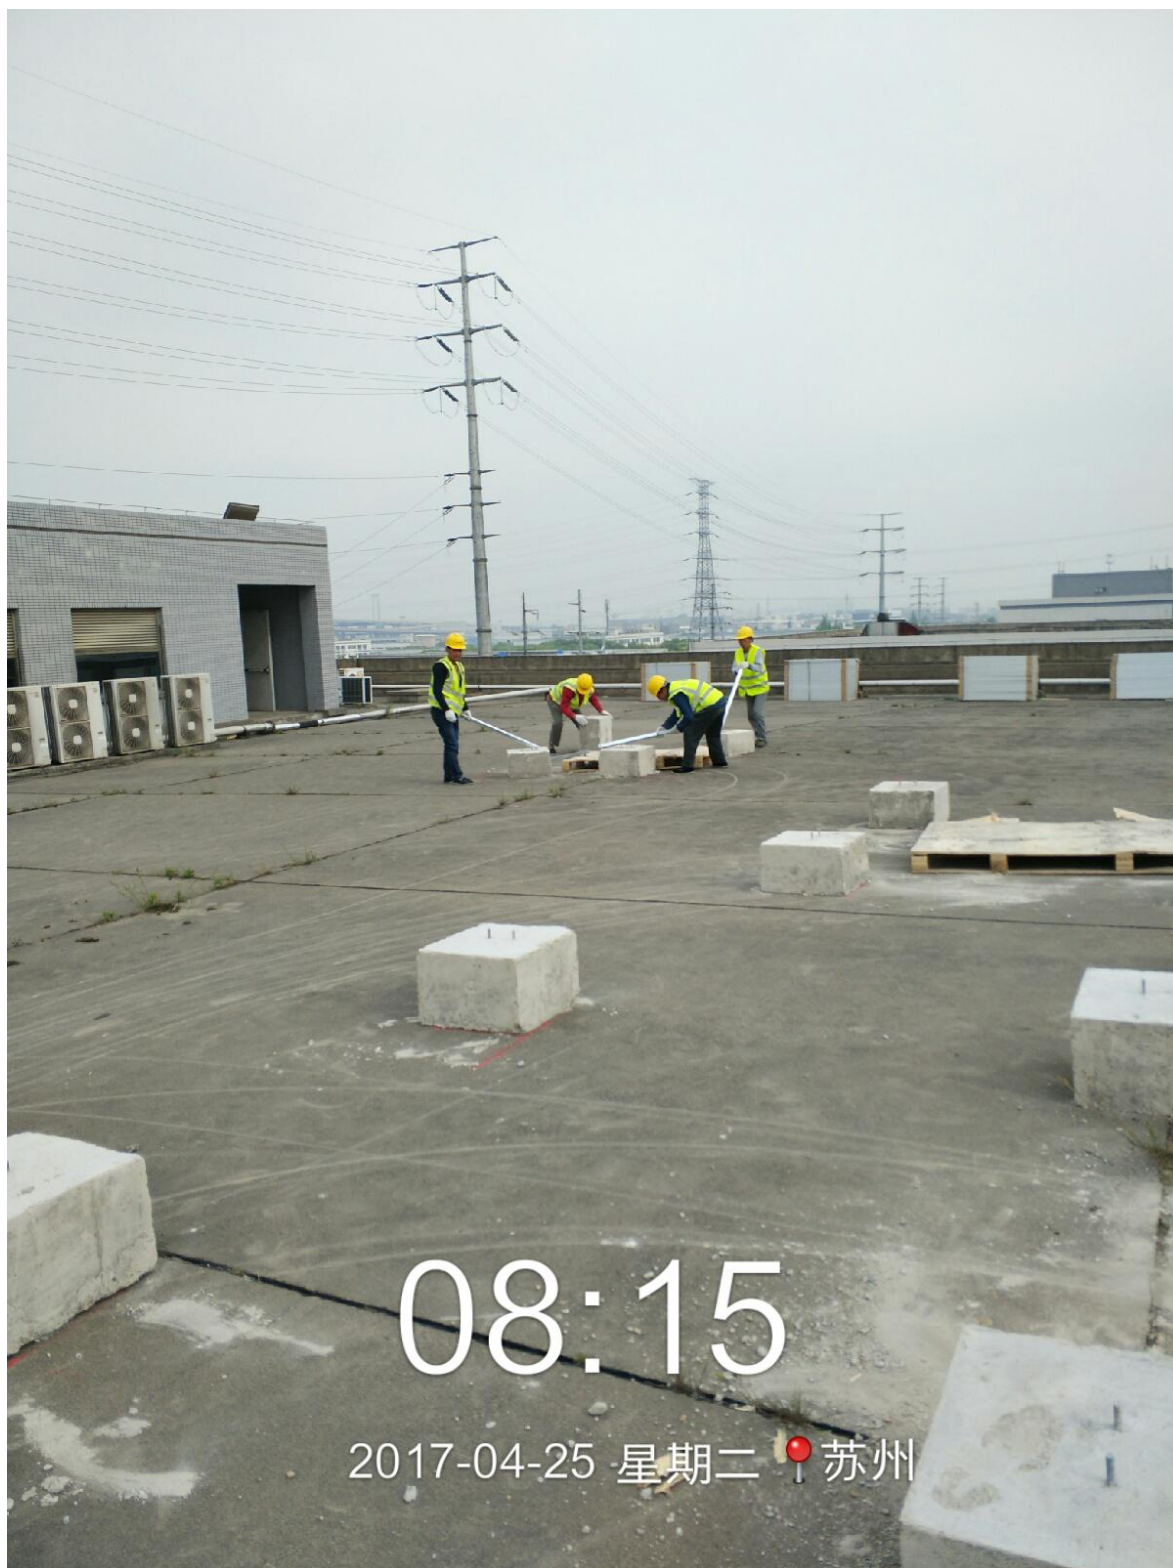

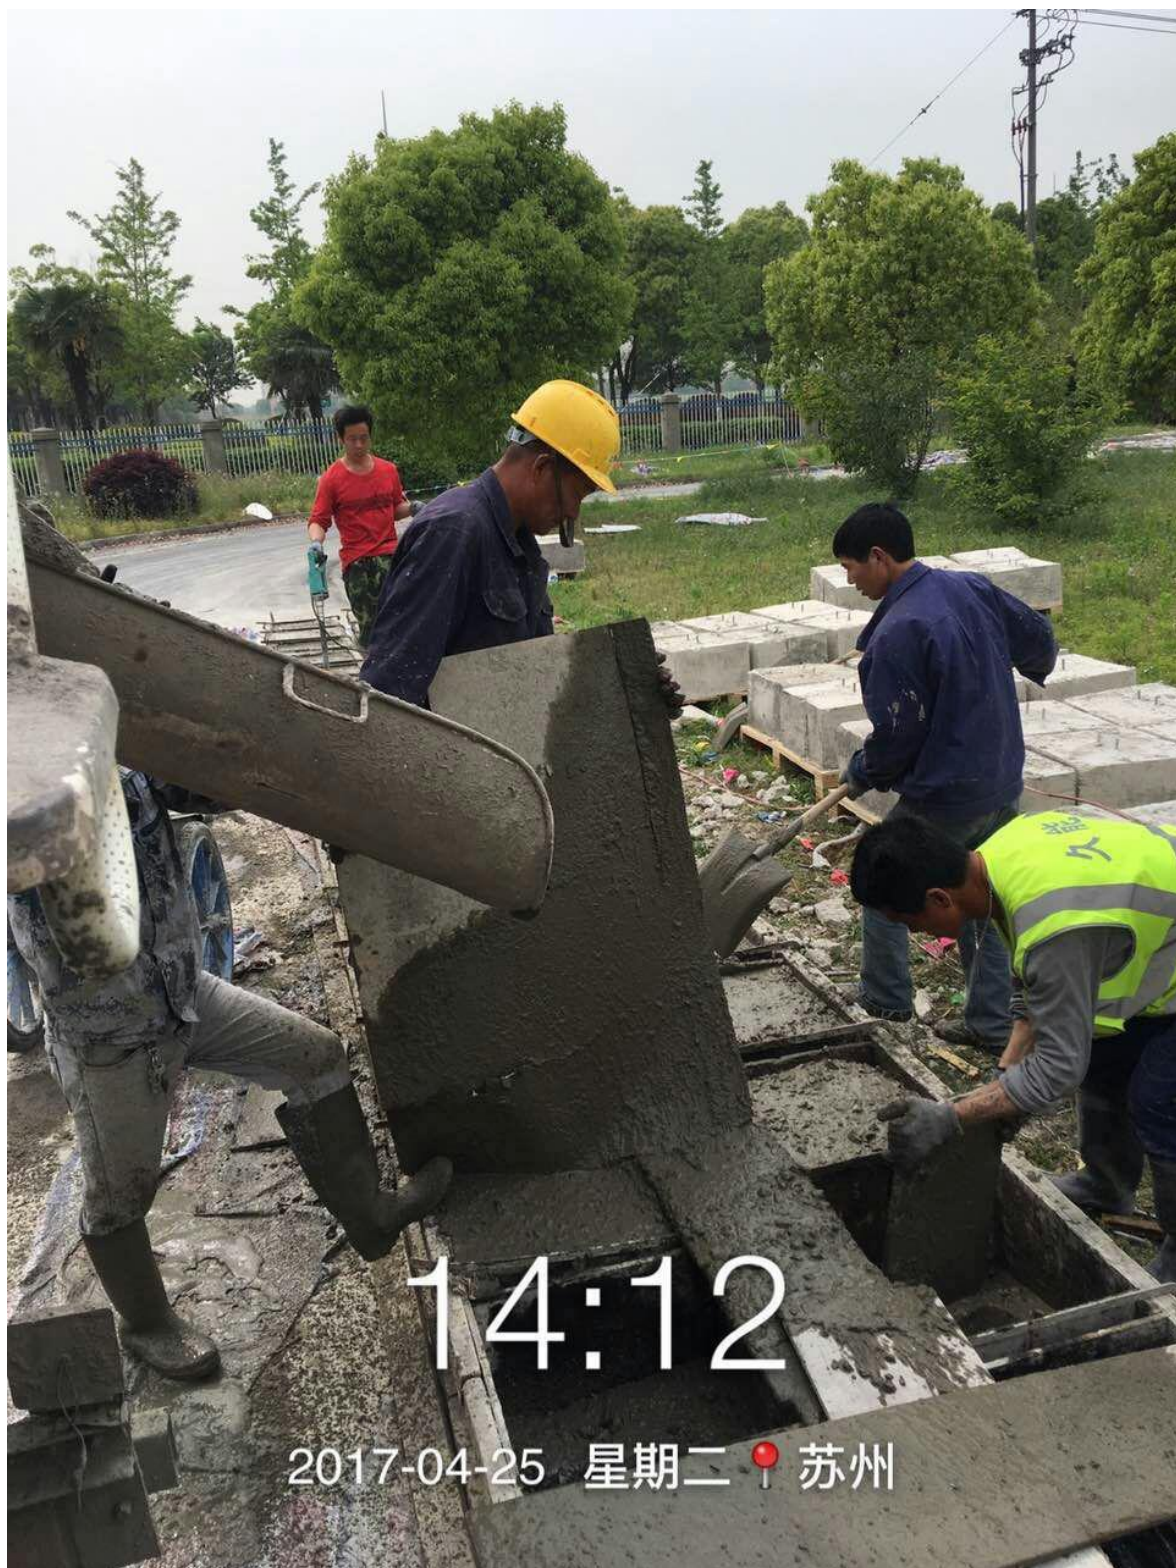

14:12

2017-04-25 星期二 📍 苏州

