

监 理 日 志

日期：2017 年 06 月 11 日


天气：晴

星期：星期日

气温：22° ~33° c

工程名称：河北以岭药业 1.53384MWp 分布式光伏发电项目工程

监 理 工 作 情 况	1、 现场正常巡查，对施工人员安全检查 2、 国际制药车间四平方线跨接检查，组件跨接四平方线穿镀锌钢管，符合设计图纸要求 3、 国际制药车间接地焊接检查，搭接尺寸符合焊接长度，符合设计图纸要求； 4、 下午工人休息	
施 工 情 况	施 工 单 位	施 工 内 容 及 进 度
	河 北 能 源	1、 国际制药车间四平方线摆放跨接（三人） 2、 国际制药车间接地焊接（二人）
其 它 事 项		
本 日 现 场 监 理 人 员		朱有敏
记 录 人：朱有敏		总 监 理 工 程 师 / 总 监 理 工 程 师 代 表（签字）：

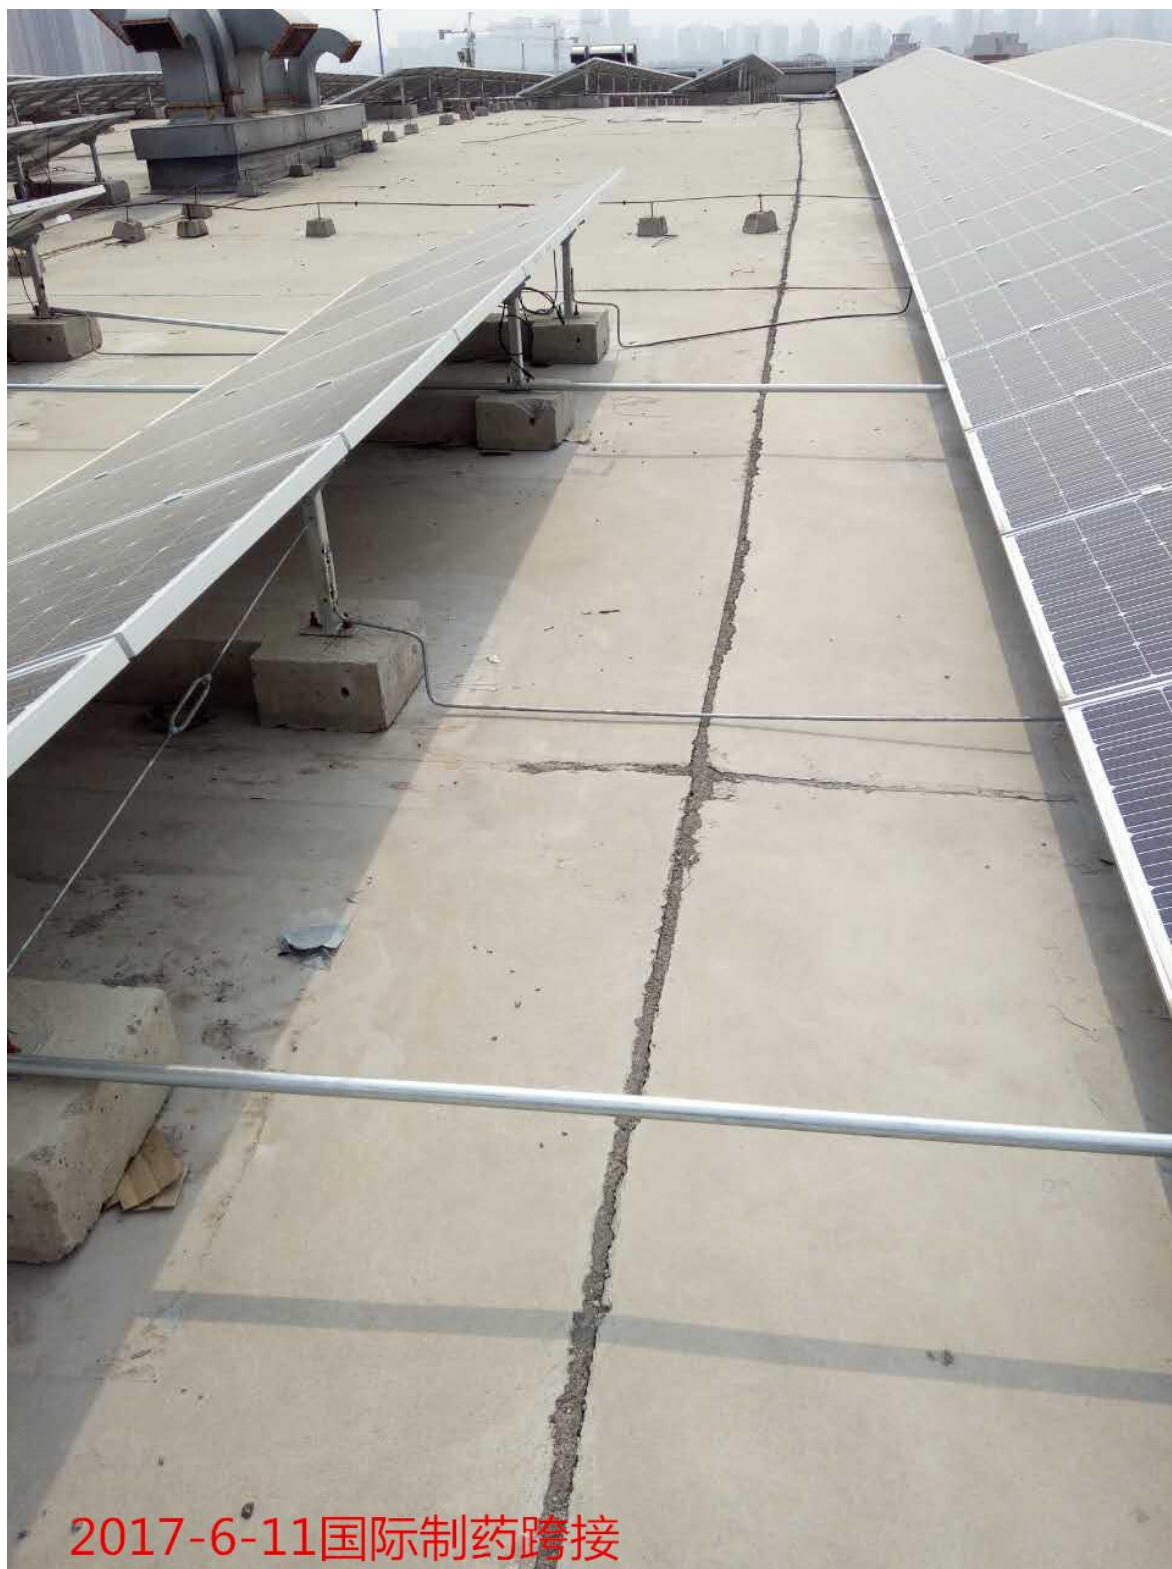

2017-6-11国际制药跨接
