

# 监 理 日 志

日期：2017年 06月 12日

天气：多云

星期：星期一


气温：20° ~30° c

工程名称：河北以岭药业 1.53384MWp 分布式光伏发电项目工程

监 理 工 作 情 况	<ol style="list-style-type: none"><li>1、 现场正常巡查，对施工人员安全检查</li><li>2、 国际制药车间逆变器安装检查，安装位置符合图纸要求，四平方线排放至逆变器位置；</li><li>3、 国际制药车间接地焊接检查，搭接尺寸符合焊接长度，符合设计图纸要求，全部完成；</li><li>4、 现场制作开关柜槽钢支架；</li></ol>	
施 工 情 况	施工单位	施工内容及进度
	河 北 能 源	<ol style="list-style-type: none"><li>1、 国际制药车间逆变器安装（三人）</li><li>2、 国际制药车间接地焊接（二人）</li></ol>
其 它 事 项		
本日现场监理人员		朱有敏
记录人：朱有敏		总监理工程师/总监理工程师代表（签字）：



2017-6-12国际制药接地焊接

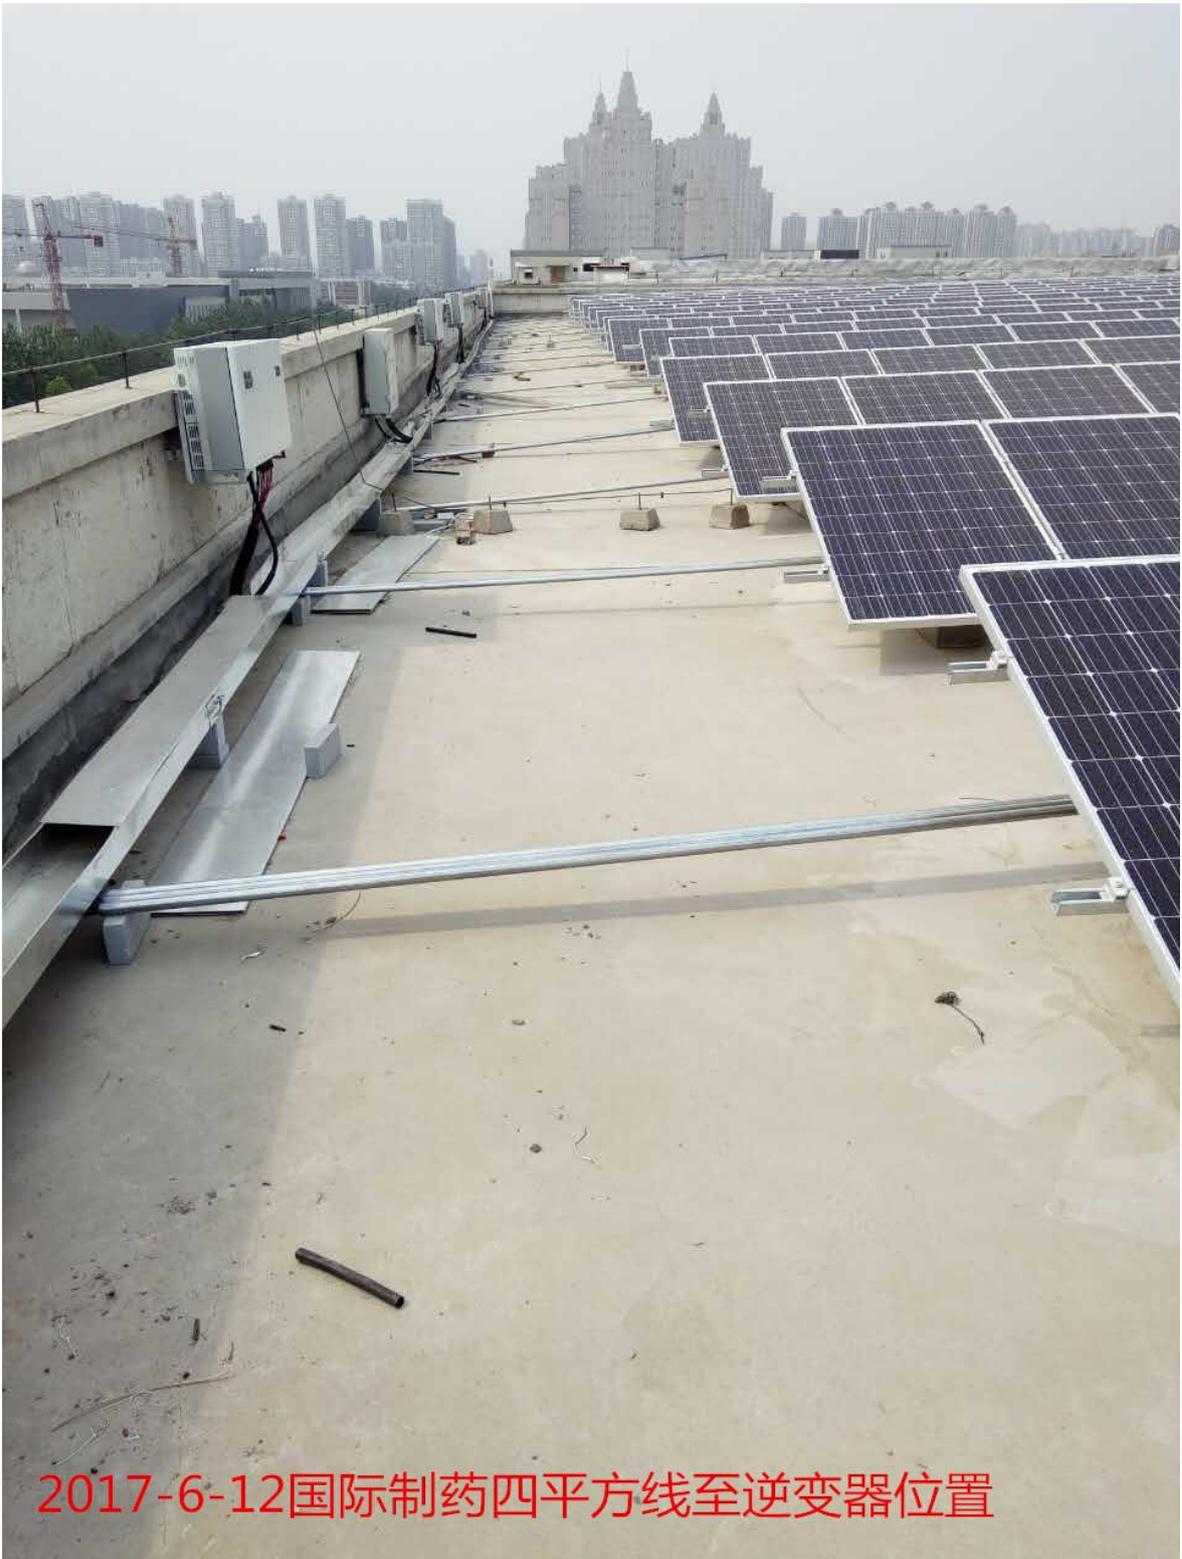

2017-6-12国际制药四平方线至逆变器位置



2017-6-12制作开关柜支架
