

监 理 日 志

日期：2017年 06月 24日

天气：晴

星期：星期六

气温：19° ~28° c

工程名称：河北以岭药业 1.53384MWp 分布式光伏发电项目工程


监 理 工 作 情 况	<ol style="list-style-type: none">1、 现场正常巡查，对施工人员安全检查2、 针剂车间接地焊接检查，焊接搭接长度符合设计规范要求；3、 针剂车间四平方线跨接检查，四平方线跨接穿镀锌钢管，符合设计要求；4、 针剂车间组件安装检查，发现组件安装不再一条水平线上，要求施工单位立即整改，按图施工；5、 针剂车间组件与组件之间接插线检查，接插线紧固，符合图纸要求；	
施 工 情 况	施 工 单 位 河 北 能 源	施 工 内 容 及 进 度 <ol style="list-style-type: none">1、 针剂车间接地焊接（一人）2、 针剂车间组件与组件接插线（二人）3、 针剂车间四平方线跨接（二人）4、 针剂车间组件安装（三人）
其 它 事 项		
本 日 现 场 监 理 人 员		朱有敏
记 录 人：朱有敏		总 监 理 工 程 师/总 监 理 工 程 师 代 表（签 字）：



2017-6-24针剂车间四平方线跨接



2017-6-24针剂车间接地焊接

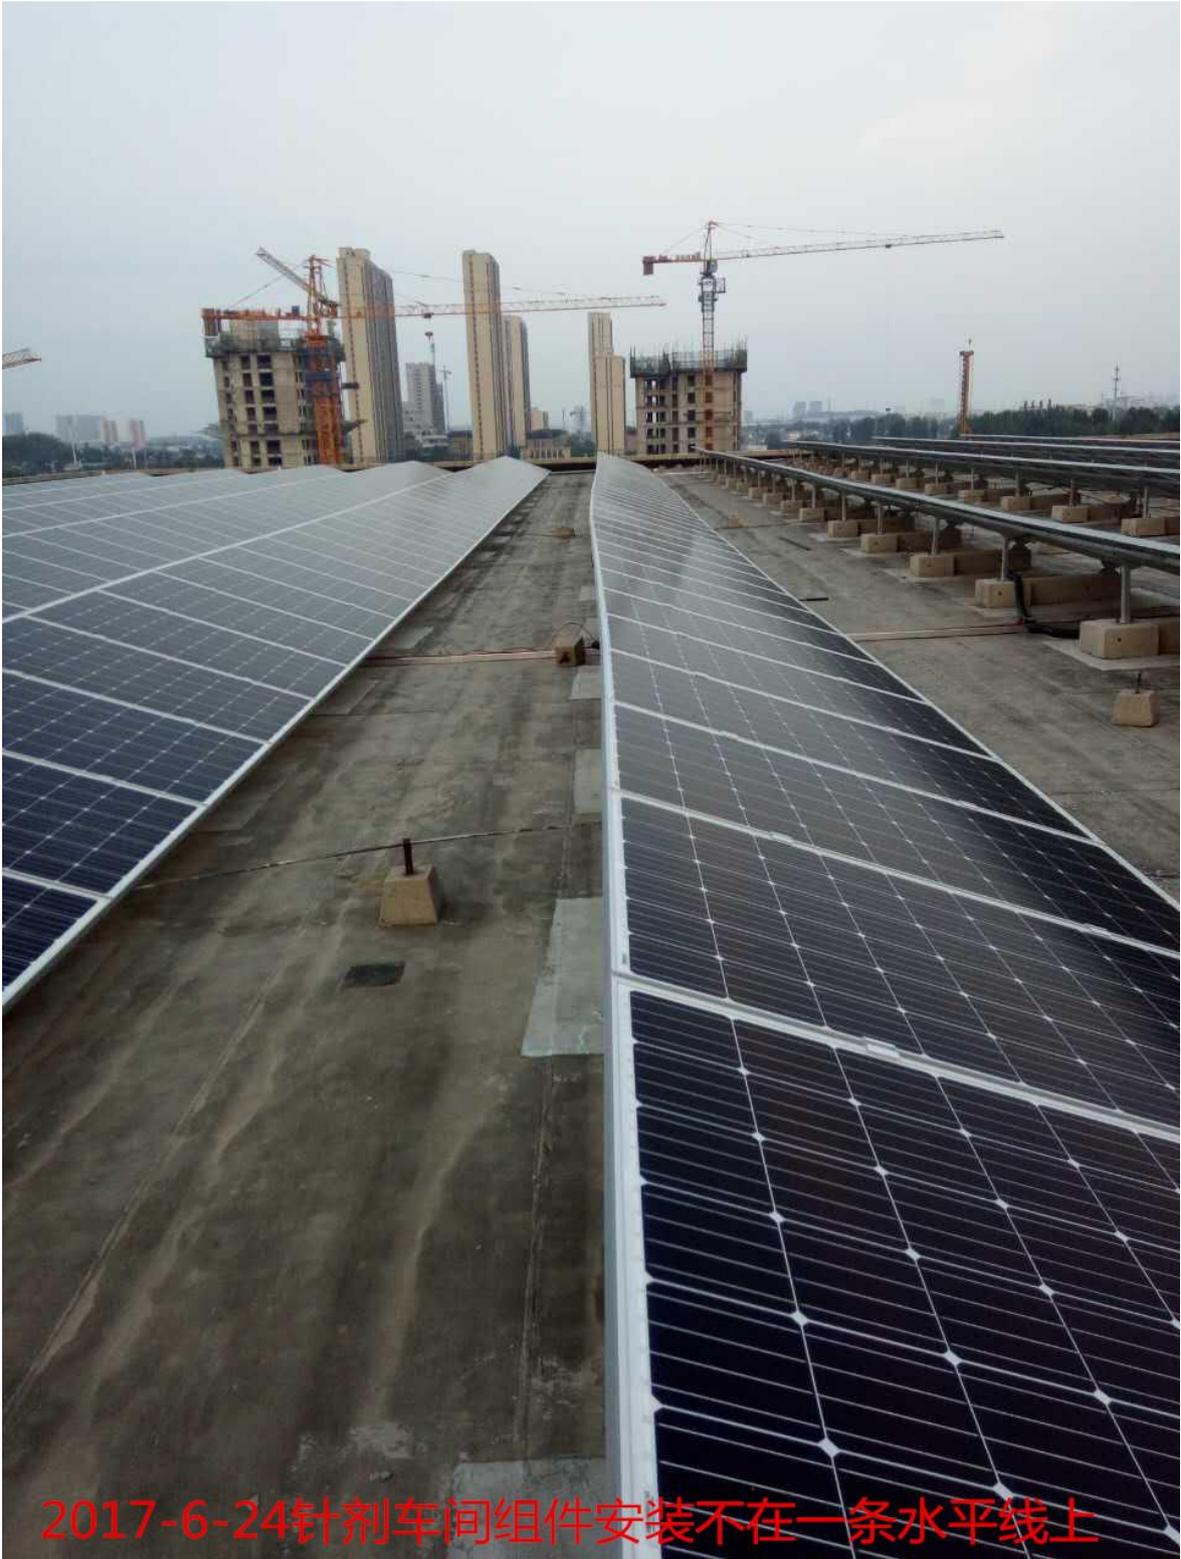

2017-6-24针剂车间组件安装不在一条水平线上



2017-6-24针剂车间组件接插线
