

监 理 日 志

日期：2017 年 06 月 6 日


天气：晴

星期：星期二


气温：15° ~23° c

工程名称：河北以岭药业 1.53384MWp 分布式光伏发电项目工程


监 理 工 作 情 况	1、现场正常巡查，对施工人员安全检查 2、饮品车间四平方线进逆变器接线检查，MC4 接头压紧，进入逆变器接头紧固，安全施工，符合设计要求； 3、饮品车间逆变器进汇流箱 4X16 电缆线接线检查，两头铜接头压紧，电缆铺设摆放符合设计图纸要求；	
施 工 情 况	施 工 单 位	施 工 内 容 及 进 度
	河北能源	1、饮品车间逆变器接线（五人） 2、饮品间四汇流箱电缆摆放（四人）
其 它 事 项		
本 日 现 场 监 理 人 员		朱有敏
记 录 人：朱有敏		总 监 理 工 程 师 / 总 监 理 工 程 师 代 表（签字）：

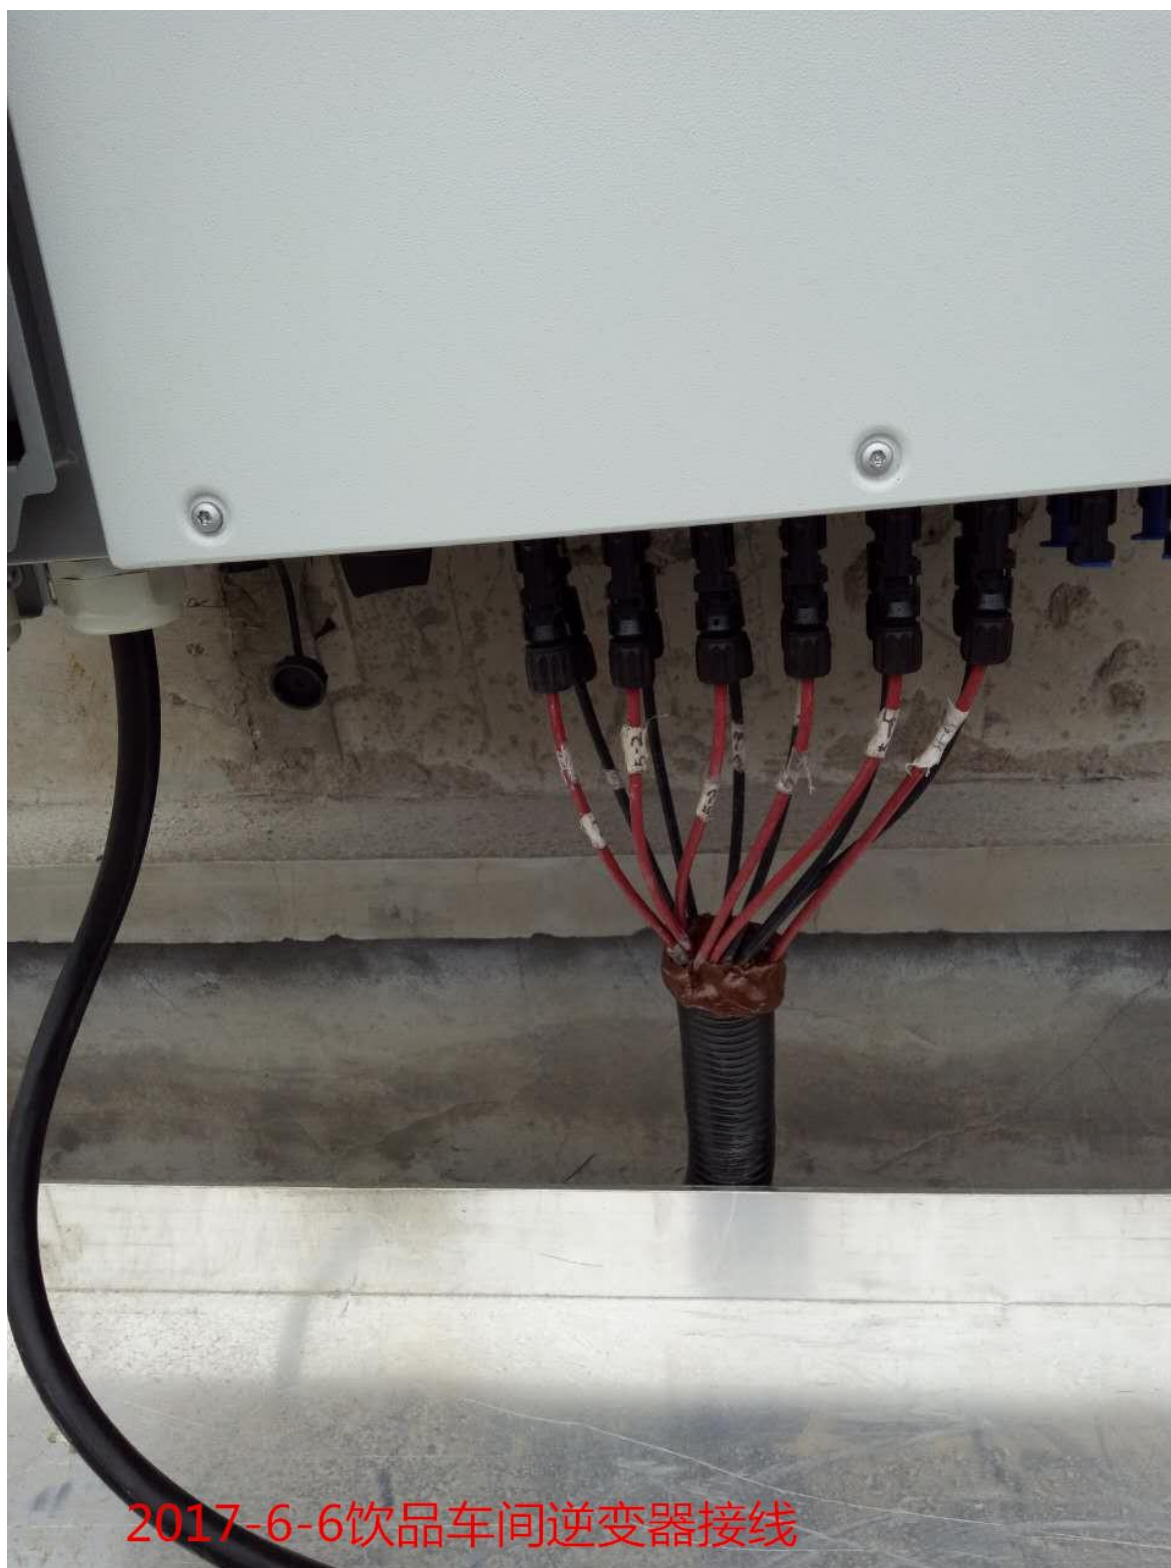

2017-6-6饮品车间逆变器接线

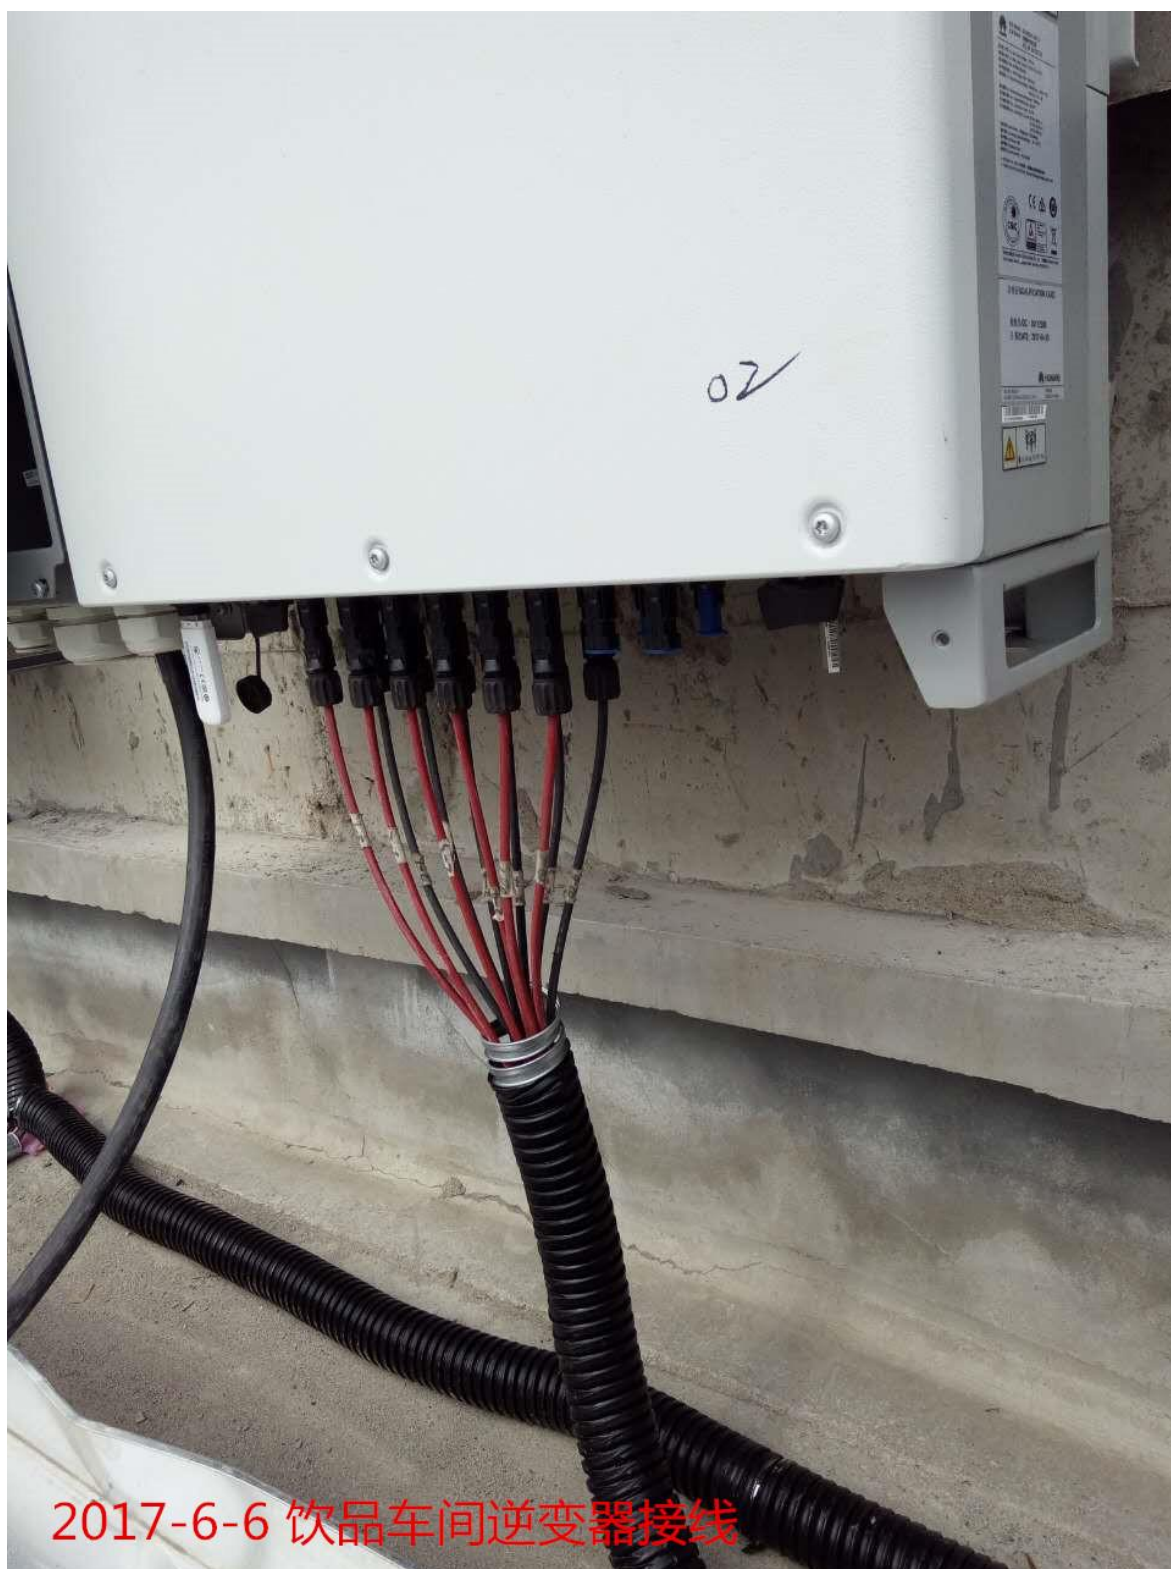

2017-6-6 饮品车间逆变器接线

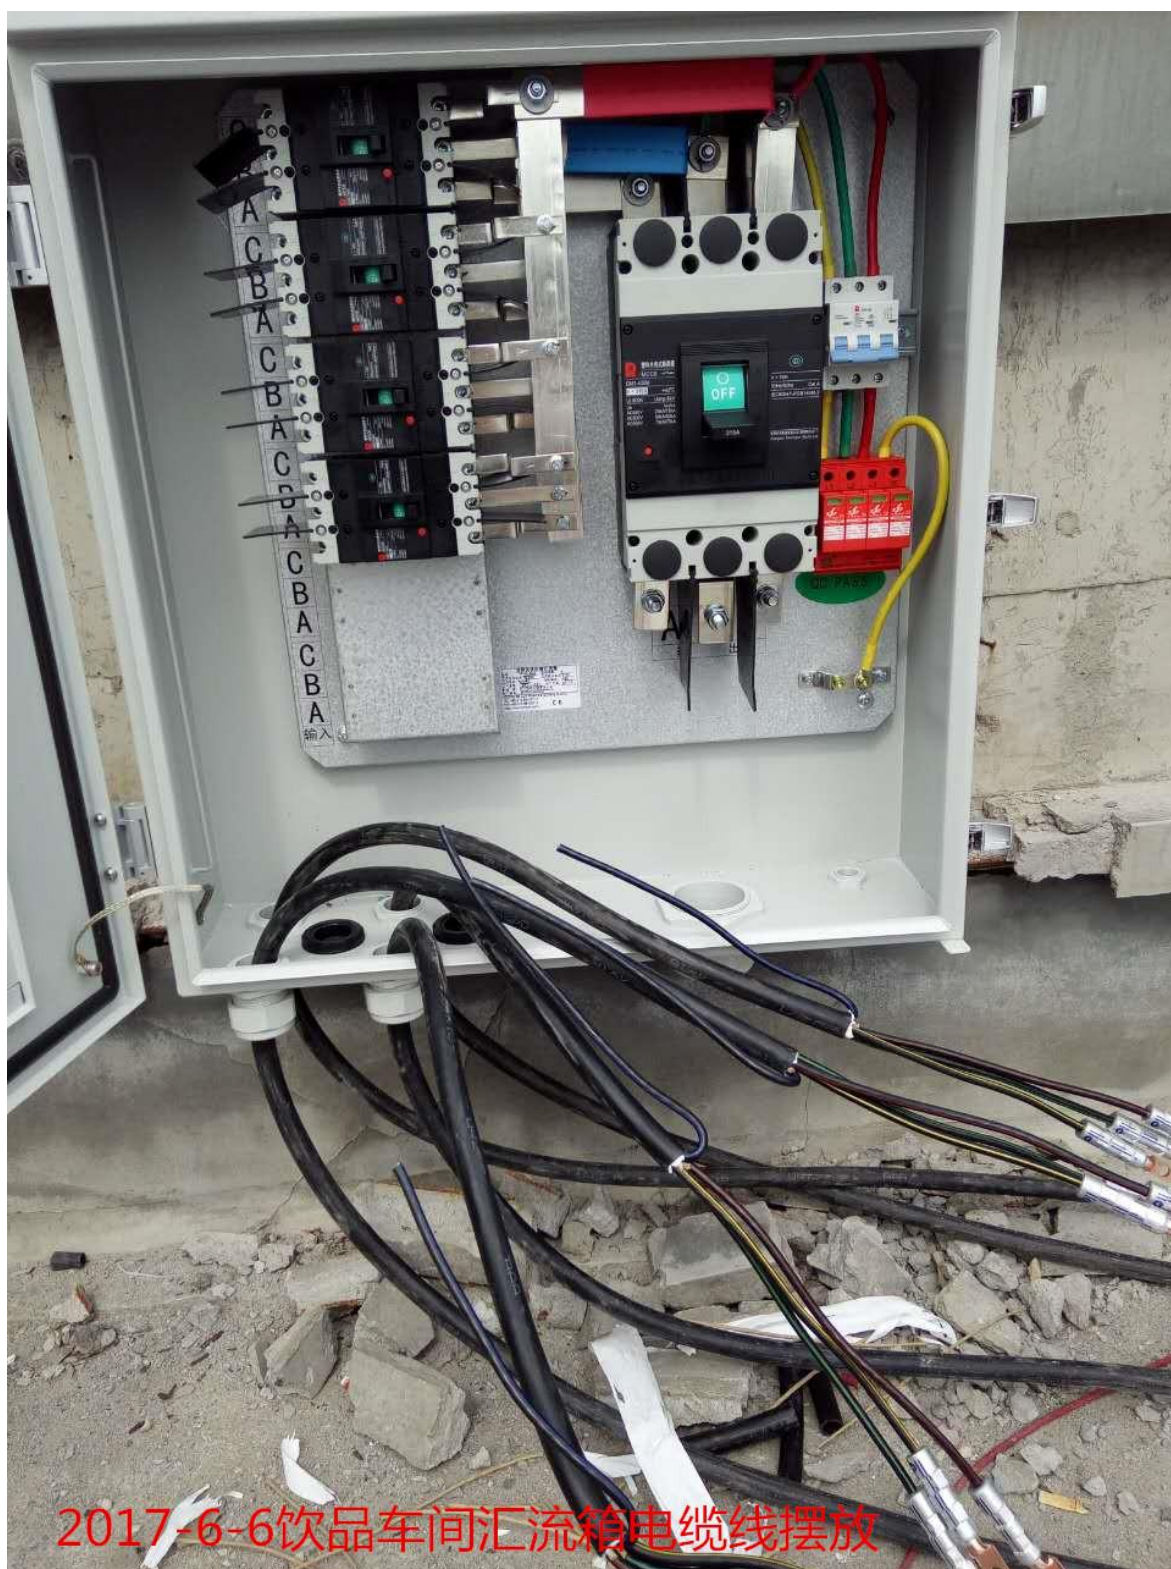

2017-6-6饮品车间汇流箱电缆线摆放
