

监 理 日 志 ()

日期: 2017 年 5 月 15 日

天气: 多云转晴

星期: 二

气温: 30° -11°

工程名称: 阳曲县乐照能源科技有限公司万事兴 5.5MWp 分布式电站项目

监 理 工 作 情 况	1、设计院正在完善图纸,工人在 8#安装组件,要求接地、压块的紧固点弹垫压平,组件安装整齐。 2、7#支架固定,安装组件压块,要求注意安全,采光带防护安装到位,注意紧固点弹垫压平,支架安装方整。 3、1#厂房屋顶安装桥架,要求注意安全,拉好警戒线,做好屋面彩钢板的保护。 4、箱、逆变基础砌筑,要求砌筑砂浆饱满度、水平、垂直及平整度达到规范要求。 5、箱、逆变基础圈梁钢筋绑扎、制模。	
施 工 情 况	施工单位	施工内容及进度
	新 能 量 科 技 股 份 有 限 公 司	1、8#屋面 10 安装组件。 2、1#10 人安装桥架。 3、8 人箱、逆变基础砌筑,绑钢筋、制模。 4、7#12 人固定支架,安装组件压块。
其 它 事 项		
本日现场监理人员		王明官
记录人:王明官		总监理工程师/总监理工程师代表(签字):




箱、逆变基础钢筋绑...

2017-05-15



7号厂房支架固定上…
2017-05-15

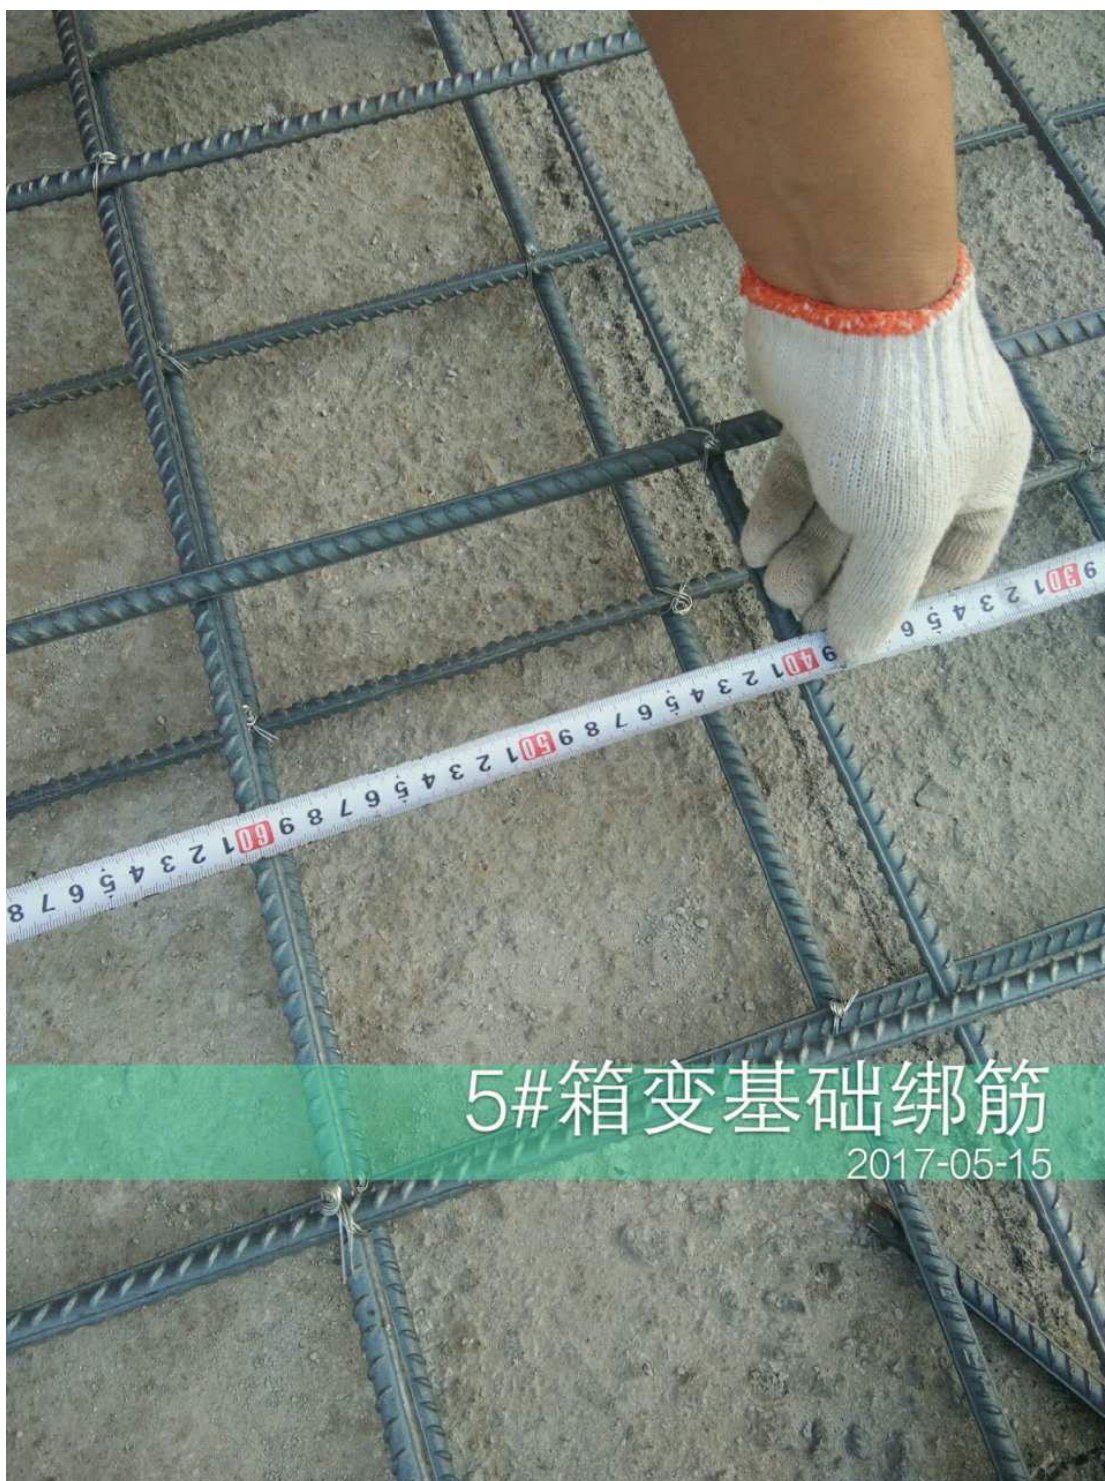

5#箱变基础绑筋

2017-05-15
