

监 理 日 志 ()

日期: 2017 年 5 月 2 日

天气: 多云

星期: 二

气温: 25° -12°


工程名称: 阳曲县乐照能源科技有限公司万事兴 5.5MWp 分布式电站项目

监 理 工 作 情 况	1、设计院正在完善图纸，工人在 2#、3#安装组件，要求接地、压块的紧固点弹垫压平，组件安装整齐。 2、4#支架固定，要求注意安全，采光带防护安装到位，支架紧固点弹垫压平，支架安装方整，下午吊装组件并做好一切安全措施，确保安全施工。 3、预制仓基础砌筑，要求砂浆严格控制好配合比，饱满度达到规范，按图预留好百页窗和预埋管。 4、及时向业主汇报现场实际工作量及施工情况，并要求图纸尽快进场。 5、整理上传安全会议纪要及其他监理资料。	
施 工 情 况	施 工 单 位	施 工 内 容 及 进 度
	新 能 量 科 技 股 份 有 限 公 司	1、4#屋面 7 人组装、固定支架，安装组件压块，吊装组件，分铺散开组件。 2、2#、3#17 人安装组件。 3、8 人砌筑基础。
其 它 事 项		
本 日 现 场 监 理 人 员		王 明 官
记 录 人: 王 明 官		总 监 理 工 程 师/总 监 理 工 程 师 代 表 (签 字) :



预制仓基础砌筑

2017-05-02

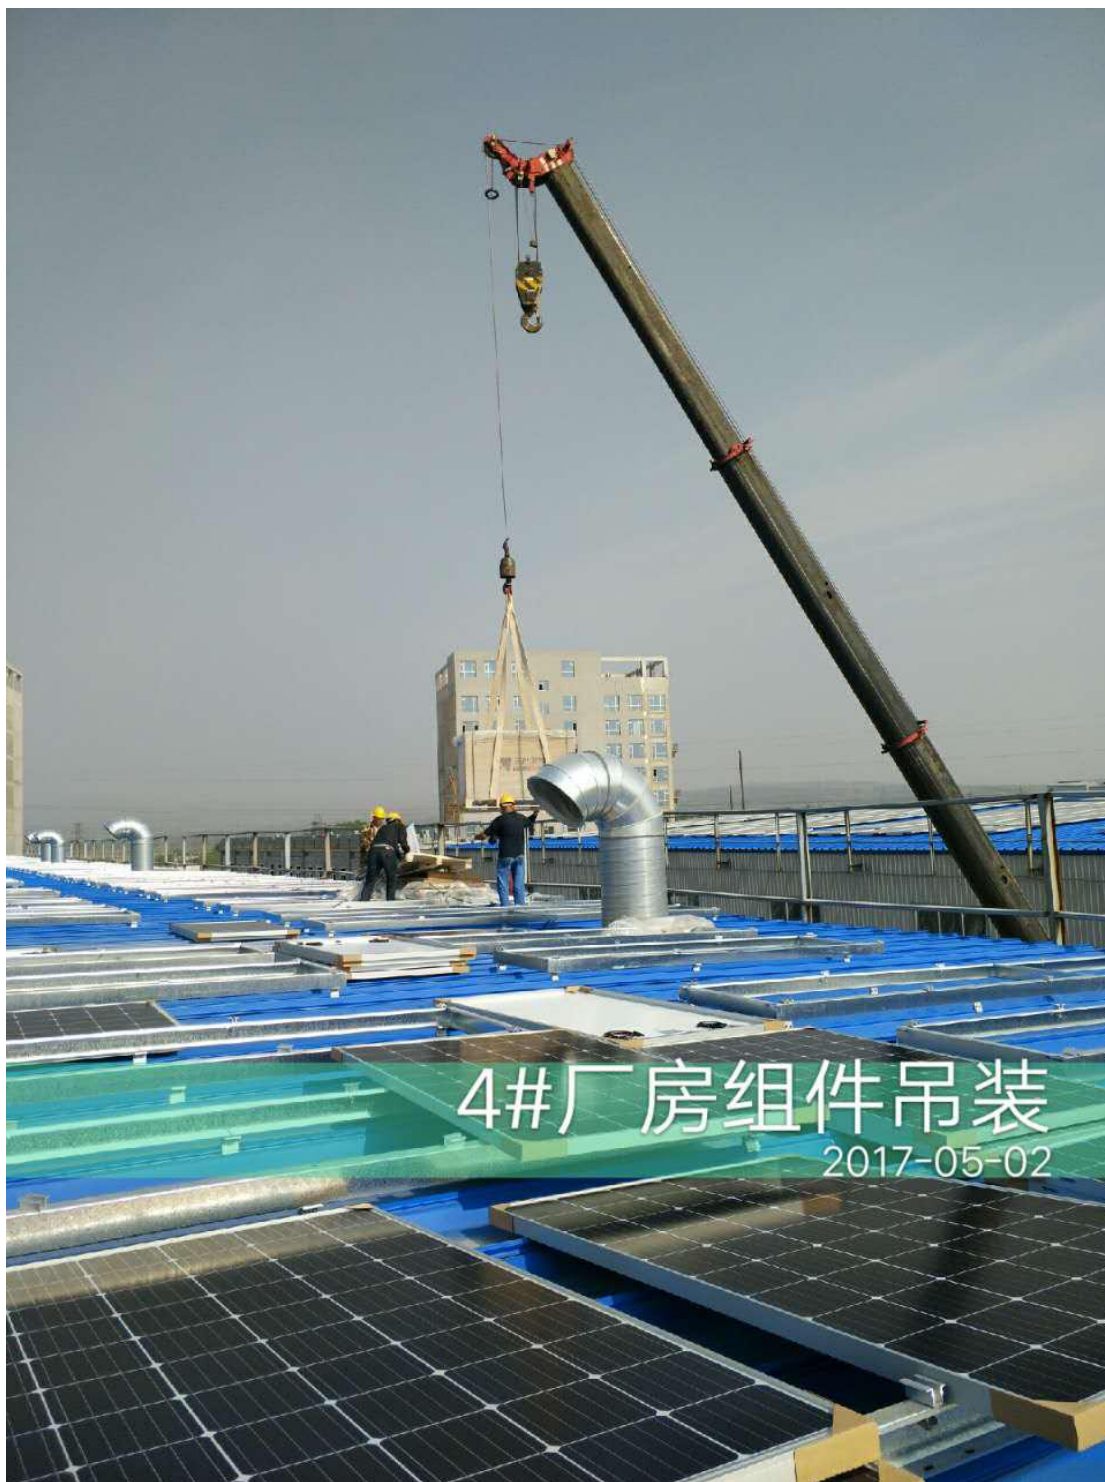

4#厂房组件吊装
2017-05-02



3#厂房组件安装

2017-05-02
