

# 监 理 日 志 ( )

日期：2017 年 6 月 1 日


天气：晴转多云

星期：四

气温：32° -15°

工程名称：阳曲县乐照能源科技有限公司万事兴 5.5MWp 分布式电站项目

监 理 工 作 情 况	<p>1、工人在 6#、7#厂房屋顶放汇流箱到逆变 2×70 电缆，注意安全，安装工人避开采光带，采光带拉好警戒线，严禁踩踏。</p> <p>2、4#箱、逆变到 5#箱、逆变挖电缆沟埋管铺混凝土。开挖深度、宽度达到设计要求。</p> <p>3、8#屋顶放组件方阵到汇流箱电缆，要求做好电缆标记，注意施工安全，采光带防护到位。</p>	
施 工 情 况	施 工 单 位	施 工 内 容 及 进 度
	新 能 量 科 技 股 份 有 限 公 司	<p>1、6 名工人在 8#厂房屋顶防电缆。</p> <p>2、18 名工人 4#、8#放 2×70 电缆。</p> <p>3、12 名工人在 4#——5#箱、逆变挖电缆沟、埋管、铺混凝土。</p>
其 它 事 项		
本 日 现 场 监 理 人 员		王 明 官
记 录 人：王 明 官		总 监 理 工 程 师 / 总 监 理 工 程 师 代 表 ( 签 字 )：

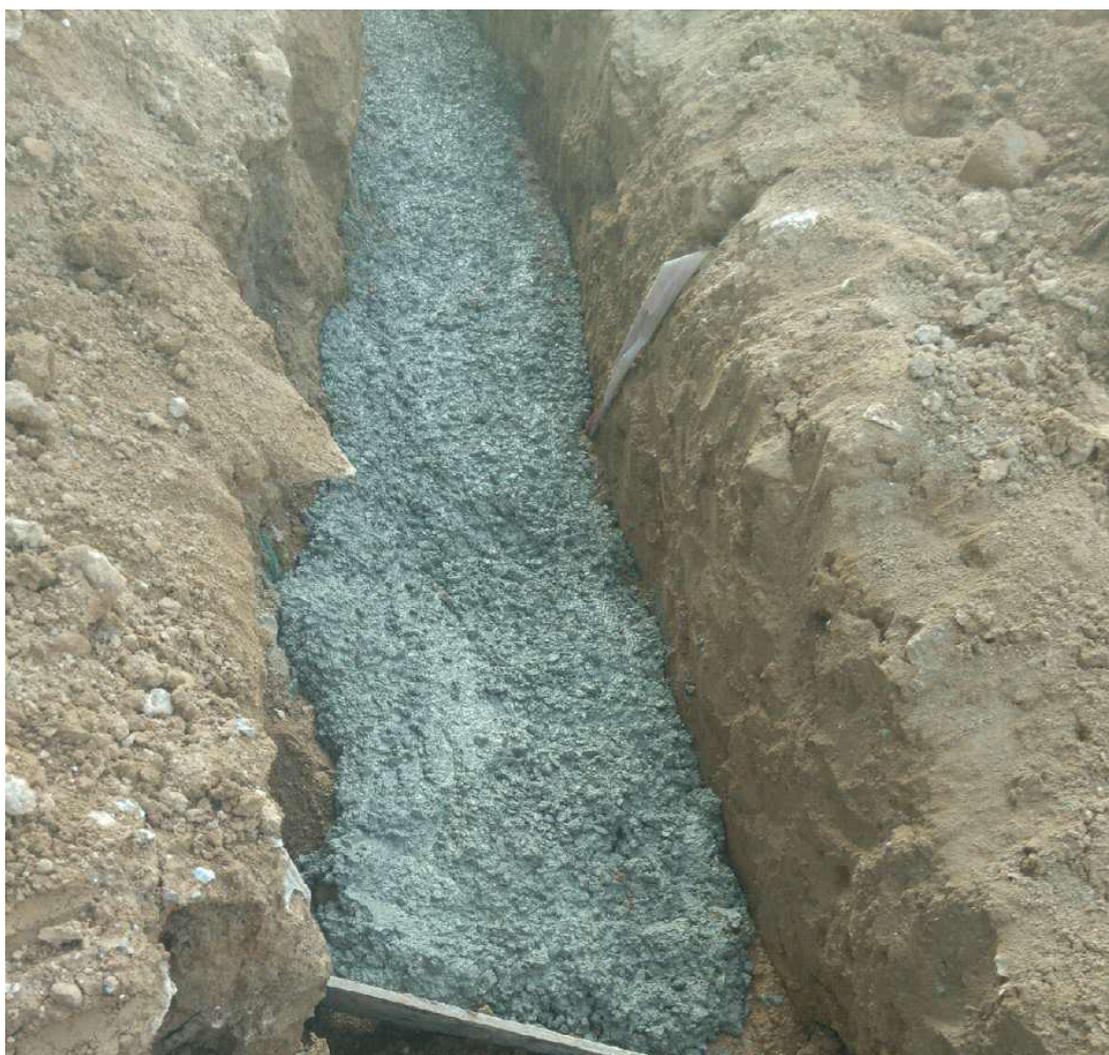

# 电缆沟埋管铺混凝土

2017-06-01





7#布放2x70  
2017-06-01
