

监 理 日 志 ()

日期: 2017 年 04 月 18 日

天气: 多云

星期: 星期二

气温: 12~23°

工程名称: 迅力汽车 4.14MWp 分布式光伏电站工程

监 理 工 作 情 况	1、 施工现场巡检, 督促施工单位安全文明施工。 2、 南面屋顶组件安装 600 块。北面屋顶导轨安装。监理进行巡检, 符合图纸设计要求。 3、 1#、2#箱逆变基础圈梁钢筋绑扎、模板支护。3#箱逆变基础圈梁混凝土浇筑。砼浇筑监理进行旁站。 4、 开关站基础放线。 5、 箱变到货一台, 监理进行外观检查。 6、 下午 18:00 召开《监理工程例会》。 7、 整理监理及施工资料。	
施 工 情 况	施 工 单 位	施 工 内 容 及 进 度
	山 东 远 大 新 能 源 科 技 有 限 公 司	1、 南面屋顶组件安装 600 块。北面屋顶导轨安装。 2、 1#、2#箱逆变基础圈梁钢筋绑扎、模板支护。3#箱逆变基础圈梁混凝土浇筑。 3、 开关站基础放线。 4、 箱变到货一台。 5、 一台吊车, 一台搅拌机, 两辆三轮车, 七辆小推车, 安装施工人员 47 人。土建施工人员 10 人。
其 它 事 项		
本日现场监理人员		付铭飞
记录人: 付铭飞		总监理工程师/总监理工程师代表(签字):




04月
18





04月
18



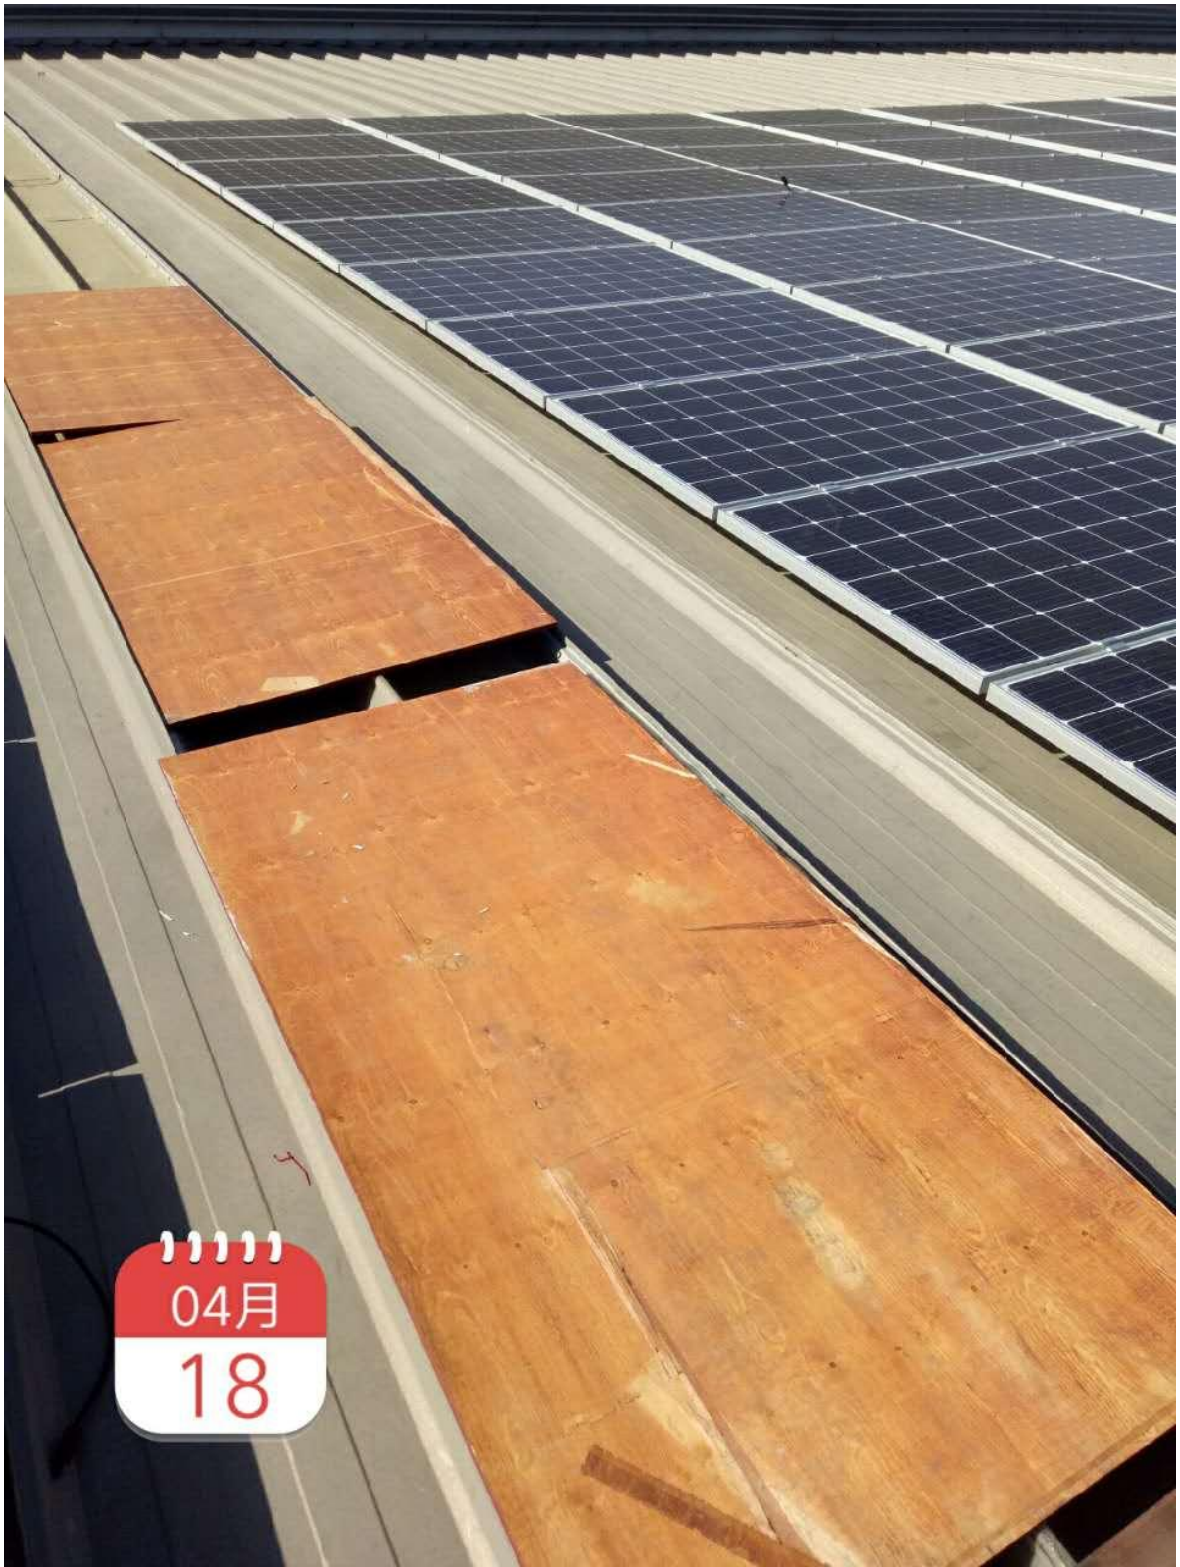

04月
18
