

监 理 日 志 ()

日期: 2017 年 04 月 21 日


天气: 晴

星期: 星期四

气温: 7~20°

工程名称: 迅力汽车 4.14MWp 分布式光伏电站工程

监 理 工 作 情 况	1、 施工现场巡检, 督促施工单位安全文明施工。 2、 南面屋顶组件安装, 西面屋顶组件安装。安装 2000 块。监理进行巡检, 符合图纸设计要求。 3、 开关站基础砖墙砌筑。 4、 整理监理及施工资料。	
施 工 情 况	施工单位	施工内容及进度
	山 东 远 大 新 能 源 科 技 有 限 公 司	1、 南面屋顶组件安装, 西面屋顶组件安装。安装 2000 块。 2、 开关站基础砖墙砌筑。 3、 一台吊车, 一台搅拌机, 两辆三轮车, 七辆小推车, 安装施工人员 47 人。 土建施工人员 10 人。
其 它 事 项		
本日现场监理人员		付铭飞
记录人: 付铭飞		总监理工程师/总监理工程师代表(签字):

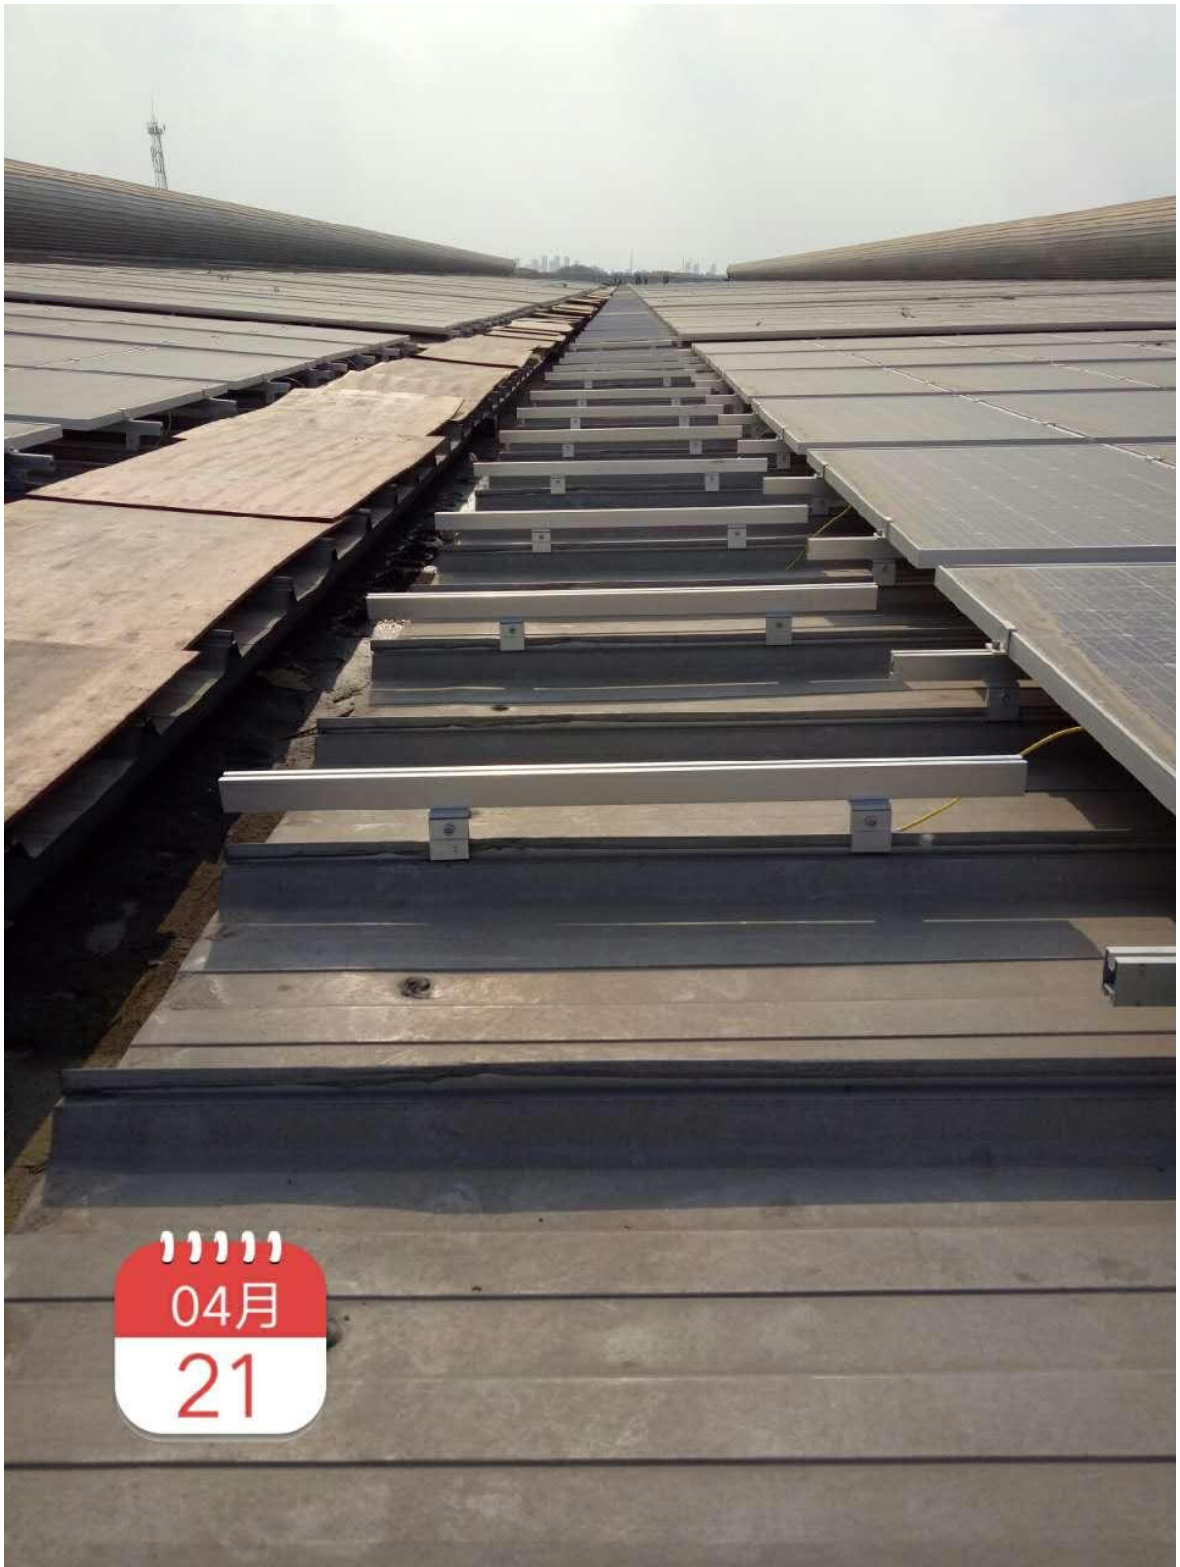

04月
21



04月
21



