

# 监 理 日 志 ( )

日期: 2017 年 04 月 27 日


天气: 晴

星期: 星期四

气温: 10~24°

工程名称: 迅力汽车 4.14MWp 分布式光伏电站工程

监 理 工 作 情 况	1、 施工现场巡检, 督促施工单位安全文明施工。 2、 南面屋顶组与组之间接地安装, 桥架及检修通道安装。 3、 北面屋顶组件安装完成。累计安装 12992 片。监理进行巡检, 基本符合图纸设计要求。 4、 开关站基础高压侧圈梁砼浇筑。钢爬梯钢结构安装。 5、 整理监理及施工资料。	
施 工 情 况	施 工 单 位	施 工 内 容 及 进 度
	山 东 远 大 新 能 源 科 技 有 限 公 司	1、 南面屋顶组与组之间接地安装, 桥架及检修通道安装。 2、 北面屋顶组件安装完成。累计安装 13000 片。 3、 开关站基础圈梁高压侧混凝土浇筑。钢爬梯钢结构安装。  一台搅拌机, 两辆三轮车, 七辆小推车, 安装施工人员 47 人。 土建施工人员 10 人。
其 它 事 项		
本 日 现 场 监 理 人 员	付 铭 飞	
记 录 人: 付 铭 飞	总 监 理 工 程 师 / 总 监 理 工 程 师 代 表 ( 签 字 ) :	

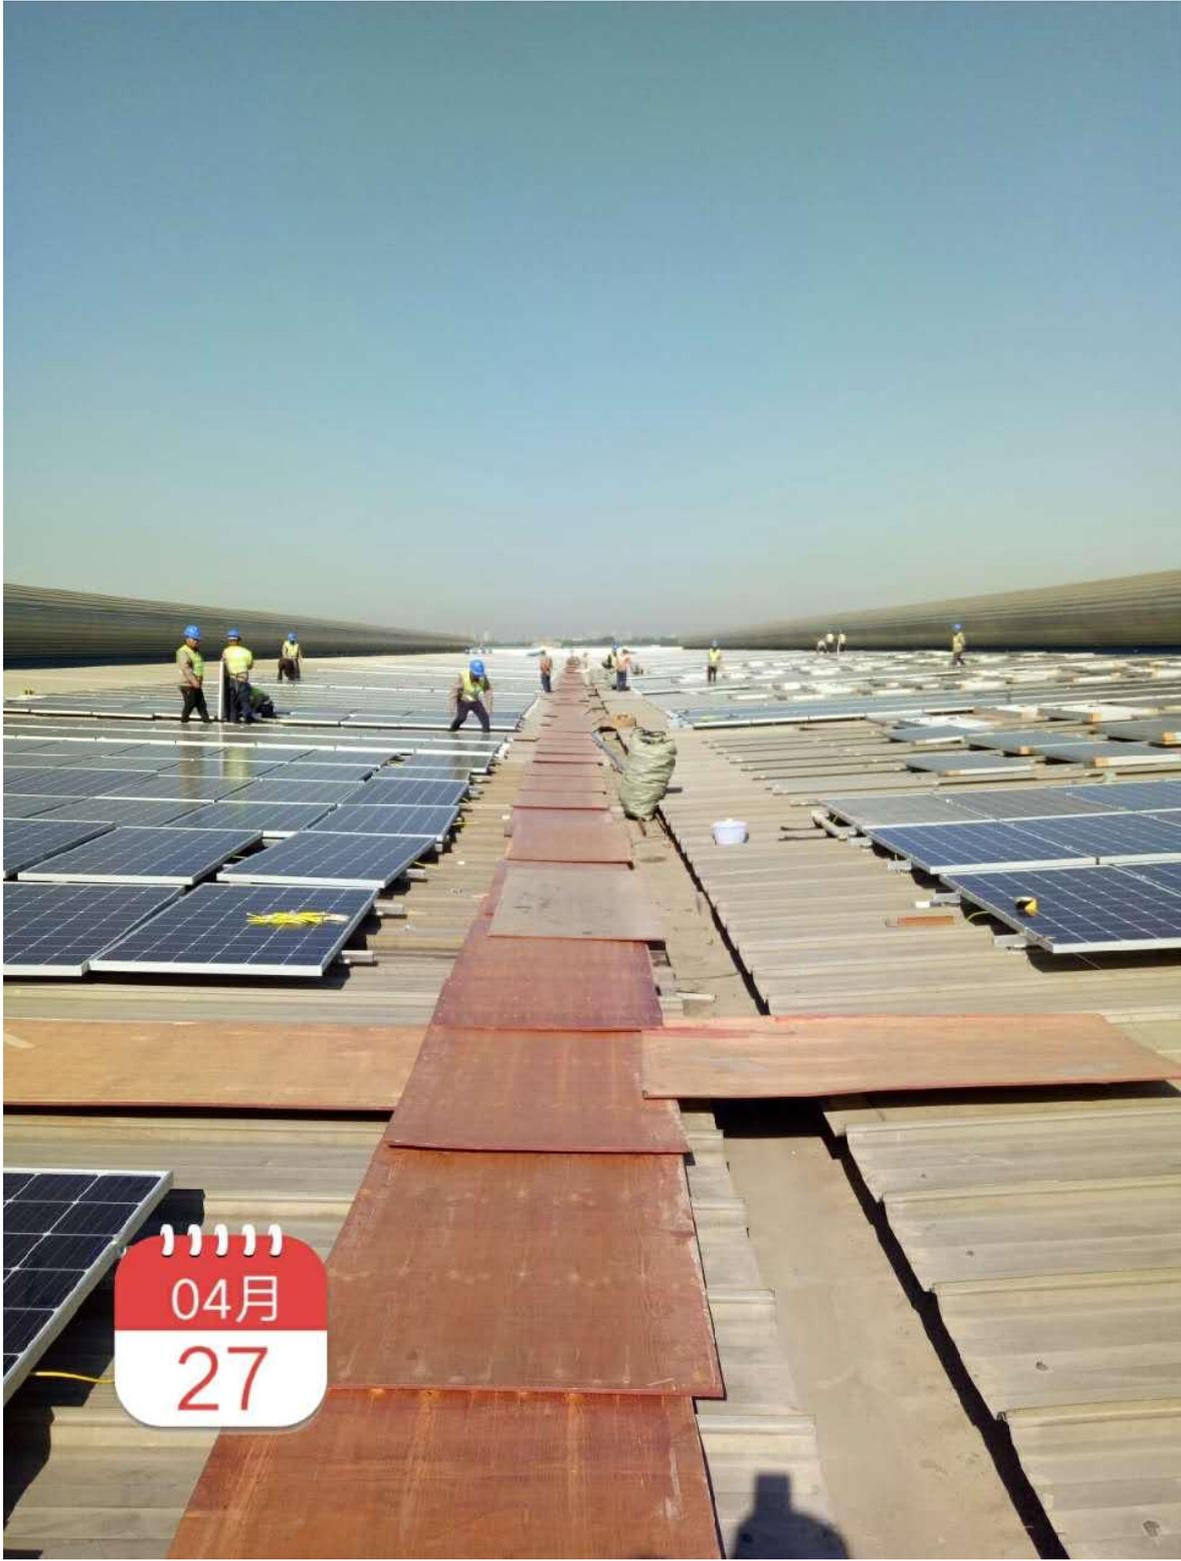



04月  
27



