

监 理 日 志 ()

日期: 2017 年 05 月 01 日

天气: 多云

星期: 星期一

气温: 14~29°


工程名称: 迅力汽车 4.14MWp 分布式光伏电站工程

监 理 工 作 情 况	1、 施工现场巡检, 督促施工单位安全文明施工。 2、 桥架和检修通道安装, 组件接地安装 300 米。。1*4mm ² 光伏电缆敷设, 汇流箱敷设电缆完成 9 个。监理现场巡查, 基本符合图纸设计要求。 3、 钢爬梯转向平台焊接安装。监理巡视, 基本符合图纸设计要求。 4、 整理监理及施工资料。 5、 业主提供的材料未到场, 如(逆变器、直流电缆、高压电缆、开关站设备) 安装施工人员陆续退场。	
施 工 情 况	施 工 单 位	施 工 内 容 及 进 度
	山 东 远 大 新 能 源 科 技 有 限 公 司	1、 桥架及检修通道安装, 组件接地安装 300 米。1*4mm ² 光伏电缆敷设, 汇流箱敷设电缆完成 9 个。 2、 钢爬梯转向平台焊接安装。 一辆三轮车 安装施工人员 4 人, 电气施工人员 14 人。 土建施工人员 4 人。
其 它 事 项		
本日现场监理人员		付铭飞
记录人: 付铭飞		总监理工程师/总监理工程师代表(签字):





05月
01

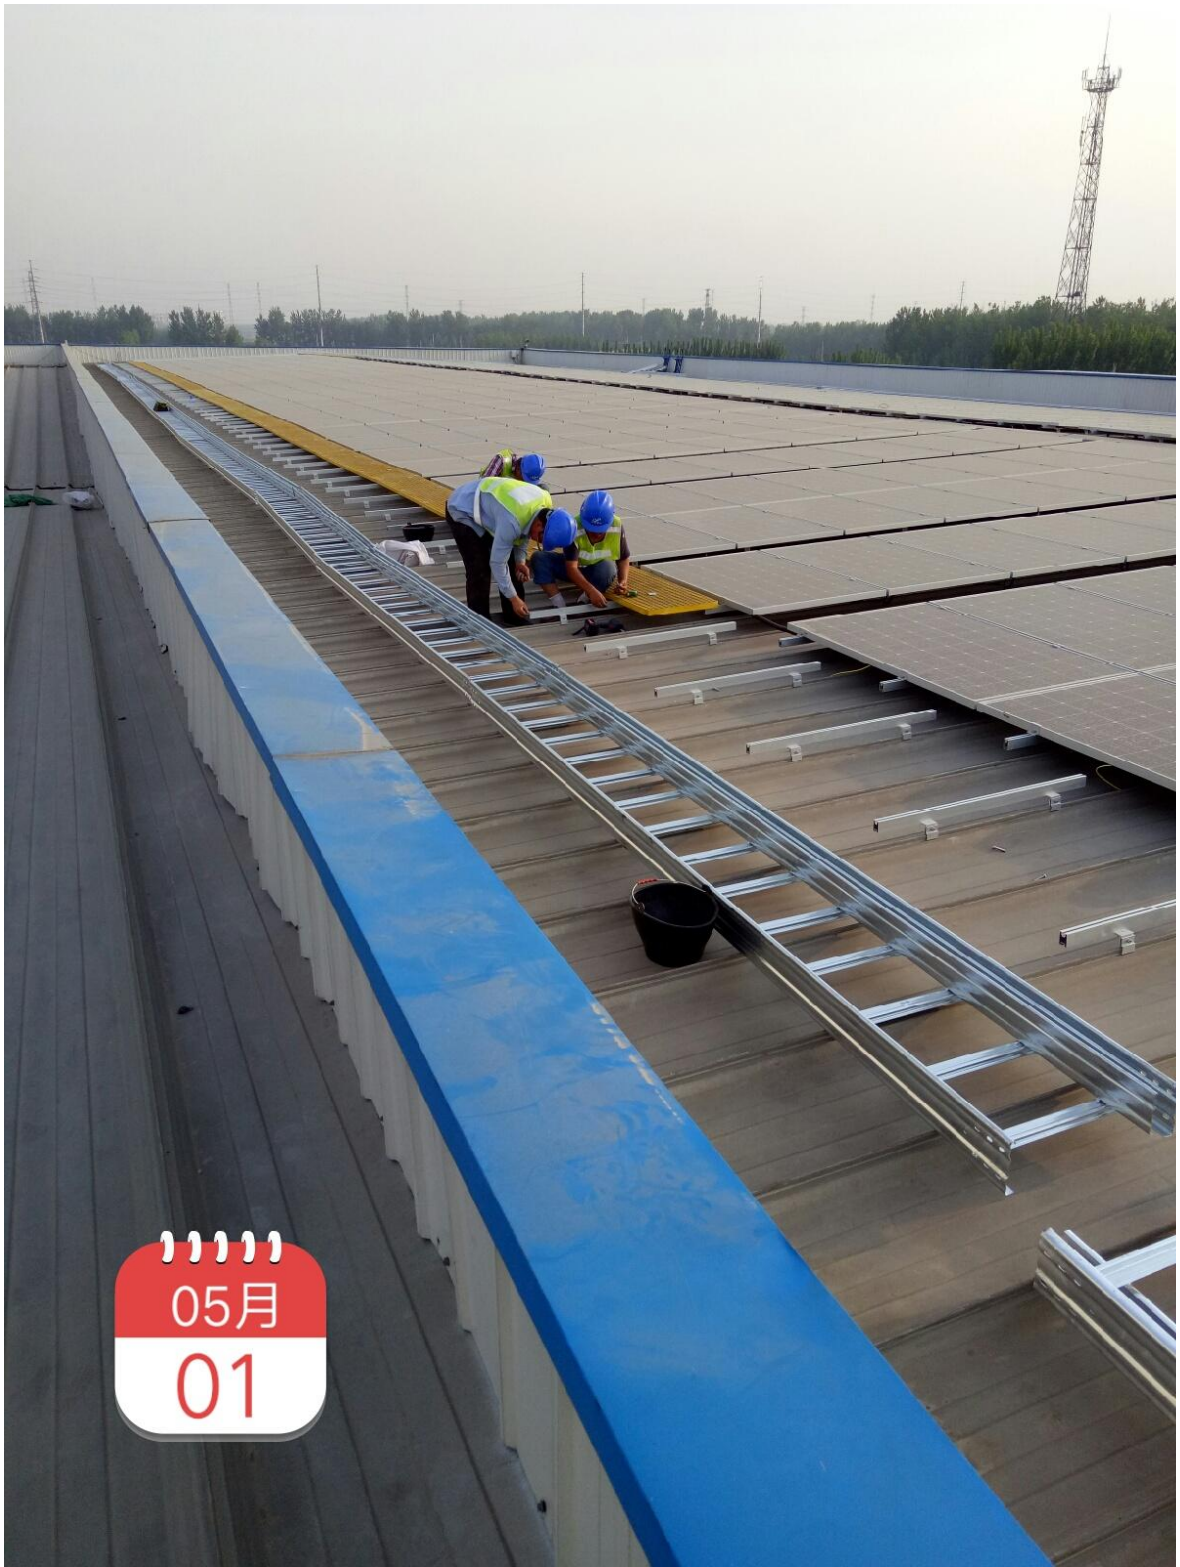

05月
01
