

监 理 日 志

日期：2017 年 06 月 08 日


天气：晴

星期：星期四

气温：21℃~34℃

工程名称：衡水乐阳光伏能源有限公司河北泰纳新材料 4.8MWp 分布式光伏发电项目

监 理 工 作 情 况	光伏组件全部安装完成。 二次预制仓与预制仓基础不匹配，要求施工方已书面的形式提交整改方案，保证设备以后的安全运行。 低压交流电缆接线头制作完成。 箱式变压器高压试验，电压超过 7000V 时，箱式变压器的绝缘子被击穿，要求施工方与箱式变压器厂家沟通，尽快派出现场代表，进行修复。		
施 工 情 况	施 工 单 位	施 工 内 容 及 进 度	
	河北冀电 电力工程 设计咨询 有限公司	加工车间、橡胶原料库、橡胶成品库直流电缆接线 原材料库汇流箱接线 低压交流电缆接线头制作 高压交流电缆接线头制作 原材料仓库光伏直流电缆接线 预制仓二次接线 箱式变压器高压试验	
其 它 事 项			
本日现场监理人员		生金文、袁野、张红军	
记录人：袁野		总监理工程师/总监理工程师代表（签字）：	

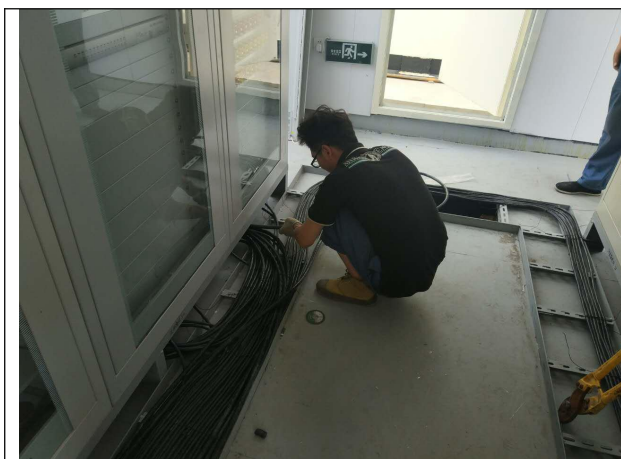

预制仓二次接线



箱逆变接地防腐
