

监 理 日 志 ()

日期: 2017 年 10 月 30 日

星期: 二

工程名称: 徐州建机 4.5MWp 分布式光伏发电项目

天气:晴

气温:10°

监 理 工 作 情 况	1、按业主要求, 整理所需的监理资料。 2、巡视现场的施工情况, 维修马道的安装。按图纸施工。安装过程中发现, 每隔一跨少安装一个螺丝导致马道安装不结实, 要求施工方整改。 3、巡视现场的接地扁铁安装, 与厂房有可靠的连接点。且临时用电操作安全。 4、巡视自发自用部分剩余组件的安装, 组件接地线安装。均符合安装要求。 5、施工过程中, 有部分工人未佩戴安全帽, 提醒并警告。	
施 工 情 况	施工单位	施工内容及进度
	苏 华 工 程 建 设 集 团	1、2 人安装组件及组件的接地。 2、1 人安装维修马道。 3、2 人安装接地扁铁。
其 它 事 项		
本日现场监理人员		马继超
记录人: 马继超		总监理工程师/总监理工程师代表 (签字):

北纬


34°16'

东经

117°20'

2017.10.30

徐州建机4.5MWp分布式光伏发电项目

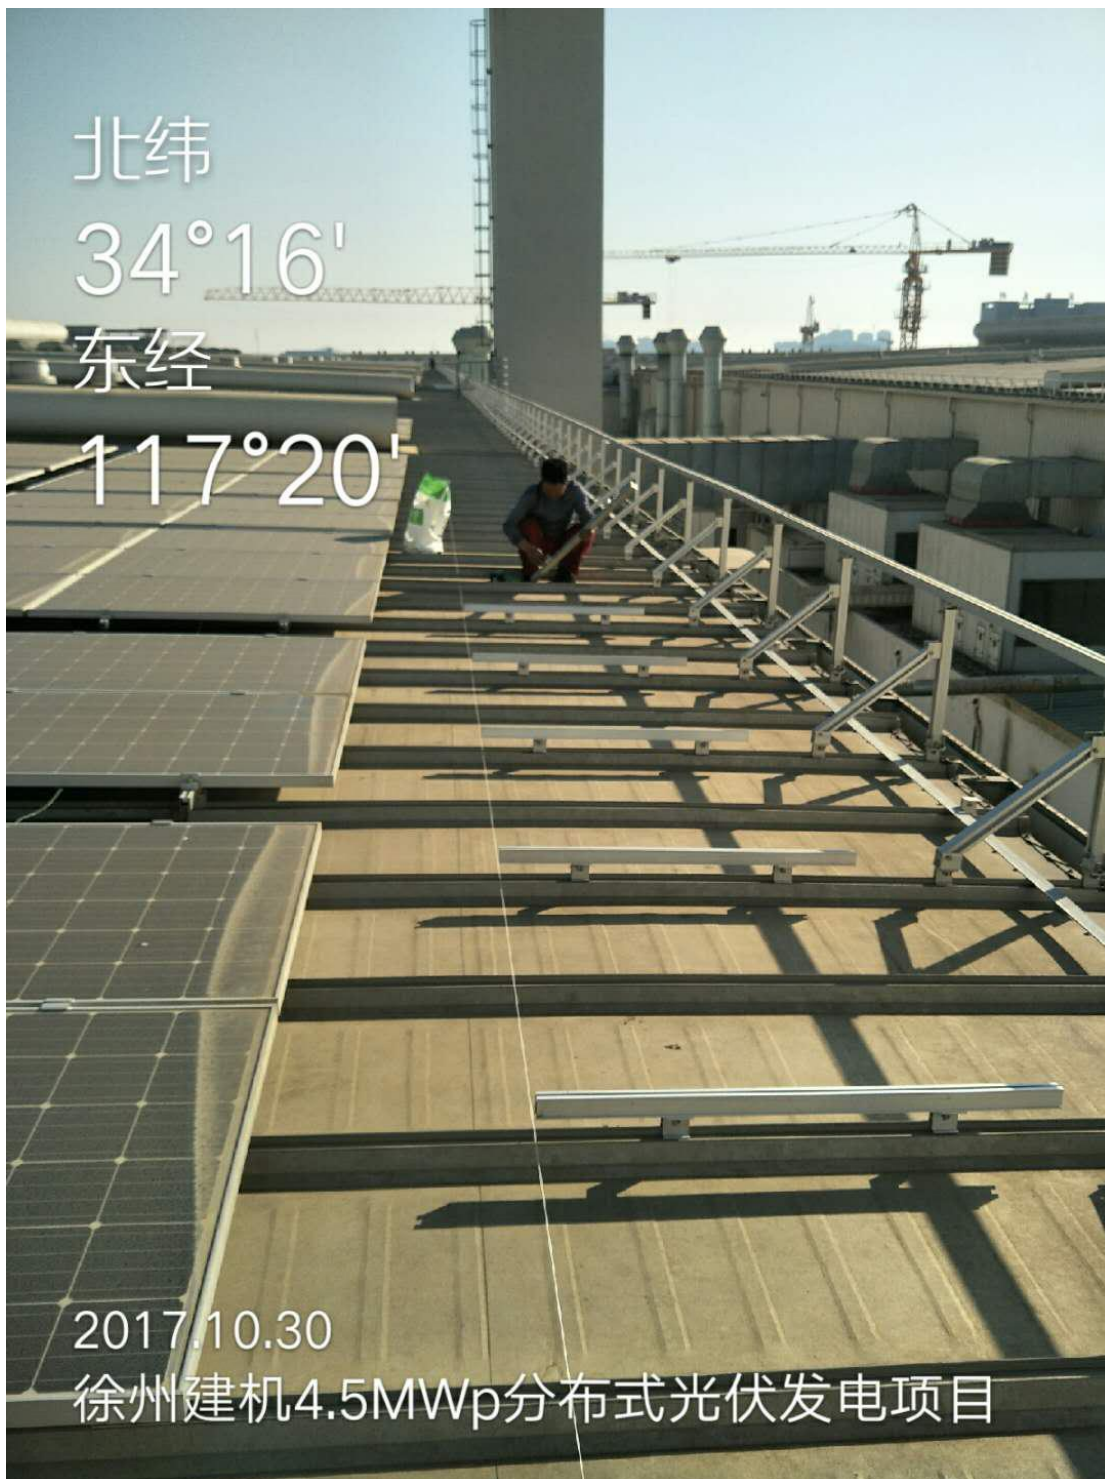





北纬
 $34^{\circ}16'$
东经
 $117^{\circ}20'$

2017.10.30
徐州建机4.5MWp分布式光伏发电项目

