

# 监 理 日 志 ( )

日期: 2017年 4 月 13 日


天气:晴

星期: 四

气温: 23°


工程名称: 徐州建机 4.5MWp 分布式光伏发电项目

监 理 工 作 情 况	1、上屋面检查护栏的安装工作,由于货物没有到全导致只能安装部分夹具。 2、了解现场的到货及设备的个数。 3、向业主提供所用信息。 4、与业主沟通尽快要求材料进场,以免耽误工作进度。	
施 工 情 况	施 工 单 位	施 工 内 容 及 进 度
	江 苏 华 能 建 设 集 团 工 程 有 限 公 司	1、安装围栏夹具。 2、吊运围栏导轨。
其 它 事 项		
本 日 现 场 监 理 人 员	马继超	
记 录 人: 马继超	总监理工程师/总监理工程师代表(签字):	

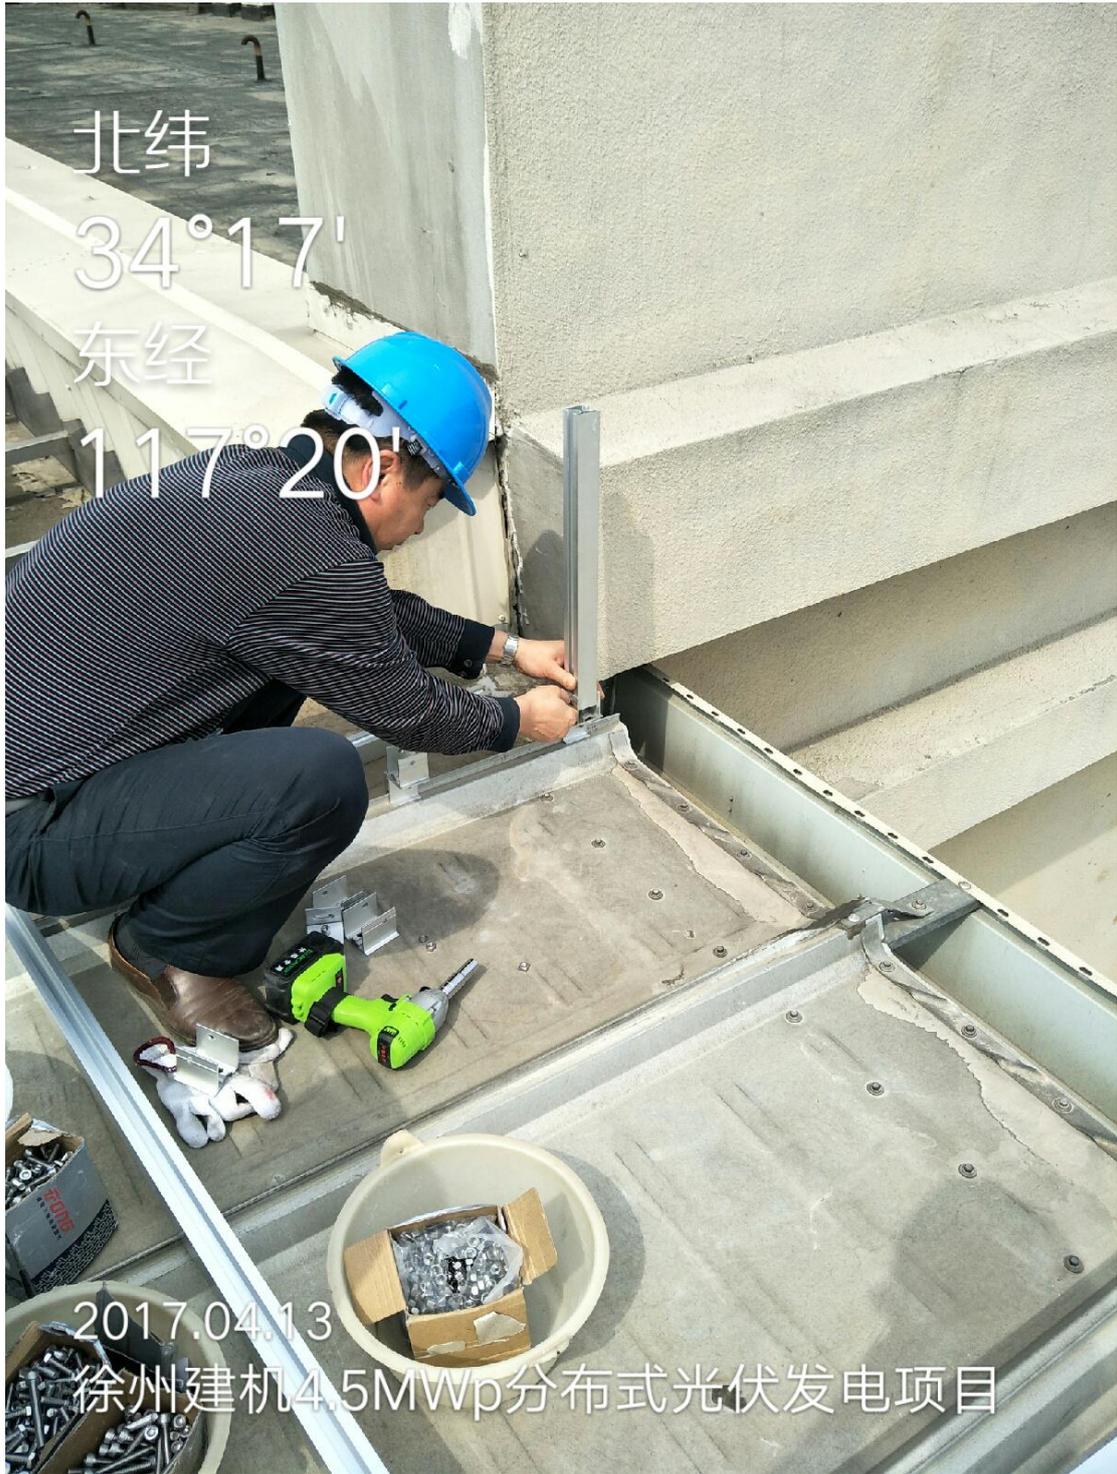

北纬  
34°17'  
东经  
117°20'

2017.04.13  
徐州建机4.5MWp分布式光伏发电项目

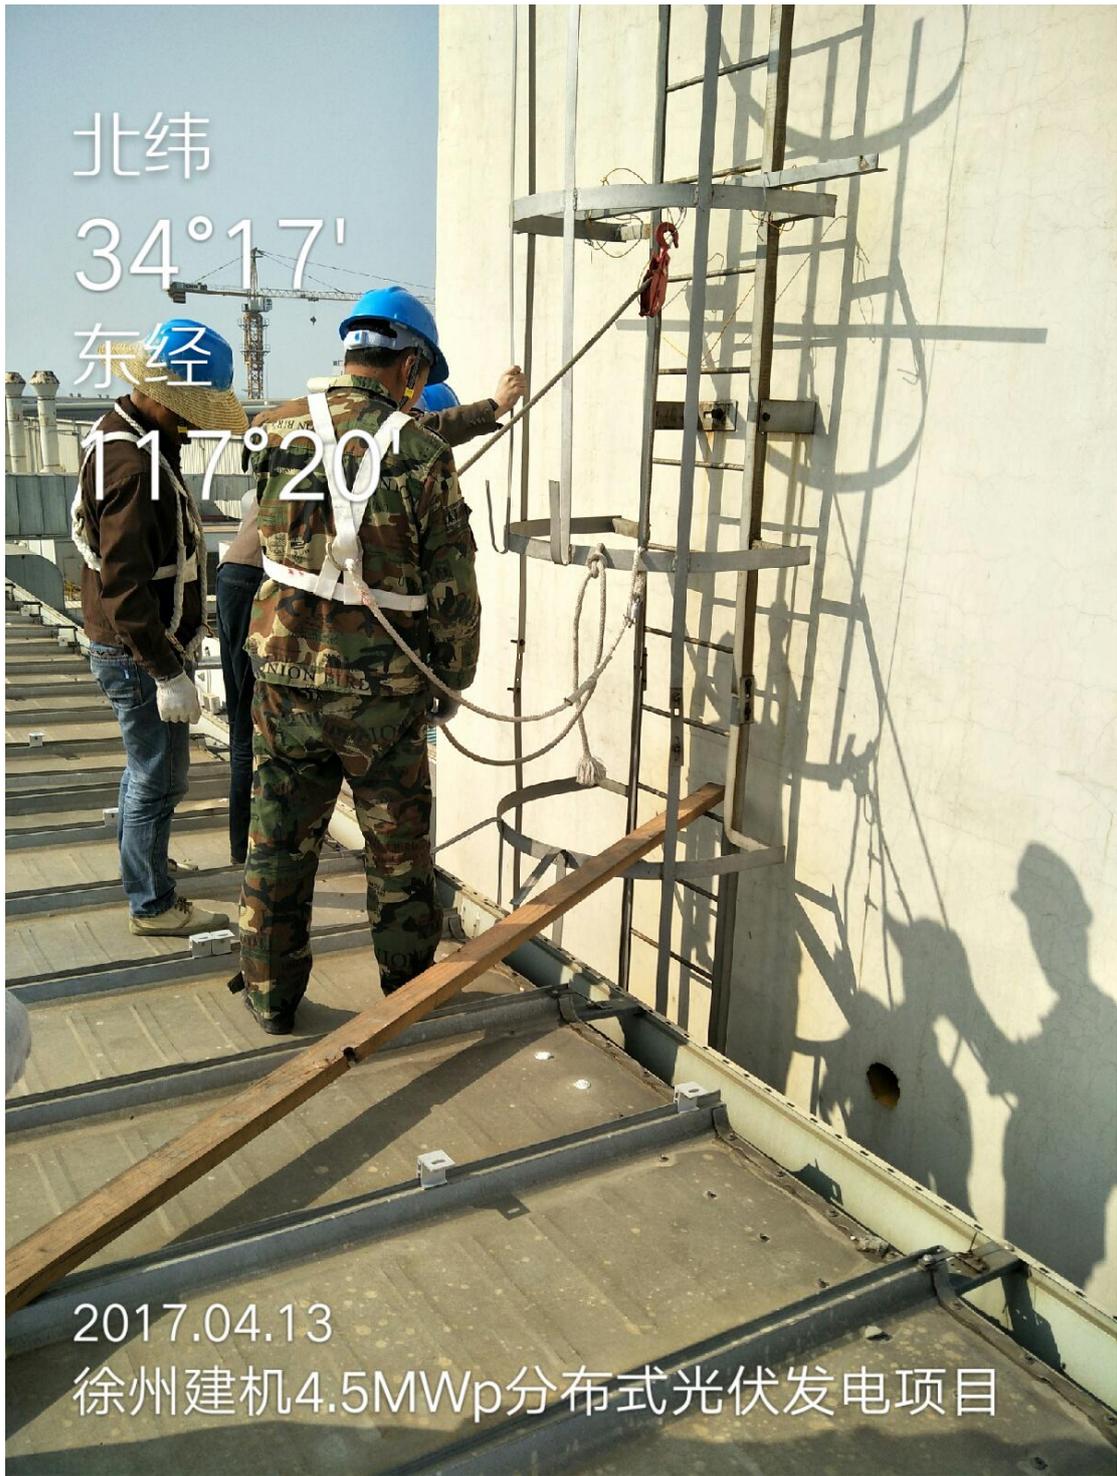

北纬  
34°17'  
东经  
117°20'

2017.04.13  
徐州建机4.5MWp分布式光伏发电项目
