

# 监 理 日 志 ( )

日期: 2017年 4 月 17 日

天气:晴


星期: 二

气温: 21°


工程名称: 徐州建机 4.5MWp 分布式光伏发电项目

|          |   |   |
|----------|---|---|
| 监理工作情况   | 1、施工现场巡检,督促工作人员安全文明施工。<br>2、召开施工安全专题会议,并做好会议纪要发放施工方及业主方。<br>3、检查护栏的安装工作,部分螺丝未上紧向现场负责人提出要求不放过每个细节。<br>4、整理监理资料及施工资料。 |   |
| 施工情况     | 施工单位  | 施工内容及进度   |
|          | 江苏华能建设工程集团有限公司  | 1、屋面放线 (#7#8#9#10)。<br>2、安装四分之一护栏工作。<br>3、施工人数 9 人,关于加施工人数施工方已安排正在到现场的路上。 |
| 其它事项     |   |   |
| 本日现场监理人员 | 马继超   |   |
| 记录人:马继超  | 总监理工程师/总监理工程师代表(签字):  |   |

北纬  
34°17'  
东经  
117°20'

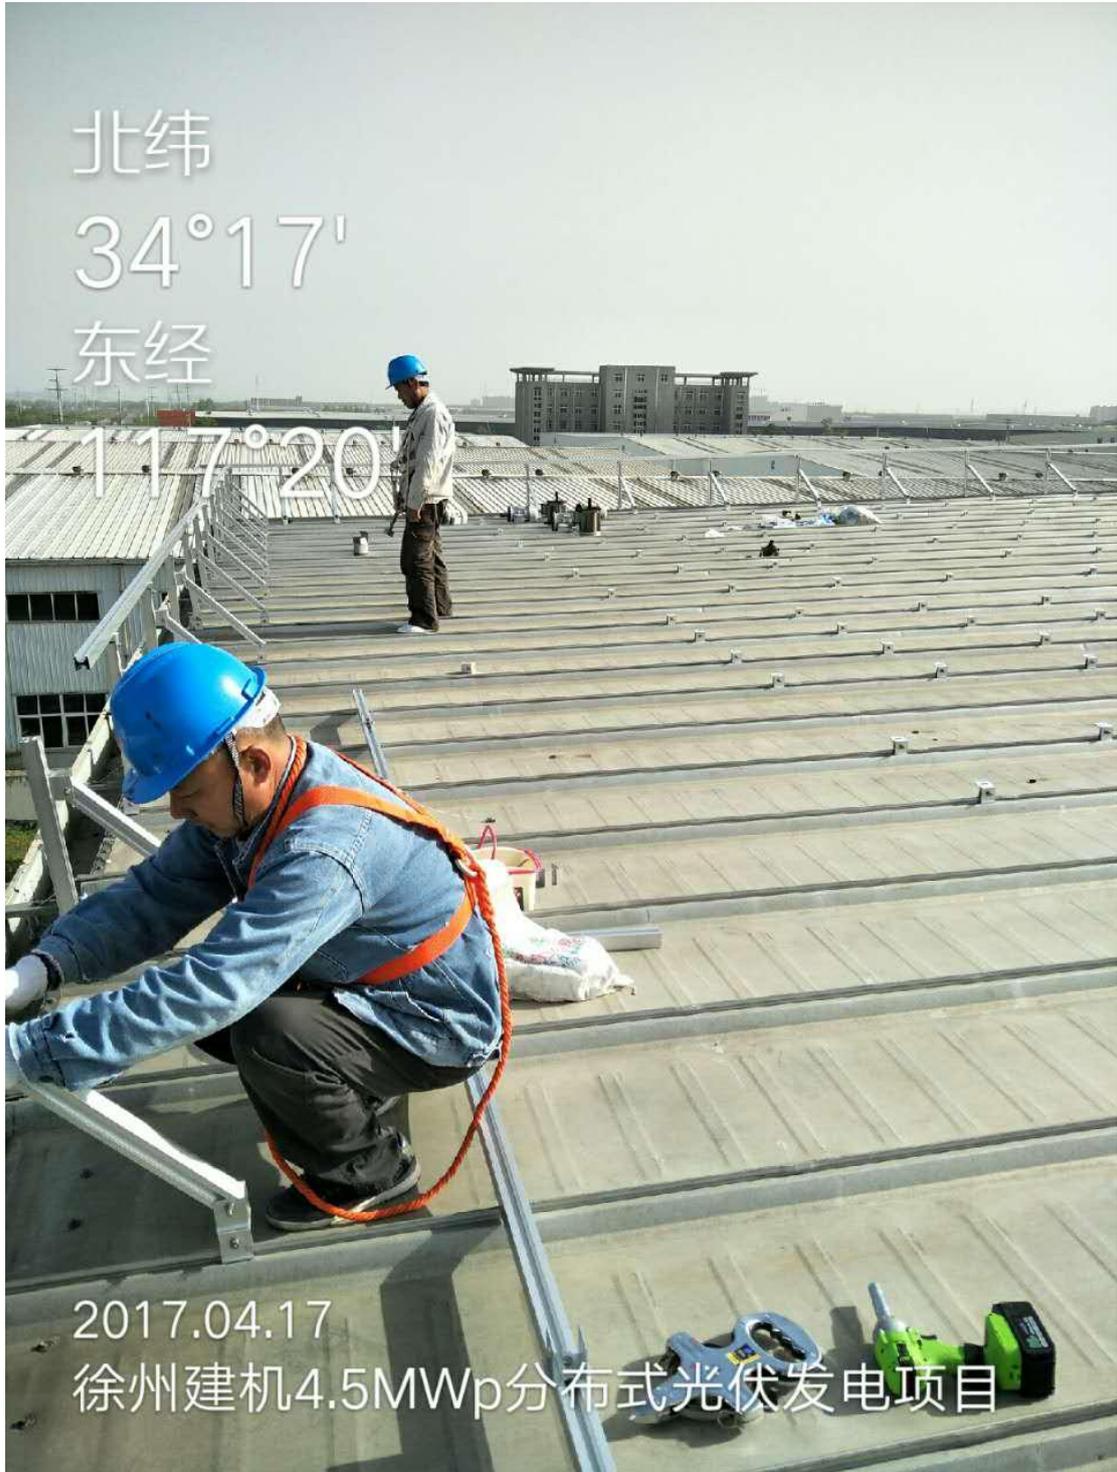

2017.04.17  
徐州建机4.5MWp分布式光伏发电项目

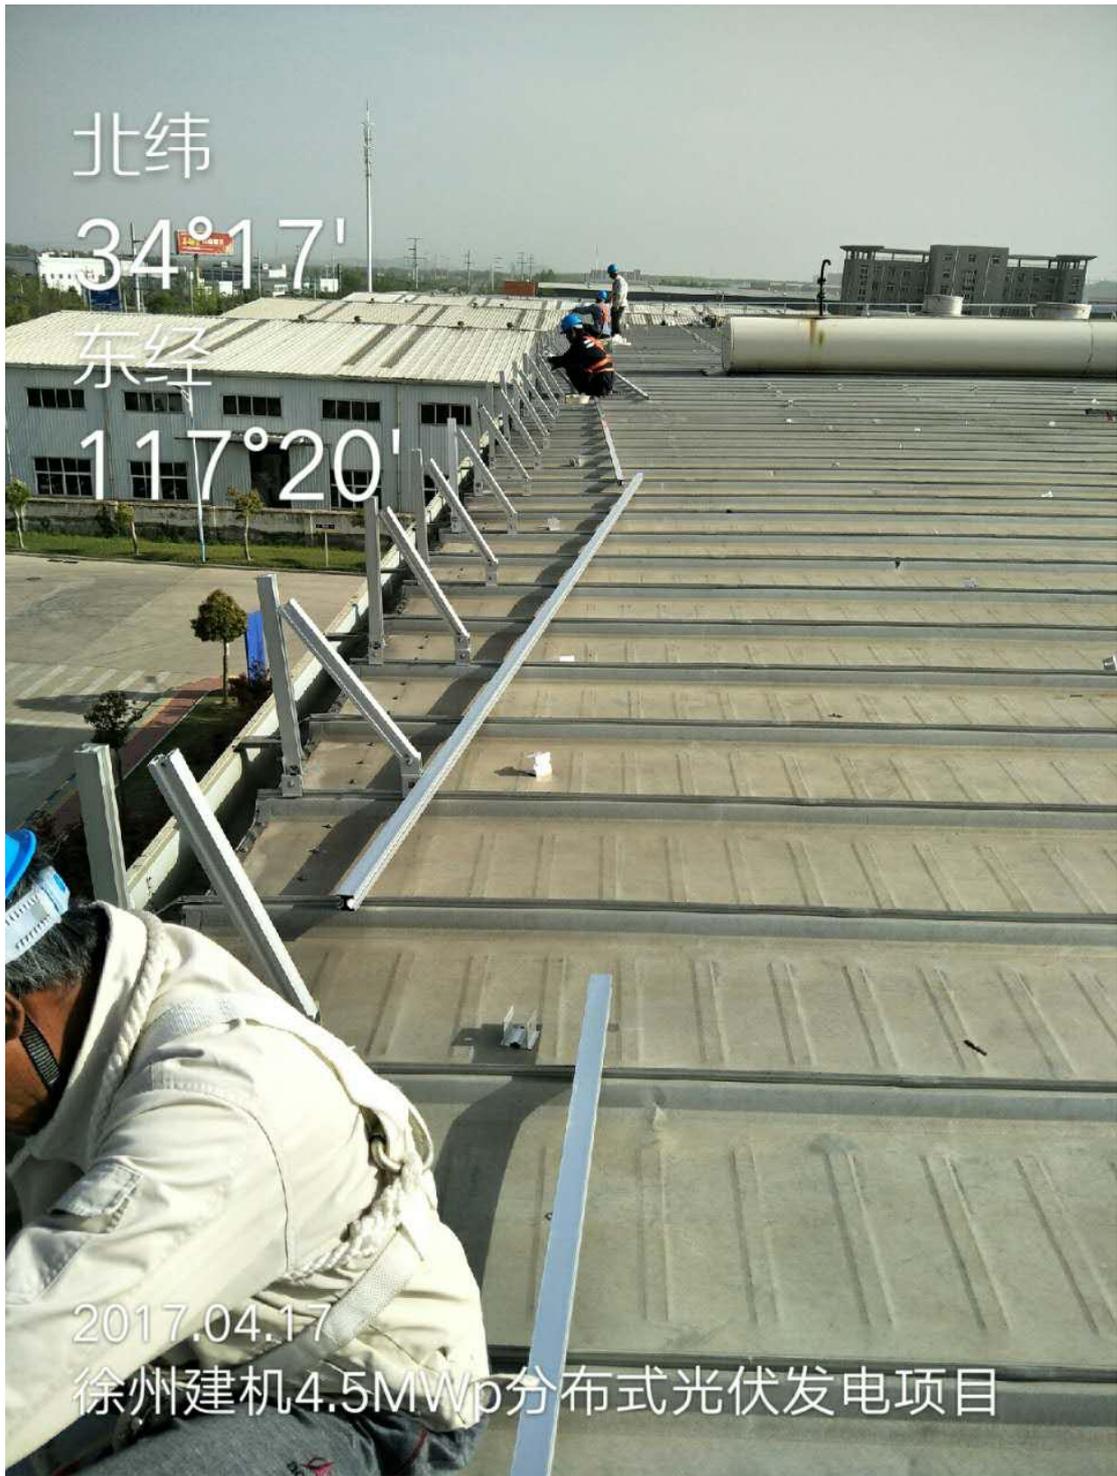

北纬

34°1.7'

东经

117°20'

2017.04.17

徐州建机4.5MWp分布式光伏发电项目



北纬

34°17'

东经

117°20'

2017.04.17

徐州建机4.5MWp分布式光伏发电项目
