

监 理 日 志 ()

日期: 2017 年 4 月 19 日


天气:晴

星期: 三

气温: 25°

工程名称: 徐州建机 4.5MWp 分布式光伏发电项目

监 理 工 作 情 况	1、施工现场巡检,督促工作人员安全文明施工。 2、检查护栏的安装工作,部分螺丝未上紧向现场负责人提出要求不放过每个细节。 3、整理监理资料及施工资料。	
施 工 情 况	施 工 单 位	施 工 内 容 及 进 度
	江 苏 华 能 建 设 集 团 工 程 有 限 公 司	1、屋面放线停止,全部安装护栏以确保组件安装及其他工作进行时的安全。 2、施工人数 11 人,今日已安装护栏 80%。
其 它 事 项		
本日现场监理人员		马继超
记录人:马继超		总监理工程师/总监理工程师代表(签字):

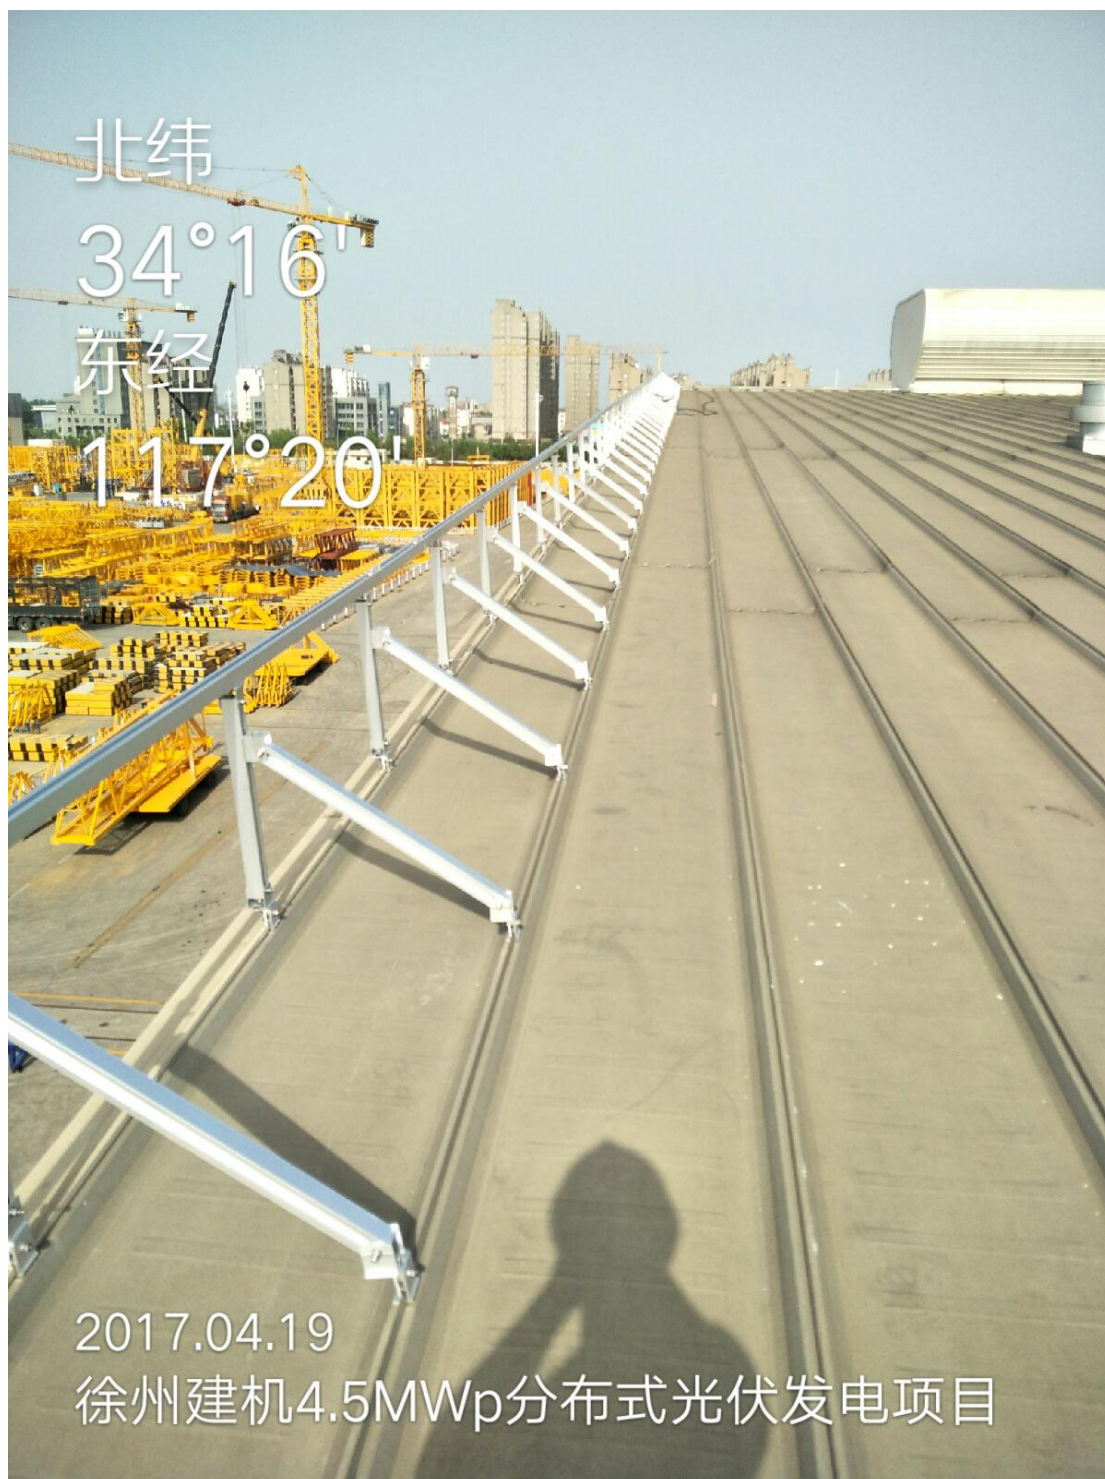

北纬

34°16'

东经

117°20'



2017.04.19

徐州建机4.5MWp分布式光伏发电项目
