

监 理 日 志 ()

日期: 2017 年 4 月 27 日

天气:晴

星期: 四

气温: 28°

工程名称: 徐州建机 4.5MWp 分布式光伏发电项目

监 理 工 作 情 况	1、施工现场巡检,督促工作人员安全文明施工。 2、检查导轨及组件、组件接地的安装;组件安装偏差太大要求改正。 3、组织开每周四的安全例会并做了会议纪要。	
施 工 情 况	施 工 单 位	施 工 内 容 及 进 度
	江 苏 华 能 建 设 集 团 工 程 有 限 公 司	1、导轨及组件、组件接地的安装。安装 5 箱。 2、搭建人工通道。施工人数 14 人,安装组件及导轨。
其 它 事 项		
本日现场监理人员		马继超
记录人:马继超		总监理工程师/总监理工程师代表(签字):

北纬

34°17'

东经


117°20'



2017.04.27

徐州建机4.5MWp分布式光伏发电项目

北纬
0°0'
东经
0°0'

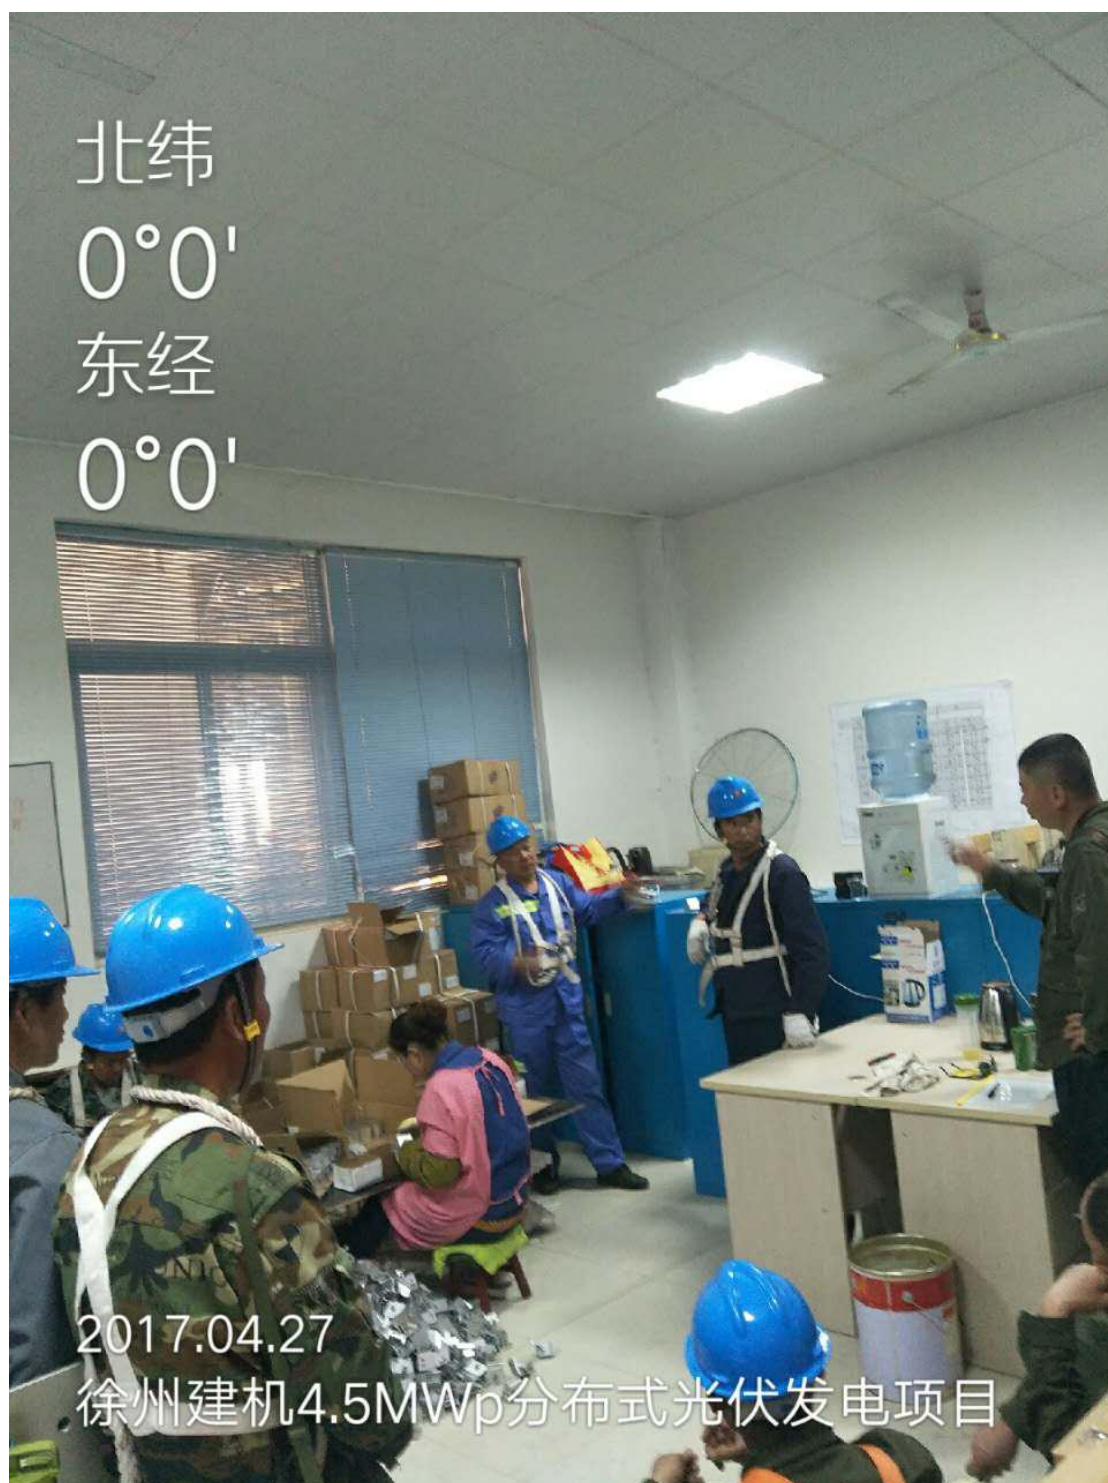

2017.04.27

徐州建机4.5MWp分布式光伏发电项目
