

监 理 日 志 ()

日期: 2017 年 5 月 11 日

天气:晴

星期: 四

气温:29°

工程名称: 徐州建机 4.5MWp 分布式光伏发电项目

监 理 工 作 情 况	1、施工现场巡检,督促工作人员安全文明施工。 2、整理监理文件。 3、陪同总包方了解现场工作进度及组件设计情况,并查看已完成部分护栏安装、组件安装。	
施 工 情 况	施工单位	施工内容及进度
	江 苏 华 能 建 设 集 团 工 程 有 限 公 司	1、登高证到期一部分施工人员未上,办理登高证。 2、安装组件施工人数少,安装工作缓慢。 3、人员问题施工方已联系并已提前做好进厂证的办理。 4、与设计院对接发送厂房图纸核对并作出不合理的修改。
其 它 事 项		
本日现场监理人员		马继超
记录人:马继超		总监理工程师/总监理工程师代表(签字):

北纬


$34^{\circ}17'$

东经

$117^{\circ}20'$

2017-05-11

徐州建机4.5MWp分布式光伏发电项目

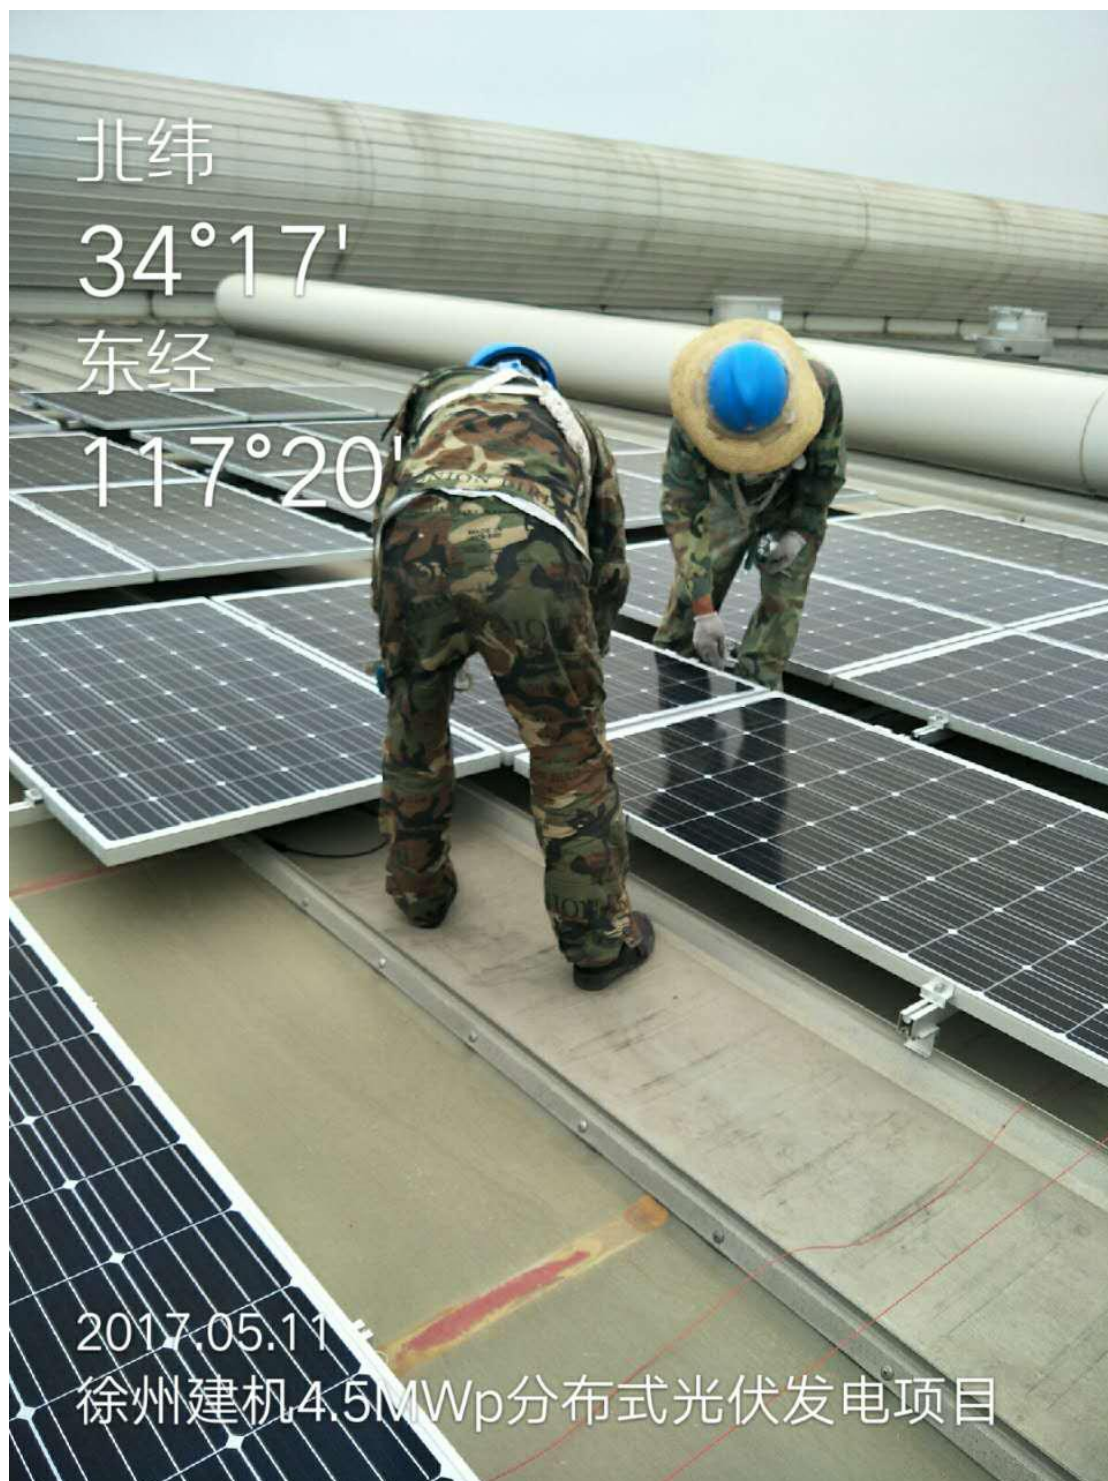



北纬

34°17'

东经

117°20'

2017.05.11

徐州建机4.5MWp分布式光伏发电项目
