

监 理 日 志 ()

日期: 2017年 5 月 18 日

天气:晴

星期: 四

气温:30°

工程名称: 徐州建机 4.5MWp 分布式光伏发电项目


监 理 工 作 情 况	1、施工现场巡检,督促工作人员安全文明施工。 2、整理监理文件。 3、组织召开安全会议,在保证施工安全的前提下提高工作效率。	
施 工 情 况	施 工 单 位	施 工 内 容 及 进 度
	江 苏 华 能 建 设 集 团 工 程 有 限 公 司	1、施工人数共 11 人。 2、安装组件 300 多块,分散安装导轨 31#、32#、33#。 3、开挖箱变基础移植其设备位置上的树木。
其 它 事 项		
本 日 现 场 监 理 人 员	马继超	
记 录 人: 马 继 超	总 监 理 工 程 师 / 总 监 理 工 程 师 代 表 (签 字) :	

北纬

34°17'

东经

117°20'

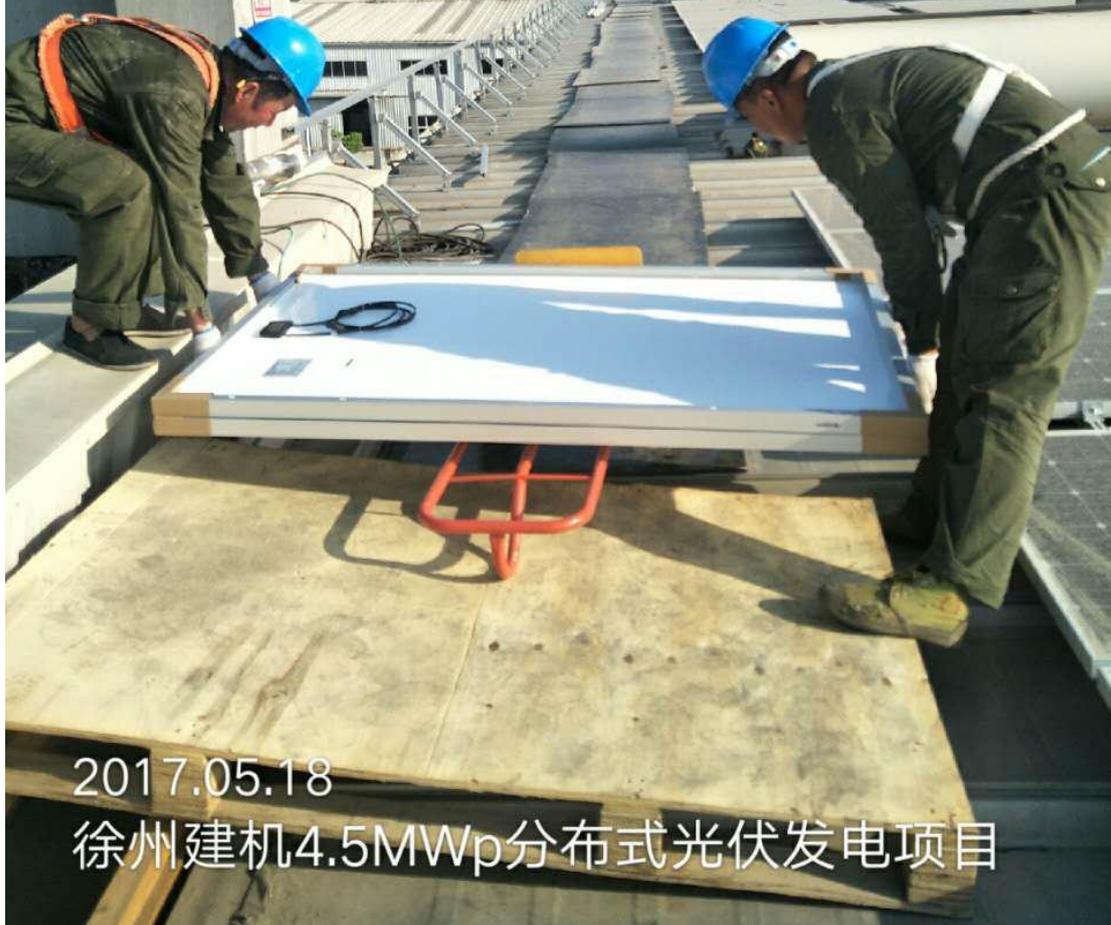

2017.05.18

徐州建机4.5MWp分布式光伏发电项目



北纬
34°17'
东经
117°20'

2017.05.18
徐州建机4.5MWp分布式光伏发电项目



北纬
34°17'
东经
117°20'

2017.05.18
徐州建机4.5MWp分布式光伏发电项目
