

监 理 日 志 ()

日期: 2017 年 5 月 20 日


天气:晴

星期: 六

气温:30°

工程名称: 徐州建机 4.5MWp 分布式光伏发电项目

监 理 工 作 情 况	1、施工现场巡检,督促工作人员安全文明施工。 2、整理监理文件。 3、乐叶总部质量部高总现场检查工作,提出部分小问题要求整改。 4、预制舱垫层旁站、绑钢筋旁站混凝土浇筑。 5、现场施工人员不知原因罢工,出监理联系单要求施工方尽快解决这个问题。	
施 工 情 况	施工单位	施工内容及进度
	江 苏 华 能 建 设 集 团 工 程 有 限 公 司	1、施工人数共 11 人。 2、安装组件 100 多块,组件接地安装 1#、19#、。 3、组件搬运。 4、预制舱垫层绑筋工作进行顺利,浇筑完成。
其 它 事 项		
本日现场监理人员		马继超
记录人:马继超		总监理工程师/总监理工程师代表(签字):

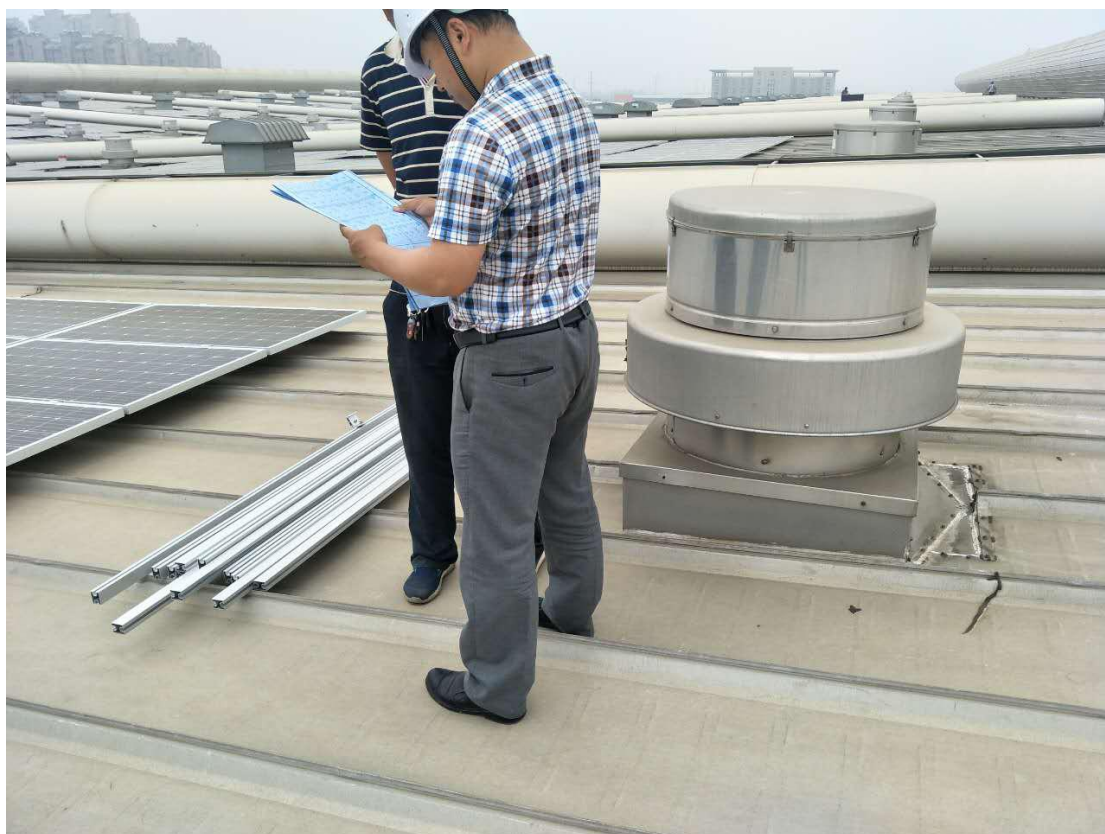



北纬
 $34^{\circ}17'$
东经

$117^{\circ}20'$

2017.05.21

徐州建机4.5MWp分布式光伏发电项目



北纬

34°17'

东经

117°20'

2017.05.21

徐州建机4.5MWp分布式光伏发电项目
