

监 理 日 志 ()

日期: 2017年 5 月 3 日

天气:晴

星期: 二

气温:26°

工程名称: 徐州建机 4.5MWp 分布式光伏发电项目

监 理 工 作 情 况	1、施工现场巡检,督促工作人员安全文明施工。 2、整理监理文件。 3、现场与施工方确定箱逆变基础位置。 4、查看导轨安装及组件安装是否按图施工。 5、巡视预制舱砌砖工作。	
施 工 情 况	施工单位	施工内容及进度
	江苏华能建设工程集团有限公司	1、施工人数共 11 人。 2、安装组件 600 多块,组件接地安装 1#、19#及 47#导轨安装。 3、组件\导轨搬运搬运。 4、箱逆变基础放线及预制舱基础砌砖工作。
其 它 事 项		
本日现场监理人员	马继超	
记录人:马继超	总监理工程师/总监理工程师代表(签字):	

北纬

34°17'

东经

117°20'



2017.05.23

徐州建机4.5MWp分布式光伏发电项目



北纬


34°17'

东经

117°20'

2017.05.23

徐州建机4.5MWp分布式光伏发电项目

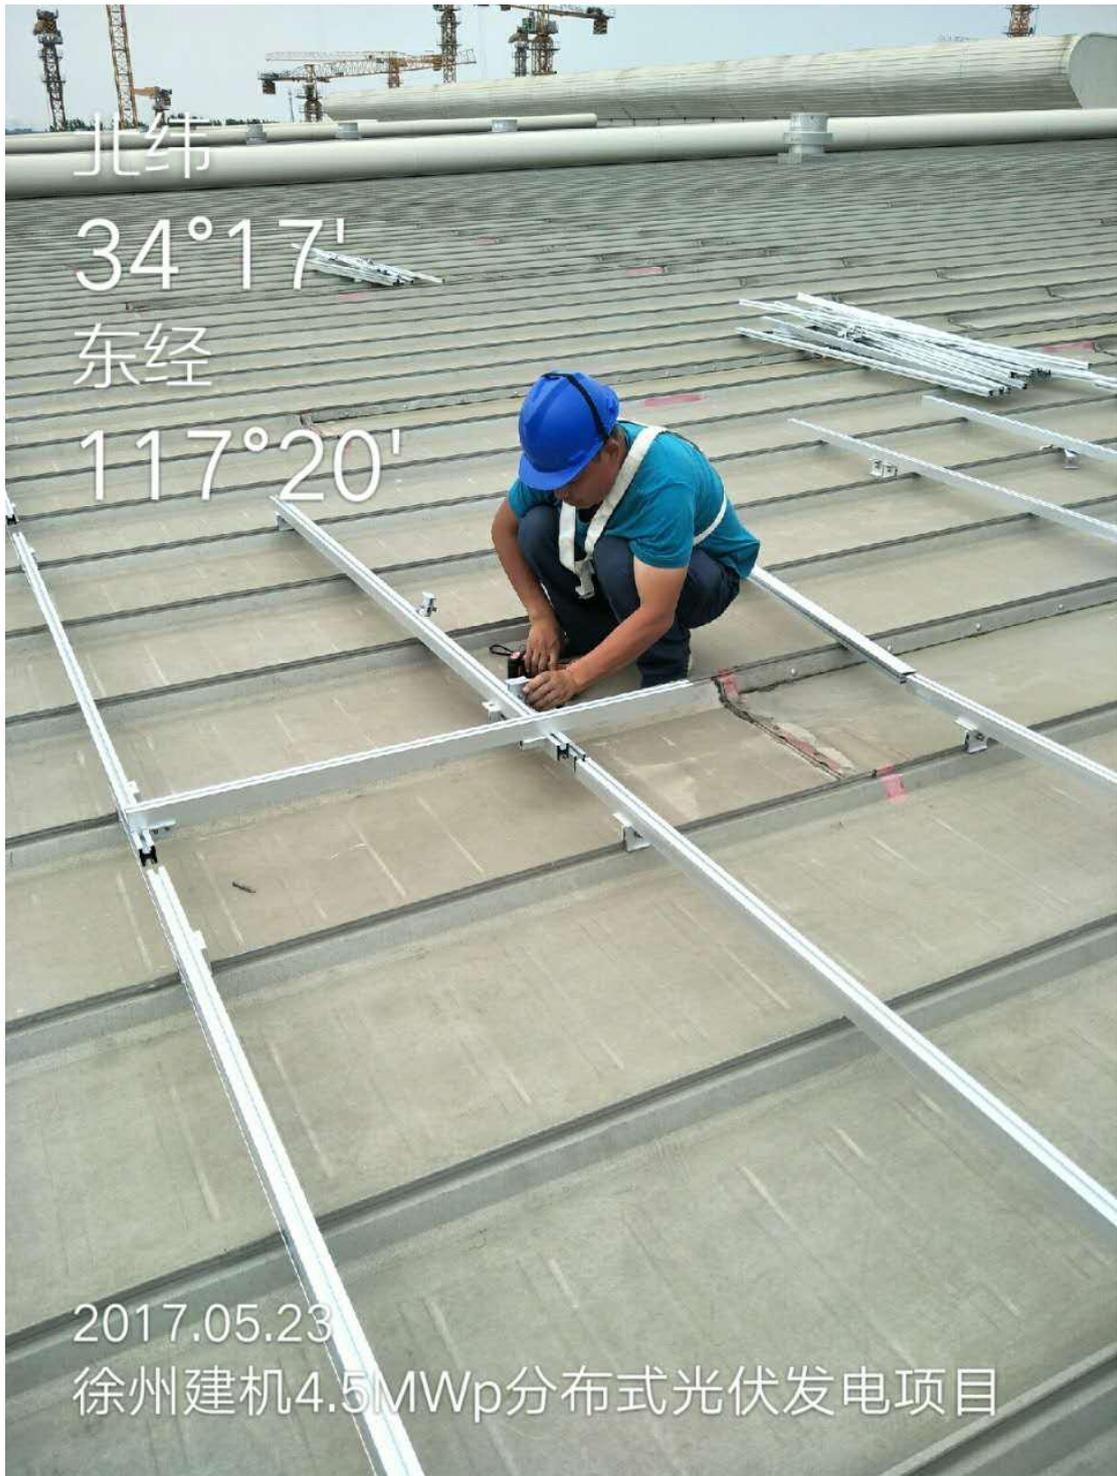

北纬

34°17'

东经

117°20'

2017.05.23

徐州建机4.5MWp分布式光伏发电项目



北纬
34°17'
东经
117°20'

2017.05.23
徐州建机4.5MWp分布式光伏发电项目



北纬
34°17'
东经
117°20'

2017.05.23
徐州建机4.5MWp分布式光伏发电项目
