

监 理 日 志 ()

日期: 2017年 5 月 26日

天气:晴

星期: 五

气温:32°

工程名称: 徐州建机 4.5MWp 分布式光伏发电项目

监 理 工 作 情 况	1、施工现场巡检,督促工作人员安全文明施工。 2、施工现场巡视导轨安装,导轨安装歪斜要求整改。 3、预制舱圈梁浇筑,震动棒振动达到混凝土密实的效果。 4、接入设计评审上会通过,。	
施 工 情 况	施 工 单 位	施 工 内 容 及 进 度
	江 苏 华 能 建 设 集 团 工 程 有 限 公 司	1、施工人数共 23 人。 2、安装组件 300 多块,导轨西面 5 个阵列安装完成。 3、预制舱基础绑筋及模板安装及圈梁浇筑。
其 它 事 项		
本 日 现 场 监 理 人 员	马 继 超	
记 录 人: 马 继 超	总 监 理 工 程 师 / 总 监 理 工 程 师 代 表 (签 字) :	

北纬
34°17'
东经
117°20'



2017.05.26


徐州建机4.5MWp分布式光伏发电项目

北纬

34°16'

东经

117°20'

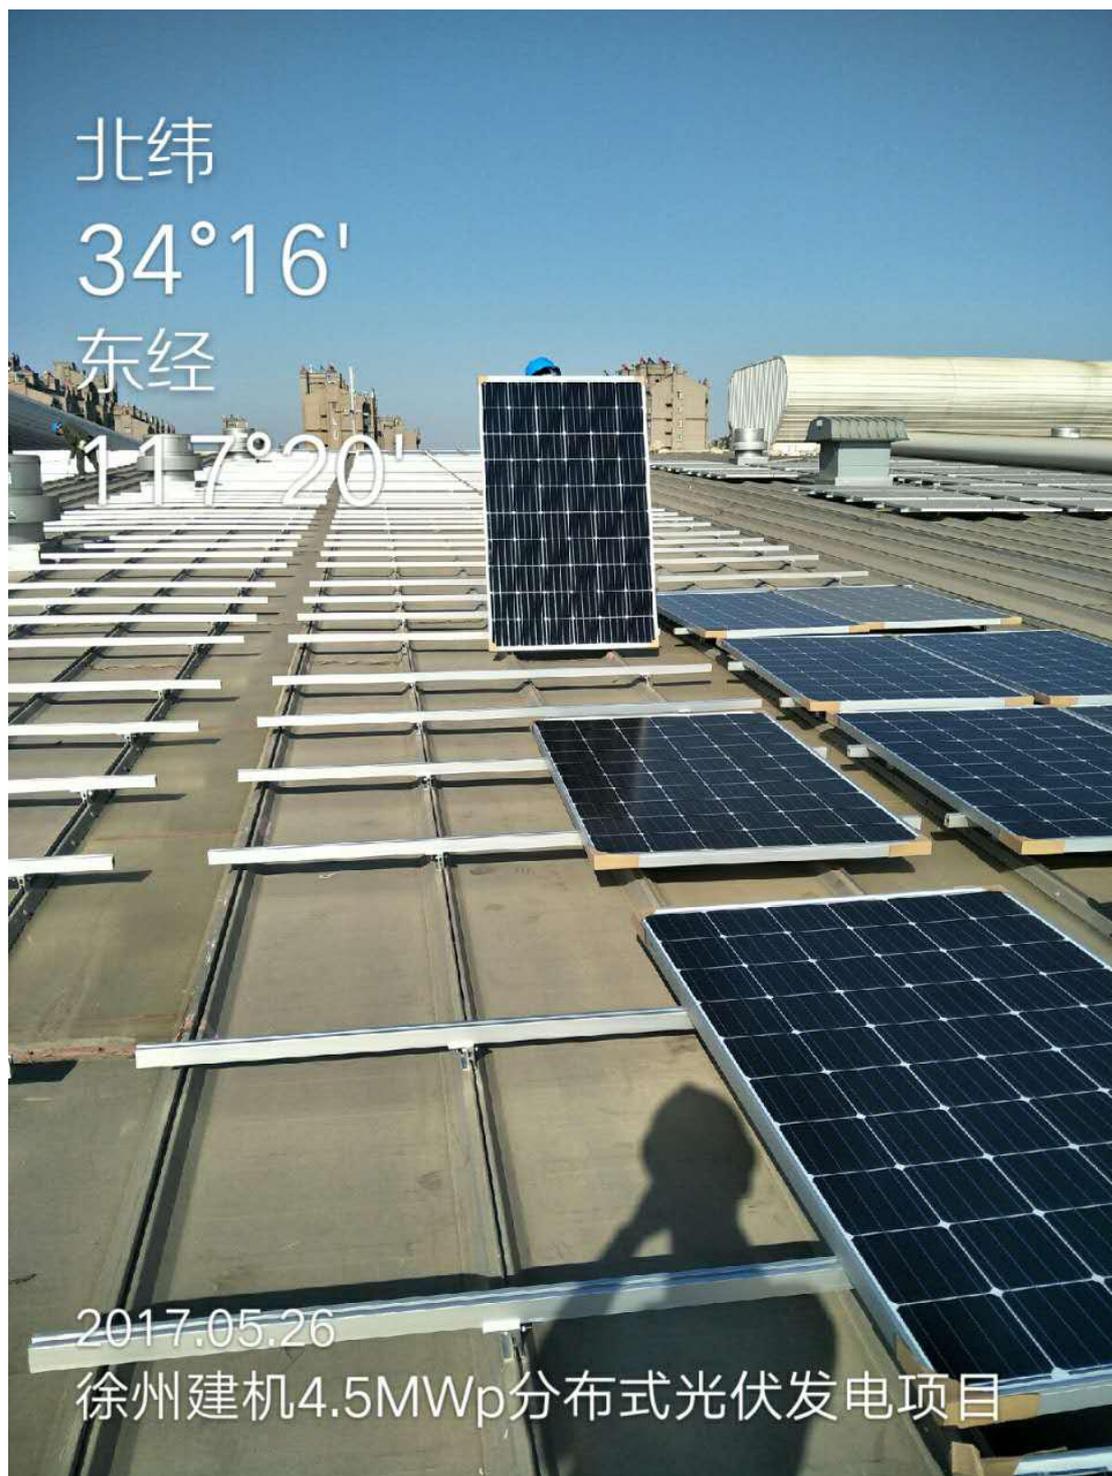

2017.05.26

徐州建机4.5MWp分布式光伏发电项目

北纬

34°16'

东经

117°20'



2017.05.26

徐州建机4.5MWp分布式光伏发电项目
