

监 理 日 志 ()

日期: 2017 年 5 月 26 日

天气:晴

星期: 六

气温:35°

工程名称: 徐州建机 4.5MWp 分布式光伏发电项目

监 理 工 作 情 况	1、施工现场巡检,督促工作人员安全文明施工。 2、施工现场巡视组件安装,安装速度较慢。 3、巡视预制舱基础外部抹灰。 4、查看箱变基础探沟开挖。	
施 工 情 况	施 工 单 位	施 工 内 容 及 进 度
	江 苏 华 能 建 设 集 团 工 程 有 限 公 司	1、施工人数共 23 人。 2、安装组件 200 多块,规整屋面施工材料。 3、预制舱基础抹灰及箱变基础。
其 它 事 项		
本日现场监理人员		马继超
记录人:马继超		总监理工程师/总监理工程师代表(签字):



北纬
 $34^{\circ}16'$
东经
 $117^{\circ}20'$

2017.05.27
徐州建机4.5MWp分布式光伏发电项目



北纬


34°16'

东经

117°20'

2017.05.27

徐州建机4.5MWp分布式光伏发电项目

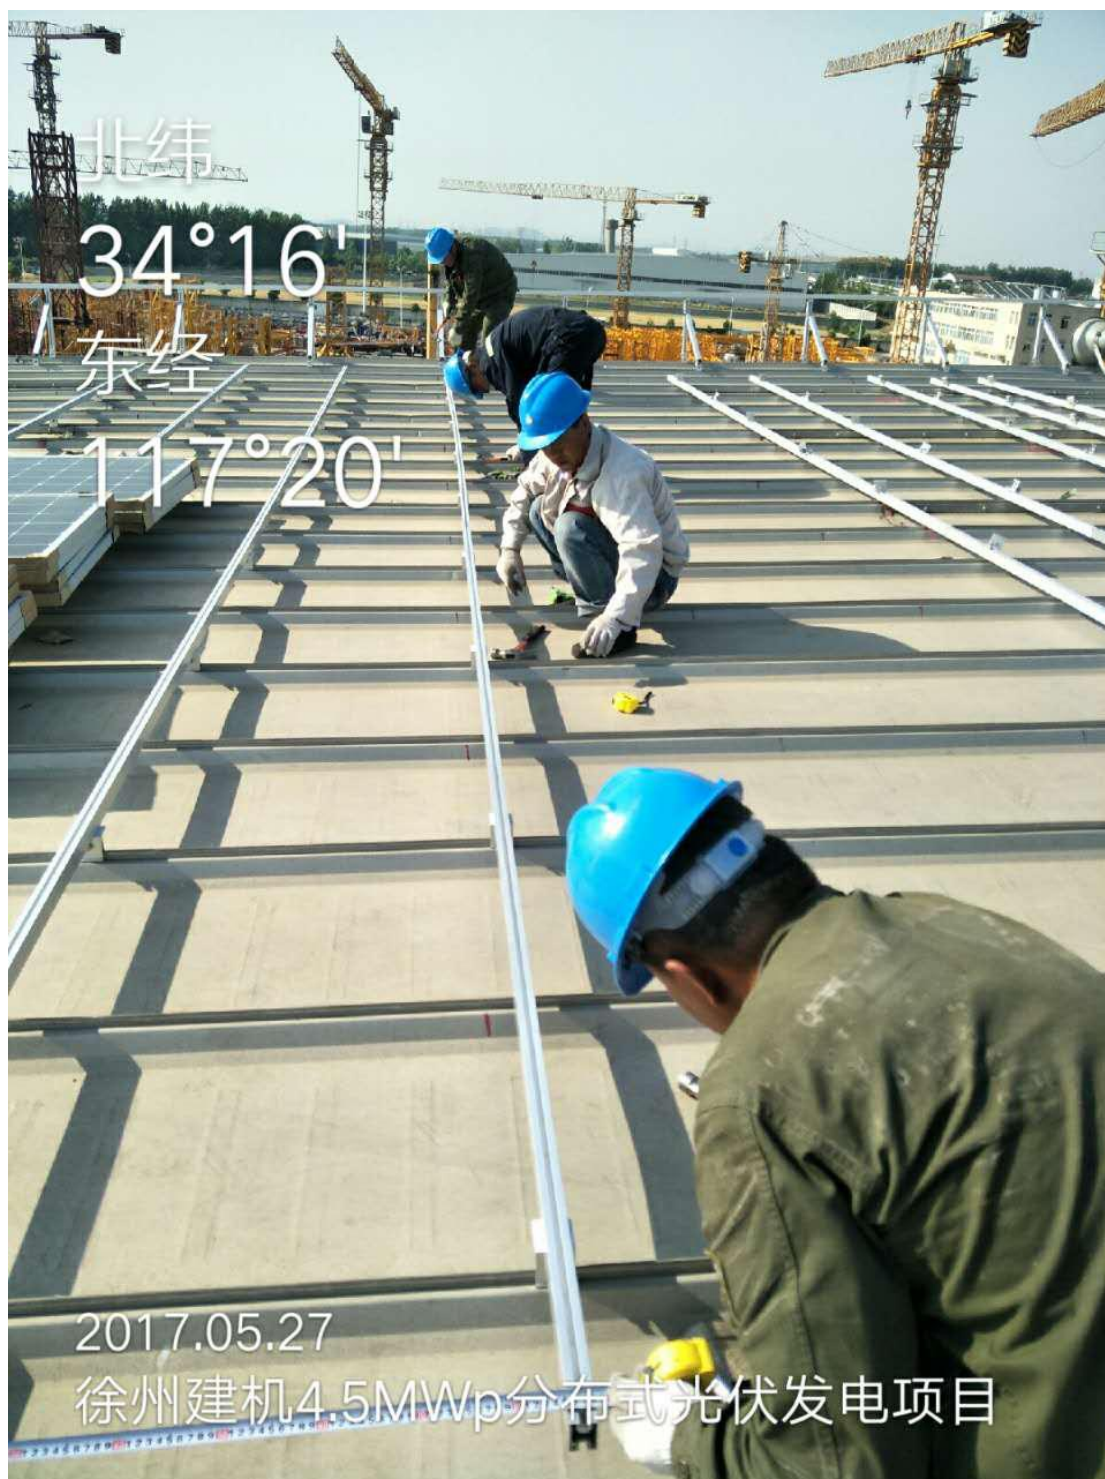

北纬

$34^{\circ}16'$

东经

$117^{\circ}20'$

2017.05.27

徐州建机4.5MWp分布式光伏发电项目

