

监 理 日 志 ()

日期: 2017 年 6 月 12 日

星期: 二

工程名称: 徐州建机 4.5MWp 分布式光伏发电项目


天气: 晴

气温: 25°

监 理 工 作 情 况	1、施工现场巡检,督促工作人员安全文明施工。 2、箱变基础浇筑旁站,并作记录。旁站过程中发现临时用电存在不规范操作,要求改正。 3、检查汇流箱接线及组件接线,发现光伏电缆线未压线鼻子及穿所对应的数码管。要求立即做出整改。 4、巡视吊装工作,安全线以拉并有专人指挥。安全可控。 5、巡查箱变基础模板的安装及电缆沟的开挖(电缆沟开挖符合要求≥ 70)。 6、陪同业主齐总、王总、敖总及项目经理马总现场施工负责人了解检查现场的施工进度情况,要求做出详细的倒排计划。	
施 工 情 况	施 工 单 位	施 工 内 容 及 进 度
	江 苏 华 能 建 设 集 团 工 程 有 限 公 司	1、#1-#15 屋面的组串连接及电缆桥架的安装工作。 2、#19-#32 屋面汇流箱的安装及光伏电缆线的安装。 3、组件安装 310 块。
其 它 事 项		
本日现场监理人员	马继超	

记录人:马继超

总监理工程师/总监理工程师代表(签字):

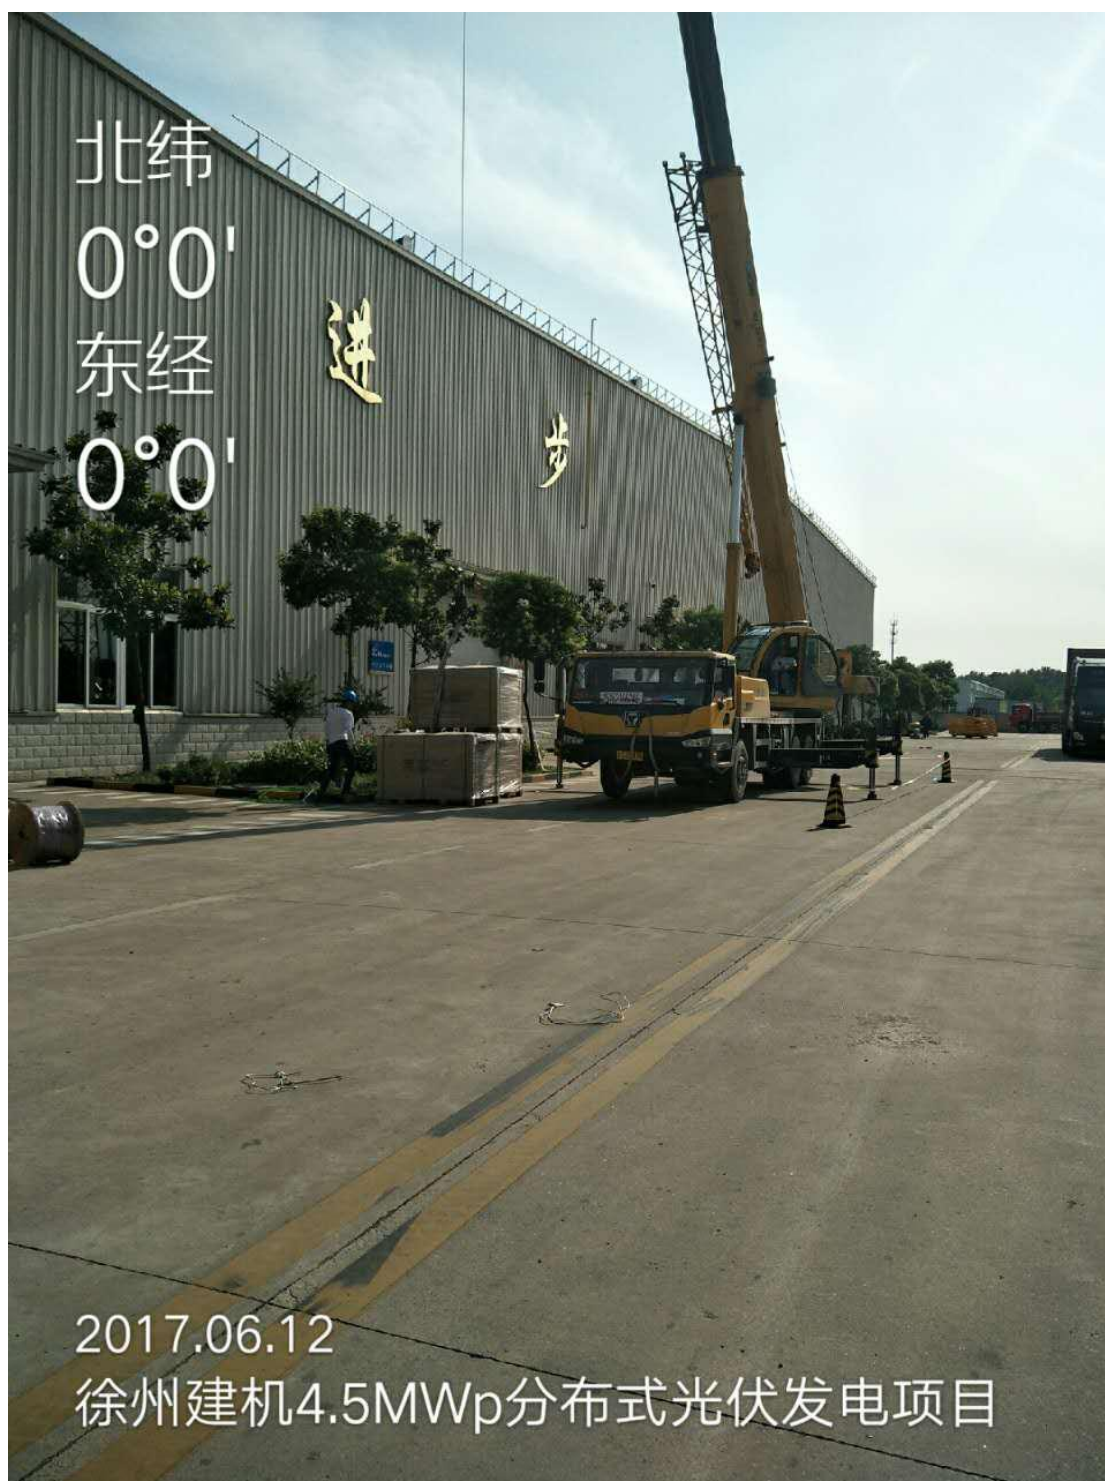



北纬
0°0'
东经
0°0'

2017.06.12
徐州建机4.5MWp分布式光伏发电项目

