

监 理 日 志 ()

日期: 2017年6月29日

天气:晴

星期: 四

气温:30°

工程名称: 徐州建机 4.5MWp 分布式光伏发电项目

监 理 工 作 情 况	1、施工现场巡检,督促施工人员安全文明施工。 2、巡视外线架线工作,督促施工人员必须佩戴绝缘衣服鞋子手套防止高压触电。 3、测试所有的送电、供电设备是否正常工作,数据是否有问题。 4、调试完成,熟悉所有的后台操作。于下午 5:40 顺利并网。	
施 工 情 况	施 工 单 位	施 工 内 容 及 进 度
	江 苏 华 能 建 设 集 团 工 程 有 限 公 司	1、汇流箱、变压器、二次调试、设计院有关人员到场(逆变器产家未到场,经过多次协调产家无法到现场参加设备检查及并网工作).各负其责检查以为顺利并网做准备工作. 2、顺利并网.
其 它 事 项		
本 日 现 场 监 理 人 员		马 继 超
记 录 人: 马 继 超		总 监 理 工 程 师 / 总 监 理 工 程 师 代 表 (签 字) :



北纬
0°0'
东经
0°0'

2017.06.29

徐州建机4.5MWp分布式光伏发电项目

北纬

0°0'

东经


0°0'

2017.06.29

徐州建机4.5MWp分布式光伏发电项目



北纬
0°0'
东经
0°0'

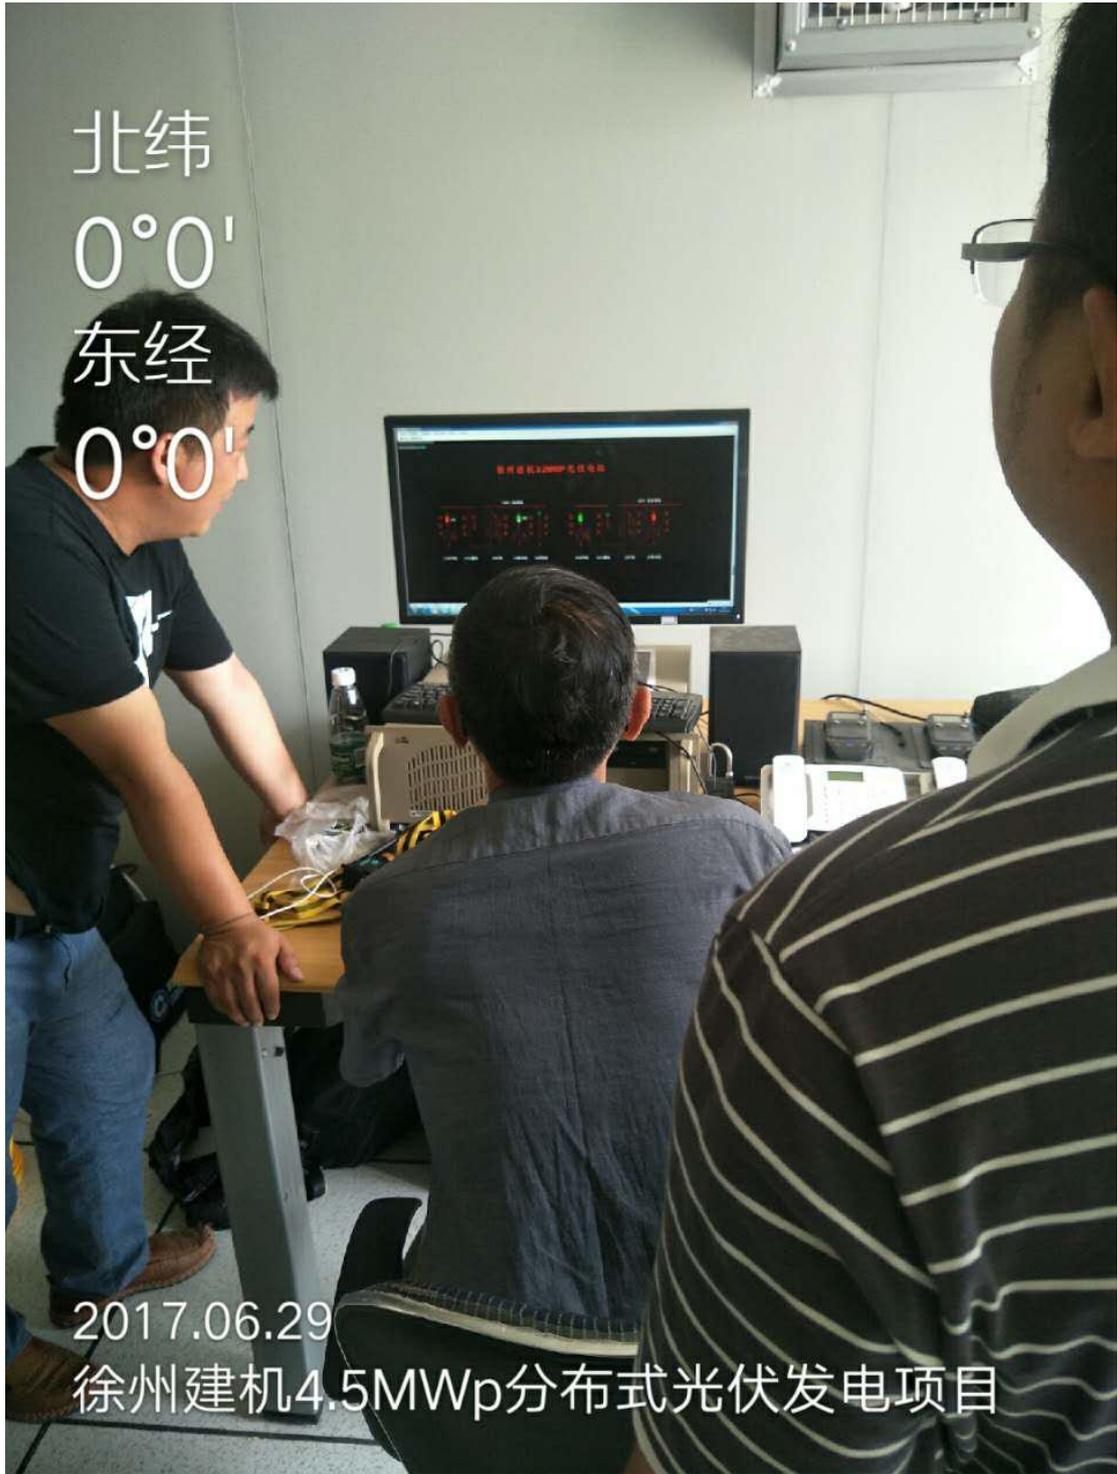

2017.06.29

徐州建机4.5MWp分布式光伏发电项目
