

监 理 日 志 ()

日期: 2017 年 9 月 7 日


天气: 晴

星期: 四

气温: 26°

工程名称: 徐州建机 4.5MWp 分布式光伏发电项目

监 理 工 作 情 况	1、上午同业主、施工方、逆变器设备厂家到徐州建机厂内于厂内领导协商开工事宜，要求出详细的事故分析报告及以后设备出故障安全应急预案并上报徐州建机厂内领导上会通过即可开工。 2、巡视箱逆变基础电缆桥架的防火封堵及设备护栏的安装工作。 3、通知施工方按照监理初检报告，逐步逐项的做消缺工作。	
施 工 情 况	施 工 单 位	施 工 内 容 及 进 度
	江 苏 华 能 建 设 集 团 工 程 有 限 公 司	1、4 人施工（由于徐州建机厂还未允许全面施工） 2、安装设备护栏 3、对电缆桥架进行防火封堵。
其 它 事 项		
本日现场监理人员		马继超
记录人: 马继超		总监理工程师/总监理工程师代表（签字）:

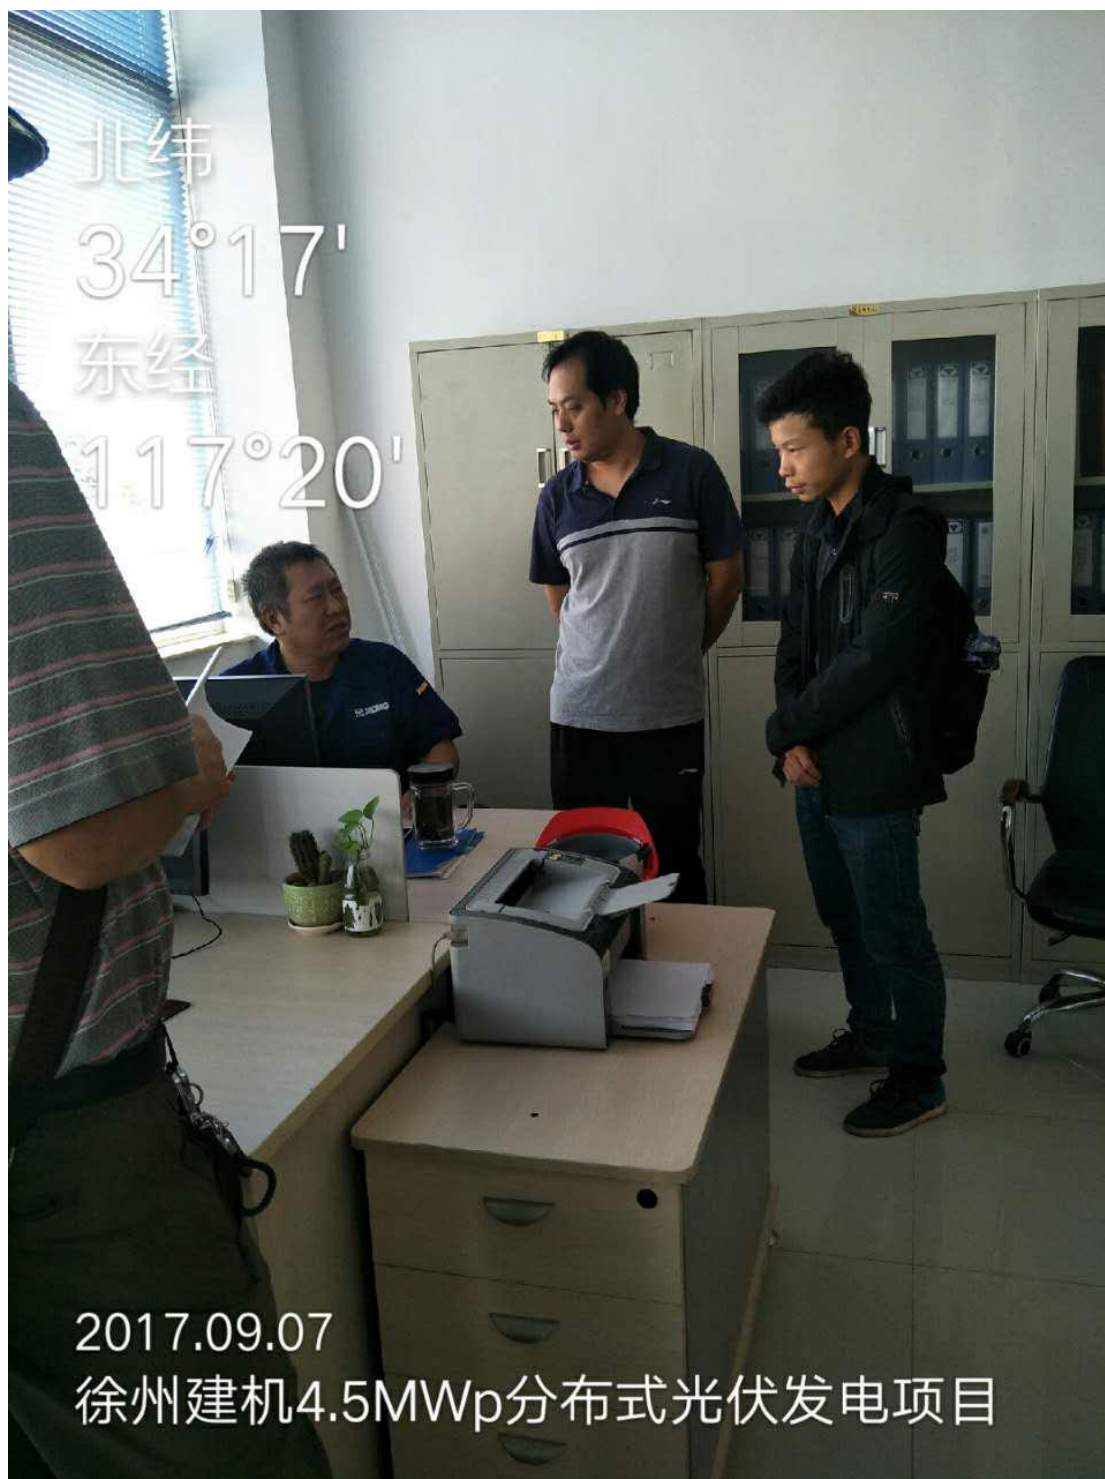

北纬
 $34^{\circ}17'$
东经
 $117^{\circ}20'$

2017.09.07
徐州建机4.5MWp分布式光伏发电项目

北纬
34°17'
东经
117°20'

2017.09.07
徐州建机4.5MWp分布式光伏发电项目

