

监 理 日 志 ()

日期: 2017 年 06 月 16 日

天气: 晴

星期: 星期五

气温: 20~35℃

工程名称: 山东青岛裕龙和中韩 5.75MWp 分布式光伏电站项目

监 理 工 作 情 况	1、检查裕龙厂区 2#箱变设备交流电缆冷缩头制作安装, 采用上海朗普热缩材料有限公司生产的 10KV 硅橡胶全冷缩户内 (外) 终端, 督促施工人员严格按照材料盒内附件按照工艺什说明书进行操作; 2、检查中韩 1、2#屋面汇流箱侧直流电缆热缩头制作安装, 检查过程中发现现场配备的消防灭火器没有与液化气罐体摆放在一起, 口头批评警告, 要求消防灭火器不能离开手边, 要做到伸手就能拿到; 3、检查外线施工队伍开挖电缆沟、埋管作业及电缆敷设施工情况, 向外线施工队伍班组长及工作人员讲解进入中韩裕龙厂区施工时要注意个折中注意事项, 主要有: 进入厂区时必须将香烟火机寄放在门卫处, 厂区内不允许私自动火作业, 如需动火需提前向厂房安全人员提交动火申请书等等事项。		
施 工 情 况	施工单位	施工内容及进度	
		裕隆: 交流电缆埋设施工; 1#逆变侧直流电缆连接完成; 2#箱变侧交流电缆头制作安装完成; 中韩: 1、2#屋面汇流箱侧直流电缆头制作安装完成; 5#箱逆变及预制舱拆模; 外线电缆沟开挖、埋管、电缆敷设完成。	
其 它 事 项			
本日现场监理人员		史 靛	
记录人: 史 靛		总监理工程师/总监理工程师代表 (签字):	


裕龙 2#箱变内交流电缆冷缩头制作



裕龙交流电缆埋设



中韩 5#箱逆变、预制舱模板拆除

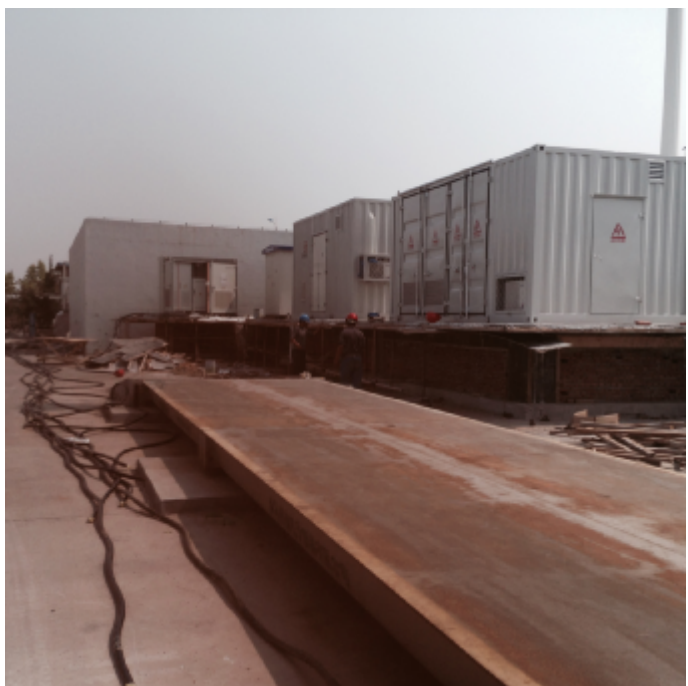

中韩 2#屋面直流电缆头制作安装

