

监 理 日 志 ()

日期： 2017 年 04 月 16 日


天气： 多云转小到中雨

星期： 星期日

气温： 12~24

工程名称： 山东神宇机械制造 6MW 分布式屋顶光伏电站项目

监 理 工 作 情 况	<p>现场巡视检查箱变土方开挖，基地标高满足设计要求。发现如下问题</p> <ol style="list-style-type: none">1、光伏组件散落屋面未固定，存在大风吹落隐患。2、光伏组件安装技术要求组件需两人共同搬运，现场存在一人搬运情况。3、钢梯基础基顶标高偏差偏大，预埋件纵横尺寸偏差较大。4、组件表面摆放工人衣物。5、钢梯基础做法与图纸要求不符。6、工程即将开工，请你项目部在工程开工前对以下资料向监理单位部和业主项目部报审。形成监理工作联系单 SDSY-ZHJL-002。下午 15 点在工地会议室召开第一次工地例会，总包、业主、分包单位参加形成会议纪要 SDSY-ZHJL-001。	
施 工 情 况	施 工 单 位	施 工 内 容 及 进 度
	山东军辉建设集团 有限公司	一号屋面支架安装，组件吊装 钢梯吊装就位，箱变土方开挖
其 它 事 项		
本 日 现 场 监 理 人 员	黄崇洋	
记 录 人： 黄崇洋	总监理工程师/总监理工程师代表（签字）：	

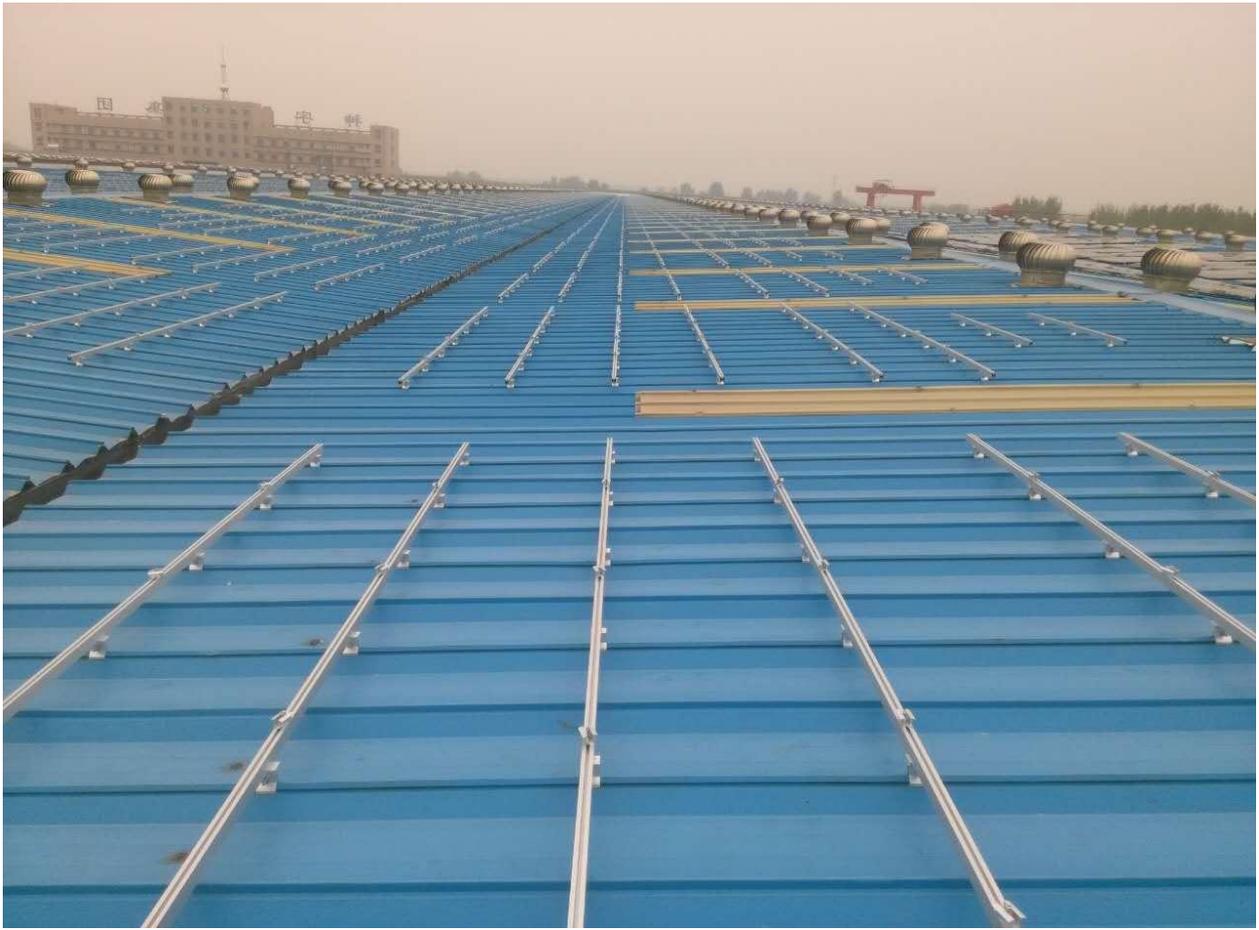

2017/04/16

 常州正衡电力工程监理有限公司
Changzhou Zhengheng Power Engineering Supervision CO., Ltd.

工程名称: 山东神宇机械制造6MW分布式屋顶光伏电站项目

活动内容: 第一次工地例会

当前日期: 2017年4月16日
