

# 监 理 日 志 (            )

日期: 2017 年 04 月 20 日  
星期: 星期四

天气: 晴  
气温: 10~23

工程名称: 山东神宇机械制造 6MW 分布式屋顶光伏电站项目

|                            |                                                                                                        |                                                                                             |
|----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|
| 监<br>理<br>工<br>作<br>情<br>况 | <p>巡视 1 号屋顶组件随意摆放整改,已全部整改完毕。检查后基本符合规范。<br/>并要求施工单位杜绝类似事情再次发生</p> <p>巡视 2 号屋顶导轨夹具安装,导轨螺丝紧固可靠,基本符合规范</p> |                                                                                             |
| 施<br>工<br>情<br>况           | 施 工 单 位                                                                                                | 施 工 内 容 及 进 度                                                                               |
|                            | 山 东 军 辉<br>建 设 集 团<br>有 限 公 司                                                                          | <p>1 号屋面组件继续吊装 30 箱,总计吊装 170 箱。</p> <p>2 号屋面导轨上穿夹具开始施工</p> <p>3 由于昨夜下雨导致屋面湿滑,今日 9:30 开工</p> |
| 其<br>它<br>事<br>项           |                                                                                                        |                                                                                             |
| 本日现场监理人员                   |                                                                                                        | 黄崇洋                                                                                         |
| 记录人: 黄崇洋                   |                                                                                                        | 总监理工程师/总监理工程师代表(签字):                                                                        |




常州正衡电力工程监理有限公司  
Changzhou Zhengheng Power Engineering Supervision CO., Ltd.

工程名称: 山东神宇机械制造6MW分布式屋顶光伏电站项目

施工部位: 屋顶巡视

当前日期: 2017年4月20日

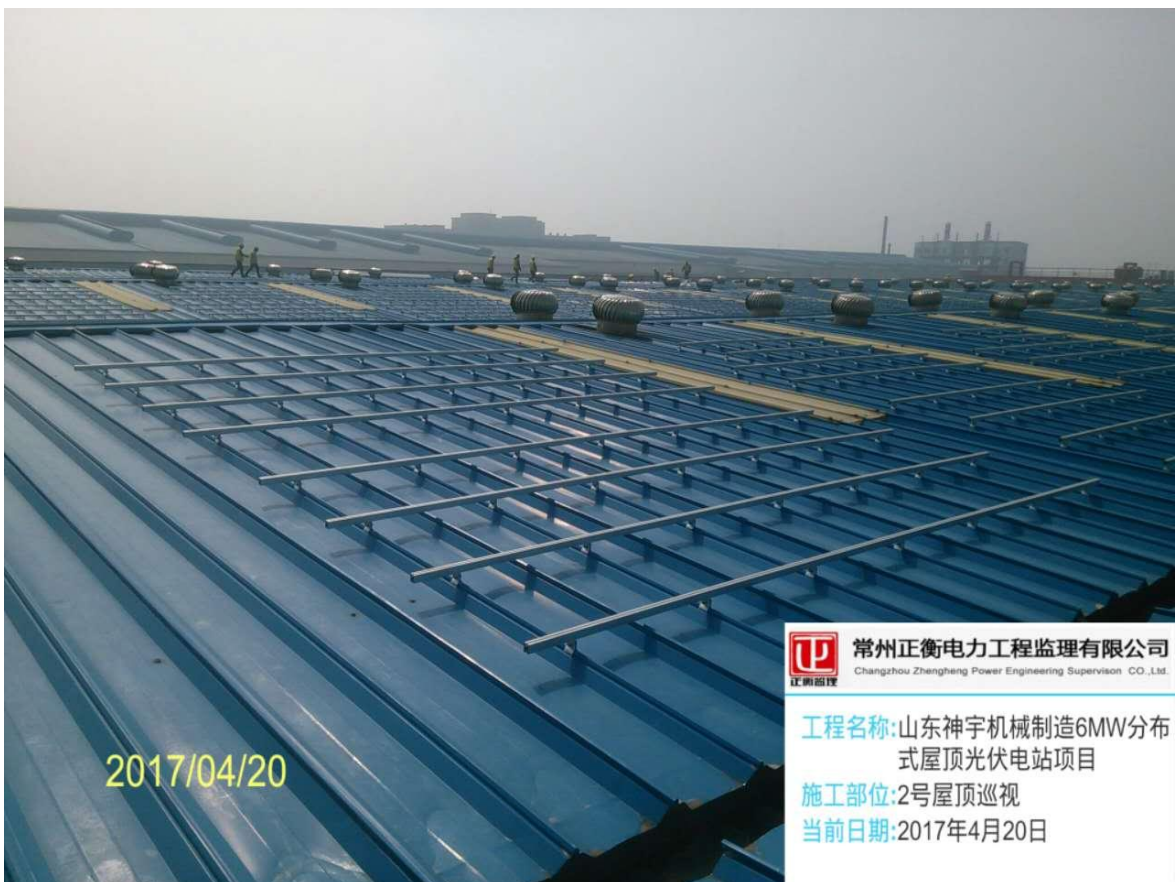

常州正衡电力工程监理有限公司  
Changzhou Zhengheng Power Engineering Supervision CO., Ltd.

工程名称: 山东神宇机械制造6MW分布式屋顶光伏电站项目

施工部位: 2号屋顶巡视

当前日期: 2017年4月20日

