

监 理 日 志 ()

日期: 2017 年 04 月 21 日
星期: 星期五


天气: 阵雨
气温: 6~18

工程名称: 山东神宇机械制造 6MW 分布式屋顶光伏电站项目

监 理 工 作 情 况	巡视现场安全文明施工, 正常无事故。 巡视检查二号屋顶支架夹具安装, 螺丝紧固可靠。 箱变基础垫层混凝土浇筑旁站, 符合设计及规范要求。 逆变器进场卸车, 要求摆放平稳整齐。		
施 工 情 况	施 工 单 位	施 工 内 容 及 进 度	
	山东军辉建设集团有限公司	二号屋顶夹具安装全部完成, 由于叉车故障维修, 一号屋顶组件吊装暂停施工。 箱变垫层混凝土浇筑完成。 逆变器总计 101 个, 已全部到货。	
其 它 事 项			
本日现场监理人员		黄崇洋	
记录人: 黄崇洋		总监理工程师/总监理工程师代表 (签字):	





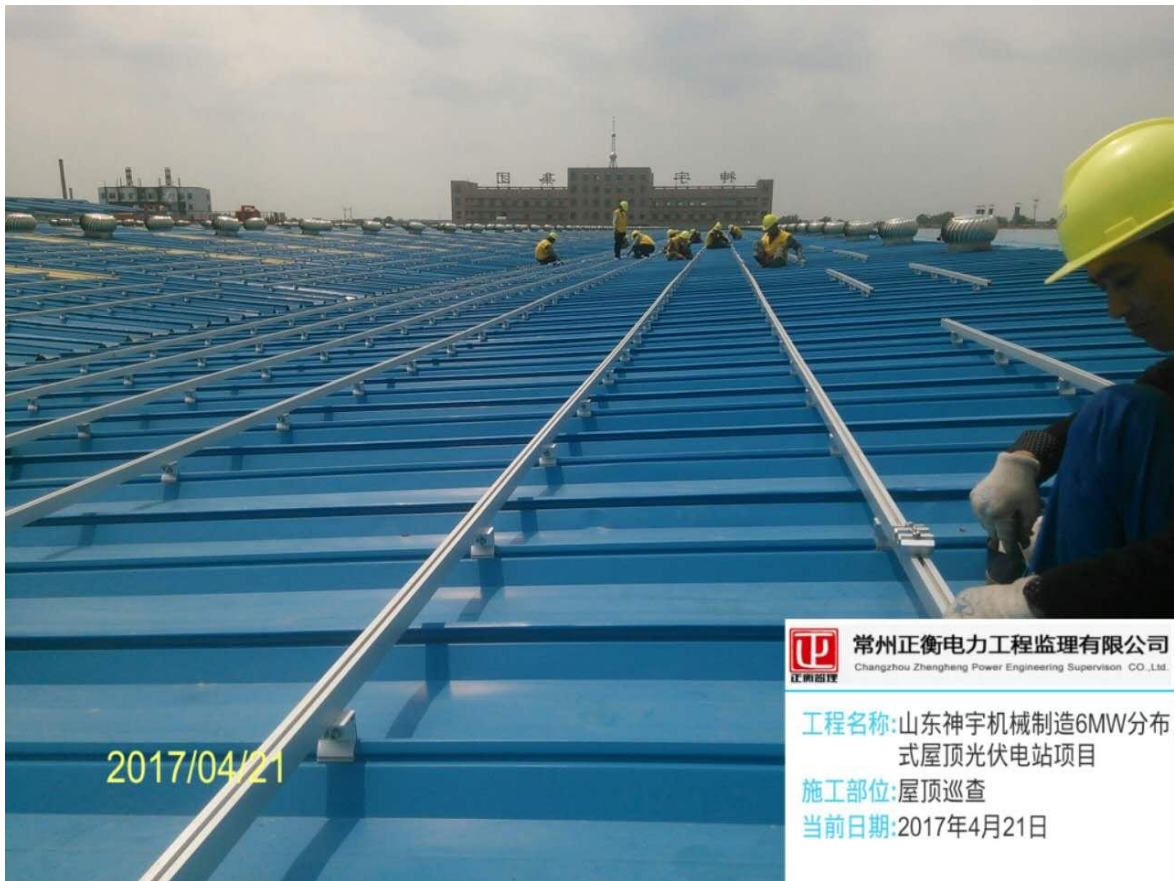

2017/04/21



常州正衡电力工程监理有限公司
Changzhou Zhengheng Power Engineering Supervision CO., Ltd.

工程名称: 山东神宇机械制造6MW分布式屋顶光伏电站项目

施工部位: 屋顶巡查

当前日期: 2017年4月21日



2017/04/21



常州正衡电力工程监理有限公司
Changzhou Zhengheng Power Engineering Supervision CO., Ltd.

工程名称: 山东神宇机械制造6MW分布式屋顶光伏电站项目

施工部位: 逆变器进场

当前日期: 2017年4月21日
