

# 监 理 日 志 (            )


日期: 2017 年 04 月 30 日  
 星期: 星期日

天气: 晴  
 气温: 13~28

工程名称: 山东神宇机械制造 6MW 分布式屋顶光伏电站项目

|                            |                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                     |  |
|----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| 监<br>理<br>工<br>作<br>情<br>况 | <p>现场安全巡查, 正常无事故。</p> <p>巡视检查二号屋顶组件吊装, 摆放整齐平稳。</p> <p>巡视检查一号屋面组件压固接线。安装整齐, 螺栓拧固可靠。</p> <p>巡视箱变基础钢筋绑扎, 箍筋间距与图纸设计不符问题已整改完毕。基本符合设计及规范要求。</p> <p>巡视箱变基础接地极安装, 接地钢管长度不够, 接地焊接长度不够, 未按图纸要求四周布控形成接地网, 只在一侧布置。要求立即整改形成监理通知单 SDSY-ZHJL-004, 发送施工项目部及业主项目部。</p> <p>巡视检查逆变器支架焊接。</p> |                                                                                                                                     |  |
| 施<br>工<br>情<br>况           | 施工单位                                                                                                                                                                                                                                                                      | 施工内容及进度                                                                                                                             |  |
|                            | 山东军辉建设集团<br>有限公司                                                                                                                                                                                                                                                          | <p>一号屋面组件压固接线继续施工, 累计压固 1300 块。</p> <p>逆变器支架分放就位, 等待安装。</p> <p>二号屋面组件吊装 60 箱, 总计吊装 121 箱。</p> <p>逆变汇流箱支架焊接。</p> <p>今日施工人数 61 人。</p> |  |
| 其<br>它<br>事<br>项           |                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                     |  |
| 本日现场监理人员                   |                                                                                                                                                                                                                                                                           | 黄崇洋                                                                                                                                 |  |
| 记录人: 黄崇洋                   |                                                                                                                                                                                                                                                                           | 总监理工程师/总监理工程师代表 (签字):                                                                                                               |  |



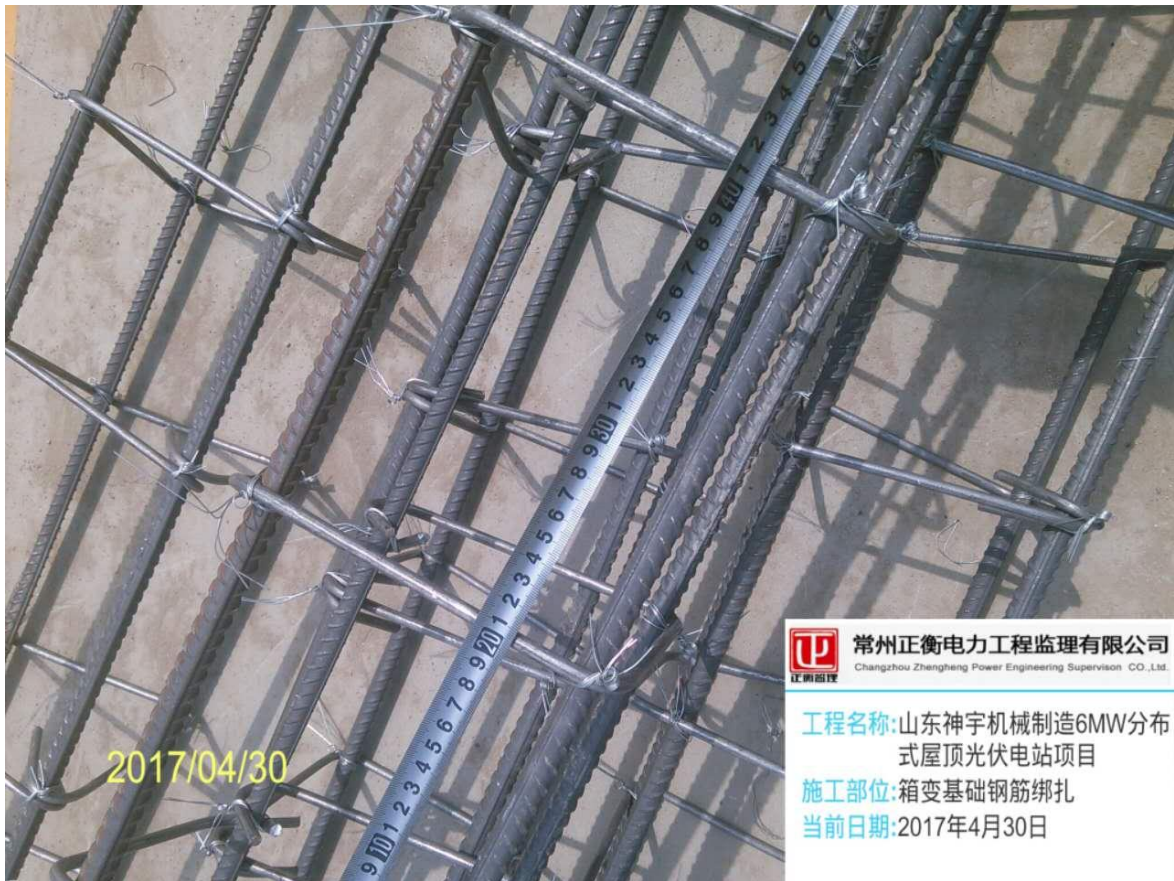



2017/04/30



常州正衡电力工程监理有限公司  
Changzhou Zhengheng Power Engineering Supervision CO., Ltd.

工程名称: 山东神宇机械制造6MW分布式屋顶光伏电站项目

施工部位: 组件吊装

当前日期: 2017年4月30日
